DB Netz AG • Theodor-Heuss-Allee 7 • 60486 Frankfurt am Main

DB Netz AG
Zentrale
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt am Main
www.bahn.de

S 3, 4, 5, 6 bis Messe

Andreas Beck
Telefon 069 265-31617
Telefax 069 265-31608
Andreas.Beck@bahn.de
I.NVT4.Be-07F823

Nach Verteiler

für die

Richtlinienfamilie 823

29.02.2008

Regelwerk Oberbau
Richtlinienfamilie 823 „Oberbauarbeiten planen“
Aktualisierung 01

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.04.2008 wird die Richtlinienfamilie (RilF) 823 „Oberbauarbeiten planen“ aktualisiert (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de).

1. Hinweise und Erläuterungen

Ril 823.0200Z01 – Schienenkennzeichnung

Der Zusatz 01 der Ril 823.0200 regelt in Übereinstimmung mit der Euro-Norm (EN) 13674-1 die Schienenbezeichnung und das Walzzeichen der Schienen.

Ril 823.0701 – Verlegepläne für Weichen, Kreuzungen und Schienenauszüge erstellen

Die Richtlinie regelt den Inhalt und die Darstellung der Verlegepläne auf der Grundlage der freigegebenen Weichenskizze als vertragliche Grundlage für die Lieferung von Weichen, Kreuzungen, Schienenauszügen sowie die Montage und Verlegung der Weichen einschließlich der Teile der LST- Außenanlagen und den Oberbaumaterialien im angrenzenden Bereich.

2. Austauschblätter / Neuausgaben

Ril 823.0200Z01 – Neuausgabe gültig ab 01.04.2008, als Zusatz zur Ril 823.0200 anfügen

Ril 823.0701 – Neuausgabe gültig ab 01.04.2008

i. V. gez. Hartmann

i. A. gez. Beck

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Hartmut Mehdorn

Vorstand:
Dr. Volker Kefer,
Vorsitzender

Dagmar Haase
Oliver Kraft
Karl-Heinz Stroh
Harald Stumpf

DB Infrastruktur
Netz

DB Netz AG • Theodor-Heuss-Allee 7 • 60486 Frankfurt/Main

DB Netz AG
Zentrale
I.NVT
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt/Main
www.db.de

Andreas Beck
Telefon 069 265-31617
Telefax 069 265-31608
Andreas.Beck@bahn.de
I.NVT(F).Be – 06F823

Nach Verteiler

für die

Richtlinienfamilie 823

04.12.2006

Regelwerk Oberbau
Richtlinienfamilie 823 „Oberbauarbeiten planen“
Neuausgabe; Inkraftsetzung zum 01.01.2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.01.2007 wird die Richtliniefamilie (RilF) 823 „Oberbauarbeiten planen“ neu herausgegeben (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de).

1. Hinweise und Erläuterungen

Der Inhalt der bisherigen Arbeitsunterlage 820 02 04 wurde modularisiert, redaktionell überarbeitet und in die Richtlinien 823.0100 und 823.0150 überführt.

Im Rahmen der Neugliederung der RilF 820 „Grundlagen des Oberbaues“ wurde der Inhalt der Richtlinien 820.2122 und 820.0103 redaktionell überarbeitet und in die Richtlinien 823.0200 und 832.0900 überführt.

Die Ril 823.0700 „Oberbauarbeiten planen; Bestellen von Weichen, Kreuzungen, Hemmschuhauswurfvorrichtungen und Schienenauszügen“ bleibt in der Fassung vom 01.03.2004 unverändert.

2. Austauschblätter / Aktualisierungen zum 01.01.2007

Folgende Richtlinien werden **neu eingeführt**:

- **Ril 823.0100** „Oberbauarbeiten planen – Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen; Planungsphase I – Mehrjahres- und Jahresplanung –„
- **Ril 823.0150** „Oberbauarbeiten planen; Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen; Planungsphase II – Vorbereitung zur Baudurchführung –„
- **Ril 823.0200** „Oberbauarbeiten planen; Bestellen und Kontrollieren von Schienen“
- **Ril 823.0900** „Oberbauarbeiten planen; Regelungen für die Entwurfsplanung“

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Hartmut Mehdorn

Vorstand:
Dr.-Ing. Volker Kefer,
Vorsitzender

Dagmar Haase
Klaus Junker
Oliver Kraft
Karl-Heinz Stroh
Dr. Matthias Zieschang

Folgende Richtlinien und Technische Mitteilungen werden **ungültig**:

- „Arbeitsunterlage (AU) **820 02 04** für die Planung und Abwicklung von Oberbauarbeiten – Planungsphase I und II – gültig vom 01.01.1997“
- **Ril 820.2122** „Grundlagen des Oberbaues; Gestalten von Gleisen und Weichen; Bestellen und Kontrollieren von Schienen“
- **Ril 820.0103** „Grundlagen des Oberbaues; Allgemeines; Regelungen für die Entwurfsplanung“
- **TM 09 / 2001** „Grundlagen des Oberbaues, Allgemeines, Regelungen für die Entwurfsplanung" vom 27.06.2001

Mit freundlichen Grüssen

ppa. gez. Hartmann

i. A. gez. Beck

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Zielgruppen, für welche diese Richtlinie erarbeitet wurde:

DB Netz AG:
- Mitarbeiter, die Instandsetzungsmaßnahmen planen
- Mitarbeiter, die den Oberbau inspizieren, warten oder instand setzen

DB RegioNetz Infrastruktur (RNI):
- Mitarbeiter, die Instandsetzungsmaßnahmen planen
- Mitarbeiter, die den Oberbau inspizieren, warten oder instand setzen

DB Systemtechnik:
VTZ 11, VTZ 12, ...

Andere:
DB Projekt Bau GmbH
DB Bildung (F + E Center)
DBG, DEC, DGT,
Baufirmen
Planungs- und Ingenieurbüros
EBA Zentrale

Impressum

Fachautor Deutsche Bahn AG
VTZ 115
Berthold Dietrich
Mainzer Landstr. 181
60327 Frankfurt am Main
Tel. Intern (955) 45214 / Extern (069) 265-45214
Fax Intern (955) 45219 / Extern (069) 265-45219

Inhaltsverzeichnis

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
823.0100	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen; Planungsphase I - Mehrjahres- und Jahresplanung -	01.01.2007
823.0100A01	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase I - Zeitenplan	01.01.2007
823.0100A02	Erhebungs- und Arbeitsblatt (E- und A-Blatt)	01.01.2007
823.0100A03	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase I – Streckenband zum Erhebungs- und Arbeitsblatt (E- und A-Blatt) Gleise -	01.01.2007
823.0100A04	Streckenband zum Erhebungs- und Arbeitsblatt (E- und A-Blatt) Weiche	01.01.2007
823.0100A05	Angaben der Elektrotechnik	01.01.2007
823.0100A06	Angaben der Leit- und Sicherungstechnik	01.01.2007
823.0100A07	Aufmass- und Erhebungsblatt	01.01.2007
823.0100A08	Niederschrift zur Erstbegehung	01.01.2007
823.0100A09	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase I- Baustellenverzeichnis	01.01.2007
823.0100A10a	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase I – Rahmenbauablaufplan Gleise-	01.01.2007
823.0100A10b	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase I – Rahmenbauablaufplan Weichen-	01.01.2007
823.0100Z01	Planungsphase I, Zeitenplan - Ablaufschema -	01.01.2007
823.0100Z07	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase I - Mehrjahres- und Jahresplanung - Querprofilskizze	01.01.2007
823.0100Z08	Programm zur Bettungsquerschnittsberechnung (CD-ROM)	01.01.2007
823.0150	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase II - Vorbereitung zur Baudurchführung	01.01.2007
823.0150A01	Tätigkeitsblatt	01.01.2007
823.0150A02	Niederschrift zur T 1 und Fortschreibung T 12	01.01.2007
823.0150A03	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase II – Bauablaufplan Gleise-	01.01.2007
823.0150A04	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase II – Bauablaufplan Weichen -	01.01.2007
823.0150A05	Vereinfachter Bauablaufplan	01.01.2007
823.0150A06	Symbole der wichtigsten Arbeitsgänge	01.01.2007
823.0150A07	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase II - Zusammenstellung d. abzustellenden Maschinen und Wagen	01.01.2007
823.0150A08	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase II - Erfassung der Abstellmöglichkeiten von Maschinen und Wagen	01.01.2007

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
823.0150A09	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase II - Gleisbelegungsplan	01.01.2007
823.0150A10	Betriebsablaufplan	01.01.2007
823.0150A11	Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase II – Personaleinsatzplan-	01.01.2007
823.0150A12	Checkliste	01.01.2007
823.0150A13	Verzeichnis der Abkürzungen	01.01.2007
823.0200	Bestellen und Kontrollieren von Schienen	01.01.2007
823.0200A01	Bestellen und Kontrollieren von Schienen, Schienenband	01.01.2007
823.0200A02	Bestellen und Kontrollieren von Schienen; Verzeichnis für innerhalb der Gewährleistung schadhaft gewordener Schienen	01.01.2007
823.0200A03	Bestellen und Kontrollieren von Schienen; Fehlerkennzeichnung	01.01.2007
823.0200Z01	Schienenkennzeichnung	01.04.2008
823.0700	Oberbauarbeiten planen Bestellen von Weichen, Kreuzungen, Hemmschuhauswurfvorrichtungen und Schienenauszügen	01.03.2004
823.0700A01	Oberbauarbeiten planen Zusätzliche Bestellangaben	01.03.2004
823.0700V01	Oberbauarbeiten planen; Weichenskizze	01.03.2004
823.0700V02	Oberbauarbeiten planen; Weichenskizze für Schienenauszüge	01.03.2004
823.0701	Verlegepläne für Weichen, Kreuzungen und Schienenauszüge erstellen	01.04.2008
823.0701A01	Verlegepläne für Weichen, Kreuzungen und Schienenauszüge erstellen (Beispiele)	01.04.2008
823.0900	Regelungen für die Entwurfsplanung;	01.01.2007

Nachweis der Aktualisierungen

Lfd. Nr.	Kurzer Inhalt / Bemerkungen	Gültig ab	Eingearbeitet
	Neuausgabe ersetzt die RilF 823 gültig seit 01.03.2004	01.01.2007	
1	Aktualisierung Inkraftsetzung 823.0200Z01, 823.0701, 823.0701A01	01.04.2008	

Mitgeltende Regelwerke

Regelwerke der Deutschen Bahn AG	
Nummer	**Titel**
Ril 13200	Management-Handbuch-Arbeitsschutz
Ril 406	Fahren und Bauen
Ril 408	Züge fahren und Rangieren
Ril 435	Planung Rangierarbeiten und Überwachung Rangieraufwand
Ril 800.0110	Netzinfrastruktur Technik entwerfen – Linienführung
Ril 800.0120	Netzinfrastruktur Technik entwerfen – Weichen und Kreuzungen
Ril 800.0130	Netzinfrastruktur Technik entwerfen – Streckenquerschnitte auf Erdkörper
Ril 804	Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten
Ril 809	Infrastruktur- und elektrotechnische Maßnahmen realisieren
Ril 815	Bahnübergänge planen und instand halten
RilF 820	Grundlagen des Oberbaues
RilF 821	Oberbau inspizieren
RilF 822	Oberbau warten
RilF 824	Oberbauarbeiten durchführen
RilF 825	Baumaschinen einsetzen
RilF 826	Befähigungen im Oberbau (künftig)
RilF 827	Oberbaumessmittel einsetzen (künftig)
Ril 836	Erdbauwerke planen, bauen und instand halten
Ril 853	Eisenbahntunnel planen, bauen und instand halten
Ril 883	Gleis- und Bauvermessung
Ril 88501	Vorhaltung raumbezogener Bestandsdaten – Grundlagen des DB-GIS
Ril 99701	Oberleitungsanlagen; planen, errichten und instand halten

1 Allgemeines

(1) Diese Richtlinie ist für alle in der Unternehmensplanung der DB Netz AG eingestellten Investitionen und Instandsetzungen für Gleise und Weichen (Maßnahmenplan/Oberbauprogramm) anzuwenden.

Zweck

(2) Im Sinne dieser Richtlinie gelten nachfolgende Regelungskonzepte mit:

Mitgeltende Regelungen

Management-Handbücher für die

- „Instandsetzung zur Neuordnung der Instandhaltungs- und Erneuerungs . . „ und das
- „Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (BoVEK)“
- Prozesshandbücher der Ril 406 „Fahren und Bauen“
- Ril 406 und Ril 809
- Regelwerke, die im Zusammenhang mit der Erstellung des E- und A-Blattes stehen (Ril 836 bei Bodengrunduntersuchungen usw.) und die
- KoRil 138.0202 für andere Unternehmen und Bereiche

2 Planungsphase I

(1) Die Grundlage für die Planungsphase I ist die Mehrjahres- und Jahresplanung. Die Vorbereitung zur Baudurchführung ist die Planungsphase II, Wobei der Planungszeitraum das Kalenderjahr ist. Im weiteren wird das Baudurchführungsjahr mit x bezeichnet.

Grundlage

Aufgabe der Mehrjahresplanung ist es

- die Oberbaumaßnahmen zeitlich

1. mit den Planungen anderer technischer Fachdienste (Elektrotechnik, Leit- und Sicherungstechnik, konstruktiver Ingenieurbau, Tunnel-/Erdbau und andere Geschäftsfelder (GF) usw.) zu koordinieren und
2. die Baumaßnahmen entsprechend den Anforderungen der Ril 406 zur Mehrjahresbaubetriebsplanung anzumelden und

abzustimmen.

Die Mehrjahresplanung beginnt mit dem Erstellen der Vormerkkarte. Sie endet mit der Anmeldung zur Mehrjahresbaubetriebsplanung (x-2, Vorlagetermin 28.02.). Die Eingabe der Daten aus der Vormerkkarte (VMK) muss fristgerecht in -SAP R/3 Netz- (Registerkarte: Oberbau Gleise und Weichen) erfolgen.

Ihr geht:

- Eine detaillierte Anmeldung der Maßnahmen mittels VMK durch den Anlagenverantwortlichen (Alv),
- eine Begutachtung und Festlegung der Priorität durch den Fachbeauftragten Fahrbahn und
- letztendlich die Prüfung und Ergänzung der Daten durch das Instandhaltungs- und Anlagenmanagement

voraus.

Zum Handling und zur Eingabe der Daten in die elektr. Vormerkkarte wird auf das hierfür eigens erstellte Handbuch verwiesen.

Aufgabe der Jahresplanung ist es

- die Ergebnisse der Mehrjahresplanung fortzuschreiben und weitere Oberbaumaßnahmen auf der Grundlage zugestimmter Maßnahmenpläne (Finanzierungsvereinbarungen) zu planen,
- die Oberbaumaßnahmen mit den beteiligten Fachdiensten zu koordinieren und entsprechend den Anforderungen der RiF 406 zur Jahresbaubetriebsplanung anzumelden und abzustimmen

Die Planungsphase I endet mit der Bestätigung der Baumaßnahmen des Jahresbaubetriebsplans (Terminkette gem. Ril 406.1103A01)

3 Planungsunterlagen

(1) Die Tätigkeiten und zeitlichen Abstände zum geplanten Baubeginn sind nach dem Zeitenplan abzuwickeln.

Zeitenplan Anhang 01 / Zusatz 01

(2) In der Planungsphase I ist das

Erhebungs- und Arbeitsblatt Anhang 02

Erhebungs- und **A**rbeitsblatt (E – und A – Blatt) zur Planung von Gleis- und Weichenbaustellen mit den Anhängen 03 - 07 nach der Begehung der Baustelle nebst Anlagen vom Auftraggeber (AG) - von dem Maßnahmenplaner der zuständigen Niederlassung Netz (NL N) – aufzustellen.

Folgende Anhänge sind anzufügen:

- das „Streckenband zu E- und A-Blatt zur Planung von Gleisbaustellen," dass der Fachbeauftragte Fb im Schriftfeld auf Vollständigkeit und Richtigkeit bestätigt, — **Anhang 03**
- das Streckenband zum E- und A-Blatt zur Planung von Weichenbaustellen , dass der Fachbeauftragte Fb im Schriftfeld auf Vollständigkeit und Richtigkeit bestätigt, — **Anhang 04**
- die Angaben der Elektrotechnik , — **Anhang 05**
- die Angaben der Leit- und Sicherungstechnik , — **Anhang 06**
- das Aufmass- /Erhebungsblatt mit Querprofilen . Zur Einhaltung des Regelbettungsquerschnittes ist mit dem bei TZF 61 erstellten Rechenprogramm ein eigener Nachweis zu führen. Dieses auf der beiliegenden CD-ROM enthaltene Programm ist auch unter der Bestellnummer 823.0100Z08 zu bestellen bei: — **Anhang 07 / Zusatz 07, Zusatz 08**

  DB Services Technische Dienste GmbH
  Druck und Informationslogistik
  Logistikcenter – Kundenservice
  Kriegsstrasse 136
  76133 Karlsruhe

  für interne Kunden ist dieses Programm auch aus der ZRWD unter der Regelwerksnummer 823.0100Z08 abrufbar. Für besonders schwierige Umbauabschnitte ist das Aufmaßblatt mit Querprofilen Zusatz 07 zu erstellen
- die vermessungstechnischen Planunterlagen,

- die Angaben des konstruktiven Ingenieurbaues,
- die Angaben der sonstigen Geschäftsfelder (GF) Personenbahnhöfe, Dienstleistungen - Telematik - etc.

Niederschrift zur Erstbegehung Anhang 08

(3) Es ist eine Niederschrift zur Erstbegehung zu fertigen.

Vor dem Aufstellen des Streckenbandes (Anhang 03 und 04) müssen die Bettungs- und Untergrundverhältnisse untersucht werden.

Dies kann z. B. durch

Georadar als Ergänzung zur Bodengrunduntersuchung,

Schürfschlitze,

Bohrungen,

Rammkernsondierungen

erfolgen. Im E- und A-Blatt sind die Ergebnisse der Vorerhebungen zusammengestellt.

Baustellenverzeichnis Anhang 09

(4) Das Baustellenverzeichnis (Anhang 09) dient der Erarbeitung der Anmeldevordrucke gem. Ril 406

- zur Mehrjahresbaubetriebsplanung,
- zur Jahresbaubetriebsplanung und
- zu den unterjährigen Baubetriebsplänen.

Das Baustellenverzeichnis ist eine Arbeitsunterlage für die DB Netz AG. Das Baustellenverzeichnis beinhaltet

- den Umbauabschnitt / Teilbauabschnitt,
- die Bauzeit,
- die Umbausysteme,
- die Betriebsweise mit Datum und Uhrzeit,
- die Sperrung des Nachbargleises mit Datum, Uhrzeit und Lage im Netz von km bis km),
- die Langsamfahrstellen mit Datum, Uhrzeit und Lage im Netz (von km bis km),
- die zugeordnete Vormerkkarte mit Angaben der Kilometer, GLO, Netz, örtl. zul. Geschwindigkeit, FAA-Nr., Oberbauform vorhanden/künftig, Umbaulänge bzw. Leistungslänge und Anschlusslänge.

(5) Der Rahmenbauablaufplan ist die Grundlage der Bauablaufplanung und Teil der Ausschreibungsunterlagen. Zudem ist er Bestandteil der Anmeldung einer Baumaßnahme zum Jahresbaubetriebsplan. Der Projektleiter erstellt den Rahmenbauablaufplan. Im Vorfeld sind Variantenvergleiche hinsichtlich der benötigten Sperrzeiten und der erforderlichen Baumaschinen/Umbausysteme durchzuführen. Zur Erstellung der Rahmenbauablaufpläne (Planungsphase I) und Bauablaufpläne (Planungsphase II) kann das von der DB Netz AG eingeführte EDV-Programm „SOG“ (**S**perrzeit-**O**ptimierung bei **G**leisumbauten) oder ein vergleichbares angewendet werden.

Rahmenbauablaufplan
Anhang 10

Der Projektleiter ist im Rahmenbauablaufplan

- für den Inhalt und
- für die Mitwirkung anderer Beteiligter der DB AG

verantwortlich.

Vom Projektleiter sind dem Auftragnehmer (AN) im Rahmenbauablaufplan die zur Verfügung stehenden Sperrzeiten in Bau- und benachbarten Betriebsgleisen anzugeben, ebenso Tätigkeiten, die durch andere Firmen oder andere Beteiligte der DB AG ausgeführt werden (z. B. Umbausysteme, Signal- und Oberleitungsarbeiten usw.).

Die Arbeiten sind in Form von Zeit-Wege-Linien bzw. Zeit-Wege-Flächen darzustellen.

❑

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.:	Tätigkeit	Zeitraum vor Baubeginn	zuständig	Bemerkungen
1	Maßnahmenplan für mehrjährigen Baubedarf (Mehrjahresoberbauprogramm) aufstellen (Vormerkkarte)	bis 48 Monate	Anlagen- und Instandhaltungsmanager	
2	Beteiligung Andere berücksichtigen	48 – 40 Monate	Anlagenmanager	
3	Baustellenerstbegehung; Streckenband , E- und A-Blatt erstellen und prüfen	40 – 36 Monate	Anlagen- und Instandhaltungsmanager	Erstellung I.NIA Prüfung I.NIA
4	Baustellenserien bilden	36 - 22 Monate	Anlagenmanager Baubetriebskoordinator	
5	Anmeldung zur Mehrjahresbaubetriebsplanung (nach Ril 406)	36 – 22 Monate letzter Termin: **28.02.x - 2**	Anlagenmanager, regionale Baubetriebsplanung, Instandsetzungsmanager	

6	Baustellenbegehung durchführen und Rahmenbauablaufplan erstellen	24 – 12 Monate letzter Termin: **31.12.x - 2**	Anlagen- und Instandhaltungsmanager, Instandsetzungsmanager	
7	Bautechnische/finanzielle Freigabe erwirken	22 – 12 Monate	Anlagen- und Instandhaltungsmanager EBA	
8	Baumaßnahmen mit überregional eingesetzten Großbaumaschinen technisch koordinieren und abzustimmen	22 – 12 Monate	Anlagen- und Instandhaltungsmanager, Instandsetzungsmanager	
9	Großbaumaschinen vormerken	22 – 12 Monate	Instandsetzungsmanager	

10	Anmeldung Jahresbaubetriebsplan (Jbpl) (nach Ril 406)	22 – 10 Monate letzter Termin: **28.02. x - 1**	regionale Baubetriebsplanung, Anlagen- und Instandhaltungsmanager	Anlage: Rahmenbauablaufplan
11	Leistungsverzeichnisse und Teilkostenanschläge Bau aufstellen und an **I.NDI-x-L** übergeben	12 – 4,5 Monate letzter Termin: **140 Tage** vor Baubeginn	Anlagen- und Instandhaltungsmanager, Instandsetzungsmanager	
12	Anmeldung zur Unterjährigen Baubetriebsplanung (nach Ril 406)	bis 28 Wochen bis 14 Wochen	Anlagen- und Instandhaltungsmanager, regionale Baubetriebsplanung	A-Maßnahmen, B-Maßnahmen Anlage: Bauablaufplan
13	Tätigkeitsblatt nach Planungsphase II erstellen (Ril 823.0150)	bis 3 Monate	Projektleiter Anlagen- und Instandhaltungsmanager Baubetriebskoordinator	

❑

1 Erhebungs- und Arbeitsblatt

Angaben zur Baustelle

Maßnahme	:
Strecke	:
Umbaugleis	
Projekt-Nr:	:
AIB-Nummer:	:
Bahnstellennr.	:
Rahmenkostenstellennr.	:
PSP-Element, Projekt-Nr. (aus SAP-R 3)	:

A. Umbautermin:

B. Umbauabschnitt von bis

C. Genaue Umbaulänge m

D. Maßgebliche Neigung im Gleis in ‰

E. Gleisabstand:
Arbeiten im Innengleis:

F. Vorhandene Oberbauform neue Oberbauform

G. Vermessungstechnische Angaben

H. Geschwindigkeit nach VzG beträgt

I. Oberleitung

Fahrdrahthöhe:	
Schaltgruppe:	
Längserde erforderlich	

J. Betriebsweise:

K. Bauverfahren:

L. Zu- und Abfahrtswege für Straßenfahrzeuge:

M. Bahnübergänge:

N. Auszuführende: Ausführender:
Arbeiten

Oberbauarbeiten:	
Signalarbeiten:	
Erdungsarbeiten:	
Sonstige:	

Angaben zur Baustellensicherung

O. Ausführungstermin:

P. Sperrzeiten:

Umbaugleis	
1.Nachbargleis	
2.Nachbargleis	
Zusätzliche	

Bü – Sperrung:

Bü - Bezeichn., Bahn - km	
Straßenverkehrsbehörde	
Straßenname /- art	
Straßensperrung von – bis	

Q. Angaben für die La

	V (km/h)	km von ....bis....	von Tag / Stunde	bis Tag / Stunde
Umbaugleis				
1. Nachbargleis				
2. Nachbargleis				

R. Abschaltung der Oberleitung:

Umbaugleis	
1.Nachbargleis	
2.Nachbargleis	

S. Signaltechnische Arbeiten:

Einbau von Gleissperren	
Sonstige Maßnahmen	

T. Arbeitsschutz und Sicherheit nach GUV:

Sicherungsart: Risikominimiertes Arbeiten im Gleisbereich der DB Netz **„RIMINI“ - Blatt** → (näheres hierzu siehe Ril 132.0118)

Sperrung Nachbargleise aus Gründen der Unfallverhütung	
Autom. Warnsystem	
Ankündigungsanlage	
Feste Absperrung	
Sicherungsposten	
Absperrposten	


U. Ausführender u. Verantwortlicher:

Sicherungsfirma	
Sicherungsaufsicht	
Sicherungsüberwachung	
Bauüberwachung	
Bauleiter Oberbau	
Bauleiter LST	
Bauleiter E	

V. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

SiGeKo	
Arbeits- und Gesundheitsschutzplan	
Gefährdungsplan	
Vorankündigung	

❑

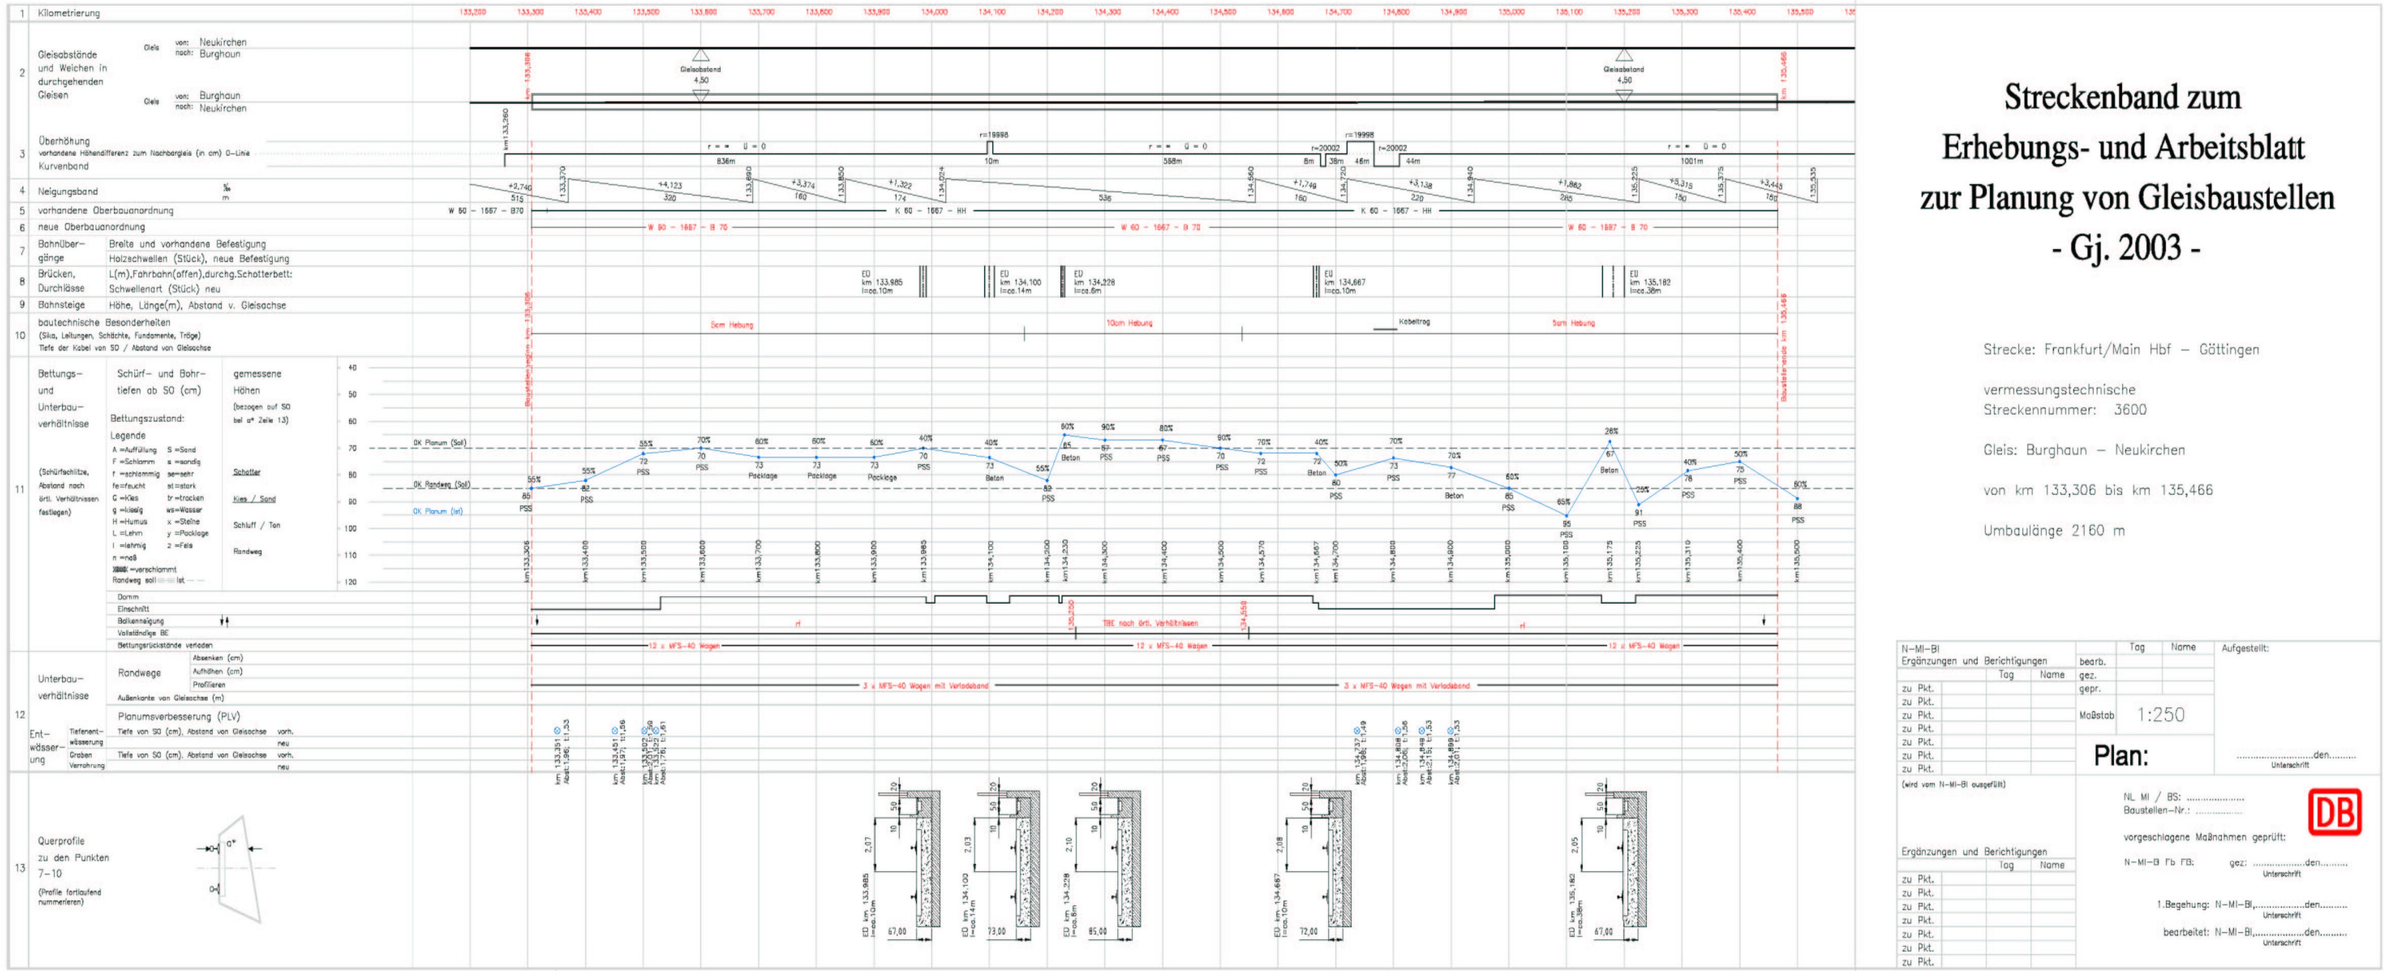

Streckenband zum Erhebungs- und Arbeitsblatt zur Planung von Gleisbaustellen - Gj. 2003 -

Strecke: Frankfurt/Main Hbf – Göttingen

vermessungstechnische Streckennummer: 3600

Gleis: Burghaun – Neukirchen

von km 133,306 bis km 135,466

Umbaulänge 2160 m

N–MI–BI Ergänzungen und Berichtigungen	Tag	Name
zu Pkt.		
zu Pkt.		
zu Pkt.		
zu Pkt.		
zu Pkt.		
zu Pkt.		
zu Pkt.		

	Tag	Name
bearb.		
gez.		
gepr.		

Maßstab 1:250

Aufgestellt: .....den.....
Unterschrift

Plan:

(wird vom N–MI–BI ausgefüllt)

Ergänzungen und Berichtigungen

	Tag	Name
zu Pkt.		
zu Pkt.		
zu Pkt.		
zu Pkt.		
zu Pkt.		
zu Pkt.		
zu Pkt.		


NL MI / BS: .....
Baustellen–Nr.: .....

vorgeschlagene Maßnahmen geprüft:

N–MI–BI Fb FB: gez: .....den.....
Unterschrift

1.Begehung: N–MI–BI,.....den.....
Unterschrift

bearbeitet: N–MI–BI,.....den.....
Unterschrift

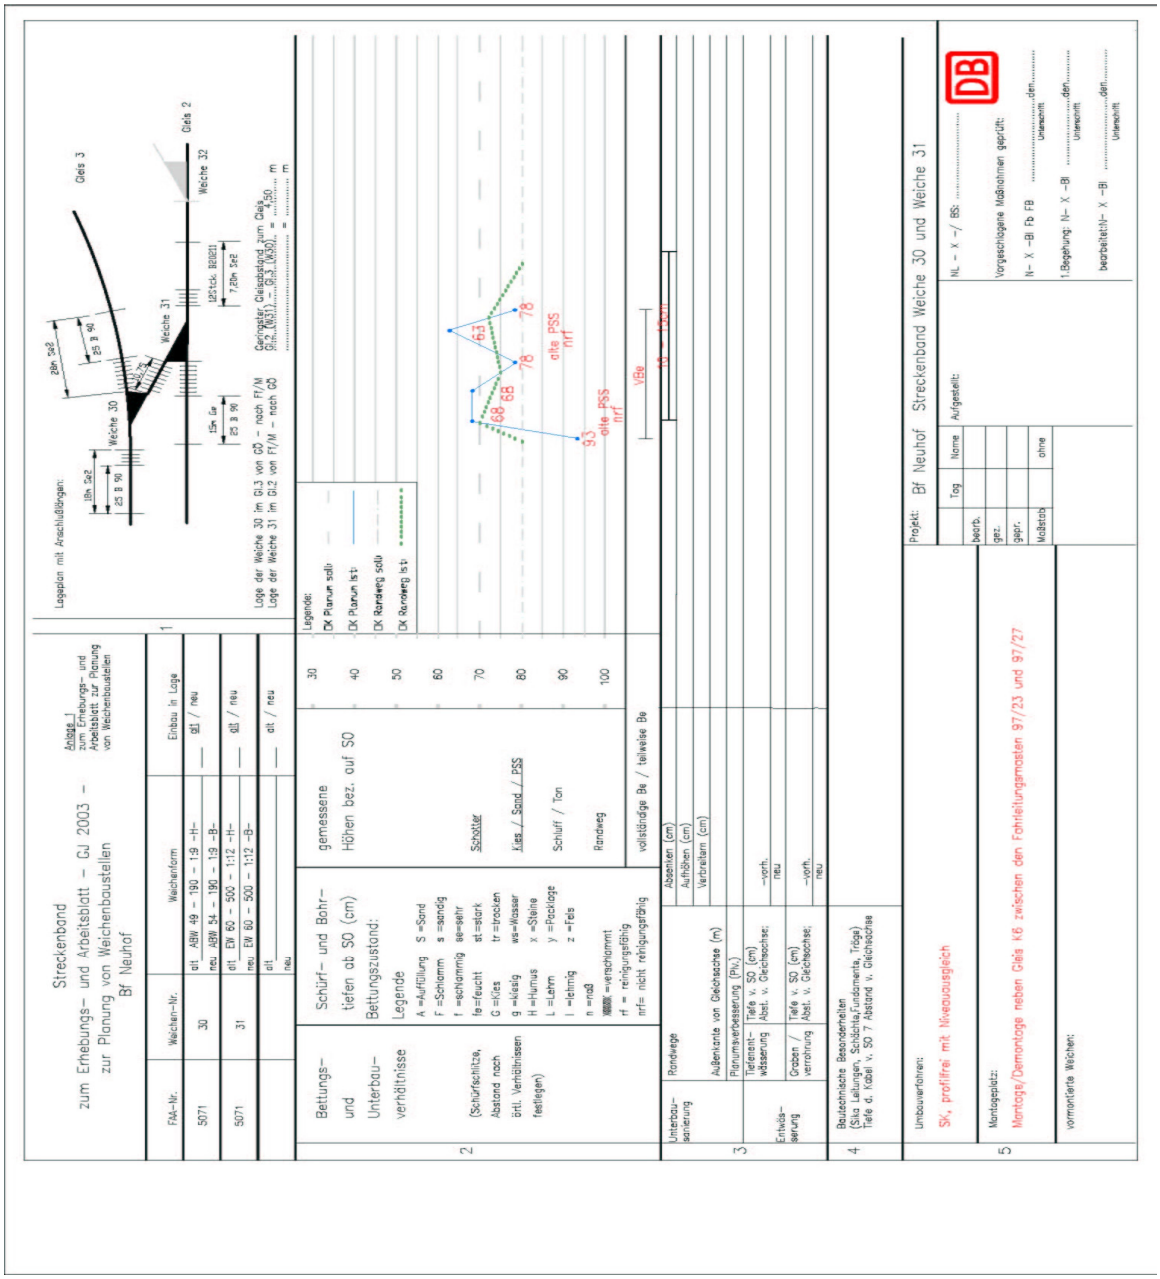
Streckenband
zum Erhebungs- und Arbeitsblatt – GJ 2003 –
zur Planung von Weichenbaustellen
Bf Neuhof
Anlage 1
zum Erhebungs- und Arbeitsblatt zur Planung von Weichenbaustellen
Legation mit Anschlußdüngen:
Weiche 30
Weiche 31
Weiche 32
Gleis 2
Gleis 3
Lage der Weiche 30 im Gl.3 von GÜ – nach FY/N
Lage der Weiche 31 im Gl.2 von FY/M – nach GÜ
Geringster Gleisabstand zum Gleis
FAA-Nr.
Weichen-Nr.
Weichenform
Einbau in Lage
5071
30
alt ABW 49 – 190 – 1:9 –H–
neu ABW 54 – 190 – 1:9 –B–
alt / neu
5071
31
alt EW 60 – 500 – 1:12 –H–
neu EW 60 – 500 – 1:12 –B–
alt / neu
alt
neu
alt / neu
Bettungs- und Unterbau-verhältnisse
(Schürfschlitze, Abstand nach örtl. Verhältnissen festlegen)
Schür- und Bohr-tiefen ab SO (cm)
Bettungszustand:
Legende
A =Auffüllung
F =Schlamm
f =schlammig
fe=feucht
G =Kies
g =kiesig
H =Humus
L =Lehm
l =lehmig
n =naß
rf = reinigungsfähig
nrf= nicht reinigungsfähig
S =Sand
s =sandig
se=sehr
st=stark
tr=trocken
wa=Wasser
x =Steine
y =Packlage
z =Fels
verschlämmt
gemessene Höhen bez. auf SO
Schotter
Kies / Sand / PSS
Schluff / Ton
Randweg
Legende:
OK Planum soll
OK Planum ist
OK Randweg soll
OK Randweg ist
63
68
78
ohne PSS
nrf
93
ohne PSS
nrf
VBe
vollständige Be / teilweise Be
Unterbau-sanierung
Randwege
Außenkante von Gleisachse (m)
Absenken (cm)
Aufhöhen (cm)
Verbreitern (cm)
Planumsverbesserung (Pbv)
Entwäs-serung
Tiefenent-wässerung
Tiefe v. SO (cm)
Abst. v. Gleisachse:
Gräben / verrohrung
Tiefe v. SO (cm)
Abst. v. Gleisachse:
—vorh.
neu
Bautechnische Besonderheiten
(Stks Leitungen, Schächte/Fundamente, Tröge)
Tiefe d. Kabel v. SO ? Abstand v. Gleisachse
Unterbauverfahren:
SK, profilfrei mit Niveausgleich
Montageplatz:
Montage/Demontage neben Gleis KÜ zwischen den Fahrleitungsmasten 97/23 und 97/27
vormontierte Weichen:
Projekt: Bf Neuhof Streckenband Weiche 30 und Weiche 31
Tag
Name
Aufgestellt:
bearb.
gez.
gepr.
Maßstab
ohne
NL – X –/ BS:
Vorgeschlagene Maßnahmen gerügt:
N– X –BI Fb FB
I.Begehung: N– X –BI
beorbeitet:N– X –BI
Unterschrift

NL: ..... **Projektnr.:.....**
Netzbezirk: ..... **AIB-Nr.:.....**
Bahnstellen-Nr.:.....
Rahmenkostenst.-Nr.:.....
PSP-Element,
Projekt-Nr.(SAP-R3):.....

Elektrotechnik

Mehrjahres-Maßnahmenplan für das Geschäftsjahr:.....

Der Maßnahmenplan sieht vor:

Art der Arbeiten:.....

Bezeichnung der Baustelle:.....

Lage der Baustelle: Gleis .....

km.....bis km.....

Geplanter Zeitraum der Ausführung: von.....bis.....

An Besonderheiten sind zu erwarten:.....

Größere Änderungen der Gleislage ja nein

Voraussichtlicher Umfang der Änderung:.....

Einbau von Bauweichen ja nein

Voraussichtlicher Einbauort:.....

Sonstiges:

Angaben zur Oberleitungsanlage im Bauabschnitt

1.1 Vorgesehene Begrenzung des auszuschaltenden Abschnittes

Gleis Weichenverbindung	Mast-Nr.:	km	Mast-Nr.:	km

1.2 Gleisabschnitte, die bei unter Spannung stehender Oberleitung erneuert werden

Gleis..... von Mast-Nr.:.....km.....Mast-Nr.:.....km.....
Gleis..... von Mast-Nr.:.....km.....Mast-Nr.:.....km.....

1.3 An den Bauabschnitt angrenzende Oberleitungsgruppen oder Abschnitte

Bf/Strecke..... Gruppe..... Bf/Strecke.....Gruppe.....
Bf/Strecke..... Gruppe..... Bf/Strecke.....Gruppe.....

1.4 Kettenwerknachspannungen

von Mast Nr.:.....km.....bis Mast Nr.:.....km.....
von Mast Nr.:.....km.....bis Mast Nr.:.....km.....
von Mast Nr.:.....km.....bis Mast Nr.:.....km.....

1.5 Günstige Lage der Bauweiche

.....
.....

1.6 Angaben über Möglichkeiten des Schwungfahrens.

.....
.....

1.7 Fahrdrahthöhe im Umbauabschnitt:

.....m über SO

1.8 Fahrdrahtabsenkung

von Mast Nr.:..... km.....bis Mast Nr.:.....km.....auf.....mm Fahrdrahthöhe
von Mast Nr.:..... km.....bis Mast Nr.:.....km.....auf.....mm Fahrdrahthöhe
von Mast Nr.:..... km.....bis Mast Nr.:.....km.....auf.....mm Fahrdrahthöhe
von Mast Nr.:..... km.....bis Mast Nr.:.....km.....auf.....mm Fahrdrahthöhe
von Mast Nr.:..... km.....bis Mast Nr.:.....km.....auf.....mm Fahrdrahthöhe
von Mast Nr.:..... km.....bis Mast Nr.:.....km.....auf.....mm Fahrdrahthöhe

1.9 Sind Zwangspunkte mit Fahrdrahthöhen von weniger als 5,20 m über SO vorhanden?

Ja nein

Falls ja: in anliegenden Lageplan für Oberleitungsanlagen sind in jedem Mastfeld Die niedrigsten Fahrdrahthöhen (einschließlich ½ VDE Eislast) einzutragen.

1.10 Fahrdrahthöhen an Bahnübergängen

BÜ km.....;..... m Fahrdrahthöhe
BÜ km.....;..... m Fahrdrahthöhe
BÜ km.....;..... m Fahrdrahthöhe
BÜ km.....;..... m Fahrdrahthöhe

1.11 An welchen Zwangspunkten und Bahnübergängen lässt sich die Fahrleitung durch wirtschaftlich vertretbare Maßnahmen höher regulieren?

		erzielbare Kosten bei Höhenregulierung
Von Mast Nr:.....km.....bis Mast Nr.:.....km.....	.....cm	.....€
Von Mast Nr:.....km.....bis Mast Nr.:.....km.....	.....cm	.....€
Von Mast Nr:.....km.....bis Mast Nr.:.....km.....	.....cm	.....€
Von Mast Nr:.....km.....bis Mast Nr.:.....km.....	.....cm	.....€

1.12 Oberleitungsmasten, an denen der Abstand Gleismitte – Mastfundamentvorderkante von 2,85 unterschritten wird

Von/am Mast Nr:.....km.....bis Mast Nr.:.....km.....auf ..... m
Von/am Mast Nr:.....km.....bis Mast Nr.:.....km.....auf ..... m

1.13 Sonstige Angaben:

(Speise- und Verstärkungsleitungen, Rückstromführung und Bahnerden, Kabel, El-Signale, Weichenheizungen usw., sofern diese auf die Abwicklung der Oberbauarbeiten Einfluss haben.
.....
.....

❑

NL: ..... **Projektnr.:.....**
Netzbezirk: ..... **AIB-Nr.:.....**
Bahnstellen-Nr.:.....
Rahmenkostenst.-Nr.:.....
PSP-Element,
Projekt-Nr.(SAP-R3):.....

Leit-und Sicherungstechnik

Mehrjahres-Maßnahmenplan für das Geschäftsjahr:.....

Der Maßnahmenplan sieht vor:

Art der Arbeiten:.....

Bezeichnung der Baustelle:.....

Lage der Baustelle: Gleis .....

km.....bis km.....

Geplanter Zeitraum der Ausführung: von.....bis.....

Einbau von Bauweichen ja nein

BW Nr.:.....im Gleis.....km WA.....

Form.....Vorgesehener Einbautermin.....
Vorgesehener Ausbautermin.....

BW Nr.:.....im Gleis.....km WA.....

Form.....Vorgesehener Einbautermin.....
Vorgesehener Ausbautermin.....

Vorgesehene Betriebsweise

von km.....bis km.....Betriebsart.....

von km.....bis km.....Betriebsart.....

Sonstiges:
(Versetzen von Signalen, Antrieben, Kabelkanälen, Schächten, Drahtzugleitungen usw., welche die Bauarbeiten behindern)
.....
.....

1. **Günstige Lage der Bauweiche:**

   BW Nr.:.....im Gleis.....km WA.....

   BW Nr.:.....im Gleis.....km WA.....

2. **Günstige Lage der erforderlichen Gleissperren:**

   .....
   .....
   .....

3. **Standorte der für die Baumaßnahme zu versetzenden Signale:**

   .....
   .....
   .....

4. **Lage der Hilfsbetriebsstelle:**

   .....
   .....
   .....

5. **Sonstige Angaben:**

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

❑

Aufmassblatt und Querprofilskizze

Aufmaß der vorhandenen Bahnkörperbreiten, Randweg- und Kabeltiefen, gemessen von vorhandener SO und Abstand der Kabeltrassen von Gleisachse (bei überhöhten Gleisen ist der Unterstrang maßgebend).

Strecke:.....

Gleis:.....

Umbauabschnitt:.....von km.....bis km.....

Station	Bahnkörperbreite von Gleisachse	Abstand Kabeltrasse von Gleisachse	Randwegtiefe von SO	Kabeltiefe von SO	Vorhandene Kabelüberdeckung	Geplante Gleishebung	Bemerkungen (Signale, Kabel usw.)

❑

1 Niederschrift zur Erstbegehung

Arbeitsblatt für Oberbau-Baustellen			
"Niederschrift zur Erstbegehung"			
		Text	
1	**Allgemeines**		
	zu beteiligende Stellen:		
	Planendes Büro		
	Baubetriebskoordinator		
	Bezirksleiter Betrieb		
	Anlagenverantwortlicher (Alv)		
	Bezirksleiter LST		
	Bezirksleiter E/M		
	andere Geschäftsbereiche (NL)		
1.1	**Umbauabschnitt**		
	Gleis von Bf bis Bf, von km bis km		
	Weiche in km / Anschluss-länge und einzubauende Oberbau-form		
1.2	**Umbaulänge in [m]**		
1.3	**Umbautermin mit Sperrzeit**		
1.3.1	ggf. erforderliche Stopfarbeiten nach Umbau		
1.4	**Umbauverfahren**		
1.5	**Untergrund**		
1.5.1	**Entwässerungsverhältnisse**		
1.6	**Analyse Schotter/Untergrund**		
1.6.1	**Kampfmittelfreiheit**		

1.7	**Vermessungstechnische Angaben**		
1.8	**Gleisabstände**		
1.9	**Geschwindigkeit nach VzG**		
1.10	**Ausführende**		
	AN		
	Nachunternehmer		
	Nebenunternehmer		
	Bauleiter Oberbau		
	Bauleiter Bau		
	Bauüberwacher (Bahn)		
	Fahrbahn		
	Leit- und Sicherungstechnik		
	Elektrotechnik		
	Sicherungsüberwachung		
	Signalbauarbeiten / AN		
	Oberleitungsarbeiten / AN		
	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator		
1.11	**Arbeitsschutz und Sicherheit nach GUV**		
2	**Oberbautechnische Maßnahmen**		
2.1	**Entwurf des Bauablaufplanes mit allen betrieblichen und baulichen Daten durch den AN erläutern**		
2.1.1	Bauablaufplan-Entwurf überprüfen auf Beachtung der Angaben aus:		
	Erhebungs- und Arbeitsblatt mit Streckenband		
	Vorgaben des AG (Rahmenbauablaufplan)		
	Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung		

2.2	**Auf- und Abrüsten der Baueinheit und der Material-transportwagen in einem Gleis mit ausgeschalteter Oberleitung:**		
	im Bahnhof		
	im gesperrten Gleis / Baugleis		
2.3	**Tfz-Bedarf und sonstige Maschinen ermitteln, soweit nicht durch Bauablaufplan-Entwurf vorgeschlagen, Bereitstellung von Gleiskraftwagen regeln**		
	Logistik		
	Tarifpunkt		
2.4	**Steuerung des Baugeschehens durch Bauleitzentrale**		
	Standort		
2.5	**Bahnübergangsprovisorien festlegen**		
	Art		
	Ausführende		
2.6	**Aus- und Einbau der Überwegbefestigung festlegen**		
	Art und Umfang		
	Ausführende		
2.7	**Oberbaumaterialien wie z. B.**		
	Schienen		
	Schwellen		
	Kleineisen		
	Weichenteile		
	Schotter		
2.8	**Verladung der Bettungsrückstände**		
	Arbeitszug, LkW, MFS 40 usw.		
2.9	**Wiederverwendung/Entsorgung**		
	Schienen		
	Schwellen		
	Altschotter		
	Aushub		
	Sonstiges		
2.10	**Entladung der Oberbaumaterialien**		
2.11	**Wagenbedarf Entsorgung**		

2.12	**Maßnahmen für Beseitigung der Arbeitsraumeinschränkungen wie Festpunkte, Fundamente usw. festlegen**		
2.13	**Vermessungstechnische Maßnahmen**		
	Sichern der Vermarkungspunkte		
	Trassierung		
	Fahrdynamische Prüfung		
2.14	**Betrachtung der Gleisabschnitte, in denen das gewählte Umbauverfahren nicht angewendet werden kann (Schienenband entsprechend aufstellen)**		
	Brücken		
	Bahnsteige		
	Einschnitte zwischen Stützmauern		
	nicht ausreichender Gleisabstand usw.		
2.15	**Behandlung der Randwege**		
2.16	**Aus- und Einbau von**		
	Führungsschienen		
	Leitschienen		
	Brückenabdeckungen		
2.17	**Lage der Isolierstöße festlegen**		
	Km (Schienenstrang)		
	Anzahl		
	örtl. herzustellende Iso		
2.18	**Ausbohlen an Bauwerken**		
	Brücken		
	Stützmauergeländer usw.		
2.19	**Montage-/ Demontageplätze**		
2.20	**Zwischenlagerplätze / Bereitstellungslager für Bettung und Ähnliches**		
2.21	**Beleuchtung**		

2.22	**Maßnahmen zur Einhaltung der Immissionsschutz-bestimmungen**		
2.23	**Behördliche Genehmigungen**		
	Sonn- Nacht- Wochenendarbeit		
2.24	**Bautechnische Besonderheiten**		
2.25	**Bettungsarbeiten**		
2.26	**Oberbautechnische Planung festlegen**		
	RZ, §18.3		
	Unternehmensinterne Genehmigung (UIG / ZiE)		
	Bauartänderung		
2.27	**Erfassung von Kreuzungen Dritter**		
3	**Signaltechnische Maßnahmen**		
3.1	**Änderungen an den Signalanlagen festlegen**		
3.2	**Änderung der Flankenschutzeinrichtung vereinbaren**		
	Gleisfreimeldeposten		
3.3	**Kennzeichnung der Kabeltrassen (auf Kabelmerkblatt hinweisen)**		
3.4	**Aufstellfläche und Stromversorgung für Hilfsbetriebsstelle sowie Lage der Hilfskabel festlegen**		
3.5	**Überprüfen der erfassten hinderlichen Signaleinrichtungen auf Vollständigkeit und deren kurzfristige Beseitigung festlegen, wie z. B.**		
	Drahtzugleitungen		
	Signale, Antriebe		

	Zugeinwirkungen, Linienleiterkabel, Achszähler		
	Balisen		
3.6	**Standorte der zu versetzenden und neu aufzustellenden Signale überprüfen (Signalsicht)**		
3.7	**Sicherung der Langsamfahrstelle**		
	Indusi		
	Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE)		
3.8	**Isolierstöße (Behelfsstöße) festlegen**		
3.9	**Zeit und Dauer der Umschaltung festlegen**		
3.10	**Signaltechnische Besonderheiten**		
3.11	**TK-Einrichtungen**		
	Fernsprecher		
	Heißläuferortungsanlage		
	Kabellage und -querungen		
	Funkausbreitungsmessungen		
3.12	**Signaltechnische Planung festlegen**		
	RZ-Planung		
	Planung der Langsamfahrstellen		
	LST-Planung		
	Gleissperren		
4	**Oberleitungstechnische Maßnahmen**		
4.1	**Änderung an der Oberleitung festlegen**		
4.2	**Ausschalten und Erden der Oberleitung vereinbaren**		
	Schaltantragsteller		
	Erder		
4.2.1	Umbaugleis(e)		
4.2.2	Betriebsgleis(e)		

4.3	**Rückstromführung und Bahnerdung festlegen**		
	Rückstromführung		
	Mast- und Bauwerkserden		
	Erdungsseil		
4.4	**Gleisabschnitte, die unter Spannung stehen**		
4.4.1	Schaltgrenzen festlegen		
4.5	**Angabe der geringsten Höhe der Oberleitung über SO**		
4.6	**Kennzeichnen der Kabeltrassen (auf Kabelmerkblatt hinweisen)**		
4.7	**Zeit und Dauer für vorübergehende Oberleitungsänderungen**		
4.8	**Oberleitungstechnische Besonderheiten**		
4.9	**Schienengebundene und nichtschienengebundende Baufahrzeuge, welche den Sicherheitsabstand bei Arbeiten unter eingeschalteter Oberleitung unterschreiten, müssen mit wirksamer Hub/Schwenkbegrenzung arbeiten und schutzgeerdet sein.**		
4.10	**Elektrotechnische Anlagen für Licht- und Kraftstrom**		
	Beleuchtung		
	Weichenheizung		
4.11	**Oberleitungstechnische Planung festlegen**		
	RZ-Planung		
5	**Betriebliche Maßnahmen**		
5.1	**Umschaltung der Signalanlagen, Sperrzeit**		
5.2	**Sperrzeiten für vorübergehende Oberleitungsmaßnahmen**		

5.3	**Betriebsablaufplan erstellen (Ein-/Ausfahren der Maschinen, Arbeitszüge in das Arbeitsgleis usw.)**		
5.4	**Zusätzliche Sperrzeiten im Betriebsgleis für arbeitsbedingte Abläufe festlegen**		
5.5	**Geschwindigkeitsbeschränkungen festlegen**		
5.6	**Gleisbedarf für das Abstellen der Bautrupps, Baumaschinen und Materialwagen ermitteln, soweit nicht durch Bauablaufplan festgelegt**		
5.7	**Betra-Angaben über Lü-Sendungen bekannt geben und erläutern**		
5.8	**Einsatz von zusätzlichem Betriebspersonal**		
	FdL		
	Gleisfreimeldeposten		
	Rückmeldeposten/Zugschlussmeldeposten		
	Befehlsübermittler		(Anm.: Mit KoRil 408 abklären)
	Bahnübergangsposten		
5.9	**Einleiten von Maßnahmen zum Schutz der Reisenden**		
5.10	**Maßnahmen für betriebliche Abweichungen wie erforderliche Umleitungen**		
	Schienenersatzverkehr		
	geänderte Zugbildung		
5.11	**Betriebliche Besonderheiten**		
6	**Station & Service**		
6.1	**Behelfsbahnsteige**		

6.2	**Reisendeninformation**		
6.3	**Besonderheiten**		

❑

Richtlinie

Bautechnik, Leit-, Signal- und Telekommunikationstechnik	Oberbauarbeiten planen
Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen -Planungsphase I-	823.0100A09
Baustellenverzeichnis	Seite 1

Niederlassung		Umbaujahr		Projektnr.	
Netzbezirk		Bauzeit		AIB-Nr	
Bst-Name		Abschnitt		Kostenstelle	
				PSP-Element	
Str. - Nr.		La-Str.-Nr		Projekt-Nr.(SAP-R 3/Netz)	
				Umbauverfahren	

Betriebs-weise	Datum von / Uhr Datum bis / Uhr		Sperr Nbgl Gleis von/nach Datum von / Uhr			Lfst Nbgl Gleis von/nach km/h km von / km bis			Lfst Umbaugleis von/nach km/h km von / km bis		Datum	Fort - schreibung
Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen -Planungsphase I- Baustellenverzeichnis												1.) 2.) 3.)
VMK-Nr.	Kilometer		GLO	Netz	Vzul km/h	FAA	Oberbauform		vorhanden künftig		Umbau- bzw. Leistungs-Länge	Anschlußlänge


Bemerkungen:


Verteiler:

Hinweis:

Die beiden nachfolgenden Seiten 2 und 3 stellen immer durch ein

Aneinanderfügen den Gesamt-Rahmenbauablaufplan Gleise dar !

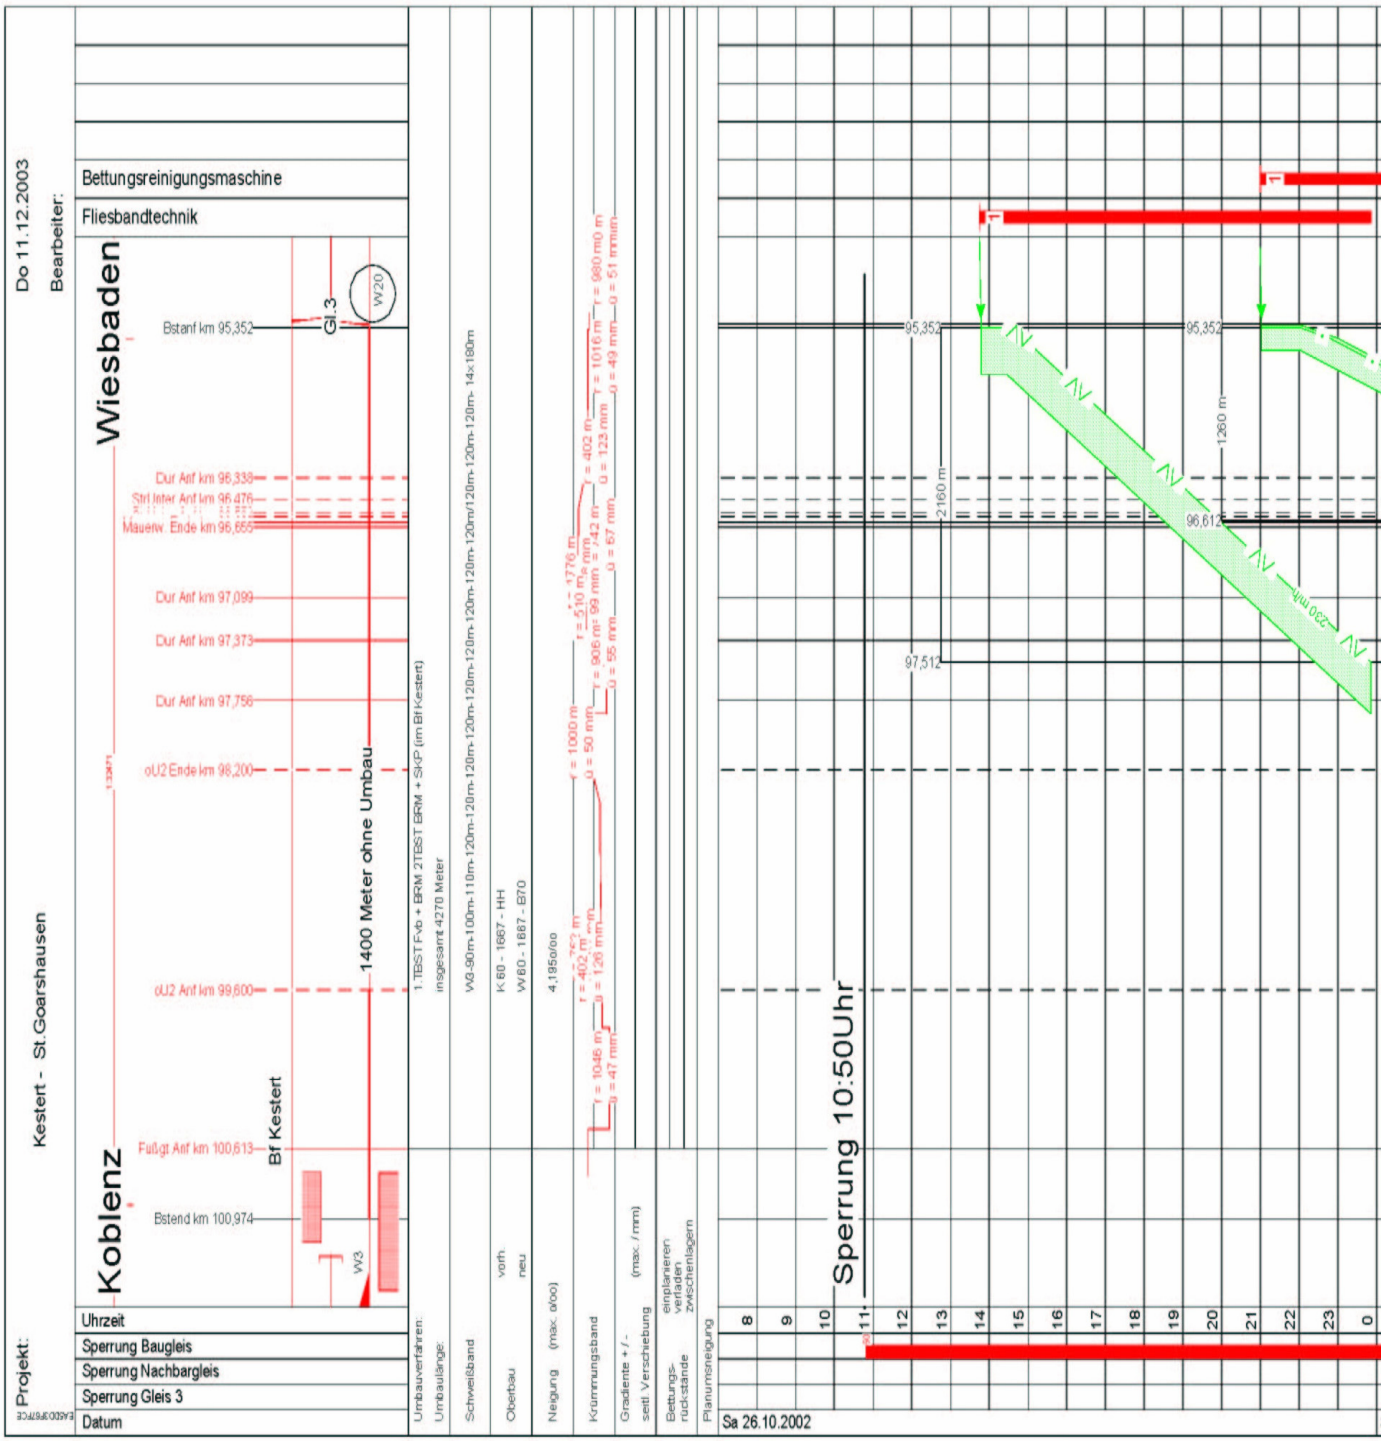

Projekt:
Kestert - St.Goarshausen
Bearbeiter:
Do 11.12.2003
Bettungsreinigungsmaschine
Fliesbandtechnik
Wiesbaden
Koblenz
Bf Kestert
Bstanf km 95,352
Gl.3
W20
Dur Anf km 96,338
Strl.Inter Anf km 96,476
Mauerw. Ende km 96,655
Dur Anf km 97,099
Dur Anf km 97,373
Dur Anf km 97,756
oU2 Ende km 98,200
oU2 Anf km 99,600
Fußgt Anf km 100,613
Bstend km 100,974
1400 Meter ohne Umbau
W3
Umbauverfahren:
1.TEST Fvb + BRM 2TEST BRM + SKP (im Bf Kestert)
Umbaulänge:
insgesamt 4270 Meter
Schwellband
W9-90m-100m-110m-120m-120m-120m-120m-120m-120m-120m-120m-120m-120m-120m- 14x180m
Oberbau
vorh.
K 60 - 1667 - HH
neu
W60 - 1667 - B70
Neigung (max. o/oo)
4,195o/oo
Krümmungsband
r = 1776 m
r = 1000 m
r = 510 m
r = 402 m
r = 1016 m
r = 980 m
r = 906 m
r = 742 m
r = 402,76 m
r = 1046 m
o = 67 mm
o = 55 mm
o = 50 mm
o = 42 mm
o = 123 mm
o = 49 mm
o = 51 mm
o = 126 mm
o = 47 mm
Gradiente +/- (max. / mm)
seitl. Verschiebung
Bettungs-rück-stände
einplanieren
verladen
zwischenlagern
Planumsneigung
Uhrzeit
Sperrung Baugleis
Sperrung Nachbargleis
Sperrung Gleis 3
Datum
Sperrung 10:50Uhr
95,352
96,612
97,512
2160 m
1260 m
230 m
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
Sa 26.10.2002

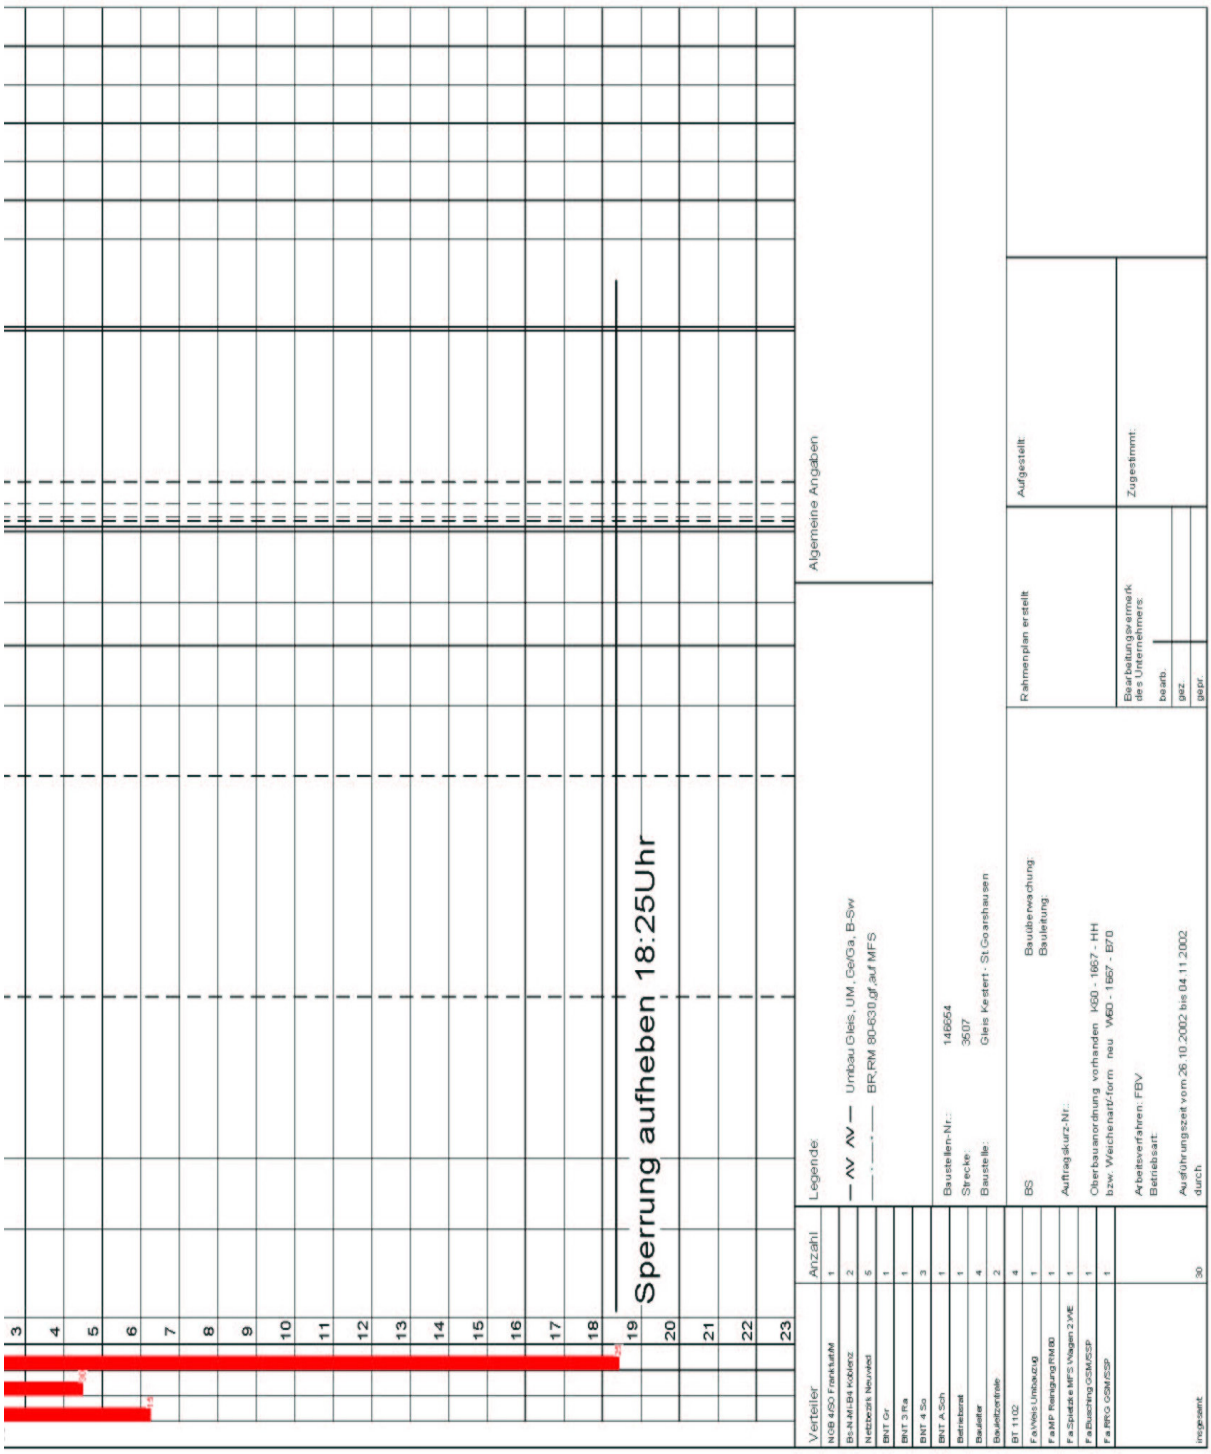

Sperrung aufheben 18:25Uhr
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Verteiler
Anzahl
Legende
Allgemeine Angaben
Umbau Gleis, UM, Ge/Ga, B-Syw
BR,RM 80-630,gf,auf MFS
Baustellen-Nr.: 146654
Strecke: 3507
Baustelle: Gleis Kastert - St.Goarshausen
Bauüberwachung:
Bauleitung:
Auftragskurz-Nr.:
Oberbauanordnung vorhanden: HBO - 1667 - HH
bzw. Weichenart/-form: neu: WBO - 1667 - B70
Arbeitsverfahren: FBV
Betriebsart:
Ausführungszeit vom 26.10.2002 bis 04.11.2002
durch:
insgesamt: 30
Rahmenplan erstellt
Aufgestellt:
Zugestimmt:
Bearbeitungsvermerk des Unternehmers:
bearb.
gez.
gepr.

Hinweis:

Die beiden nachfolgenden Seiten 2 und 3 stellen immer durch ein

Aneinanderfügen den Gesamt-Rahmenbauablaufplan Weichen dar !

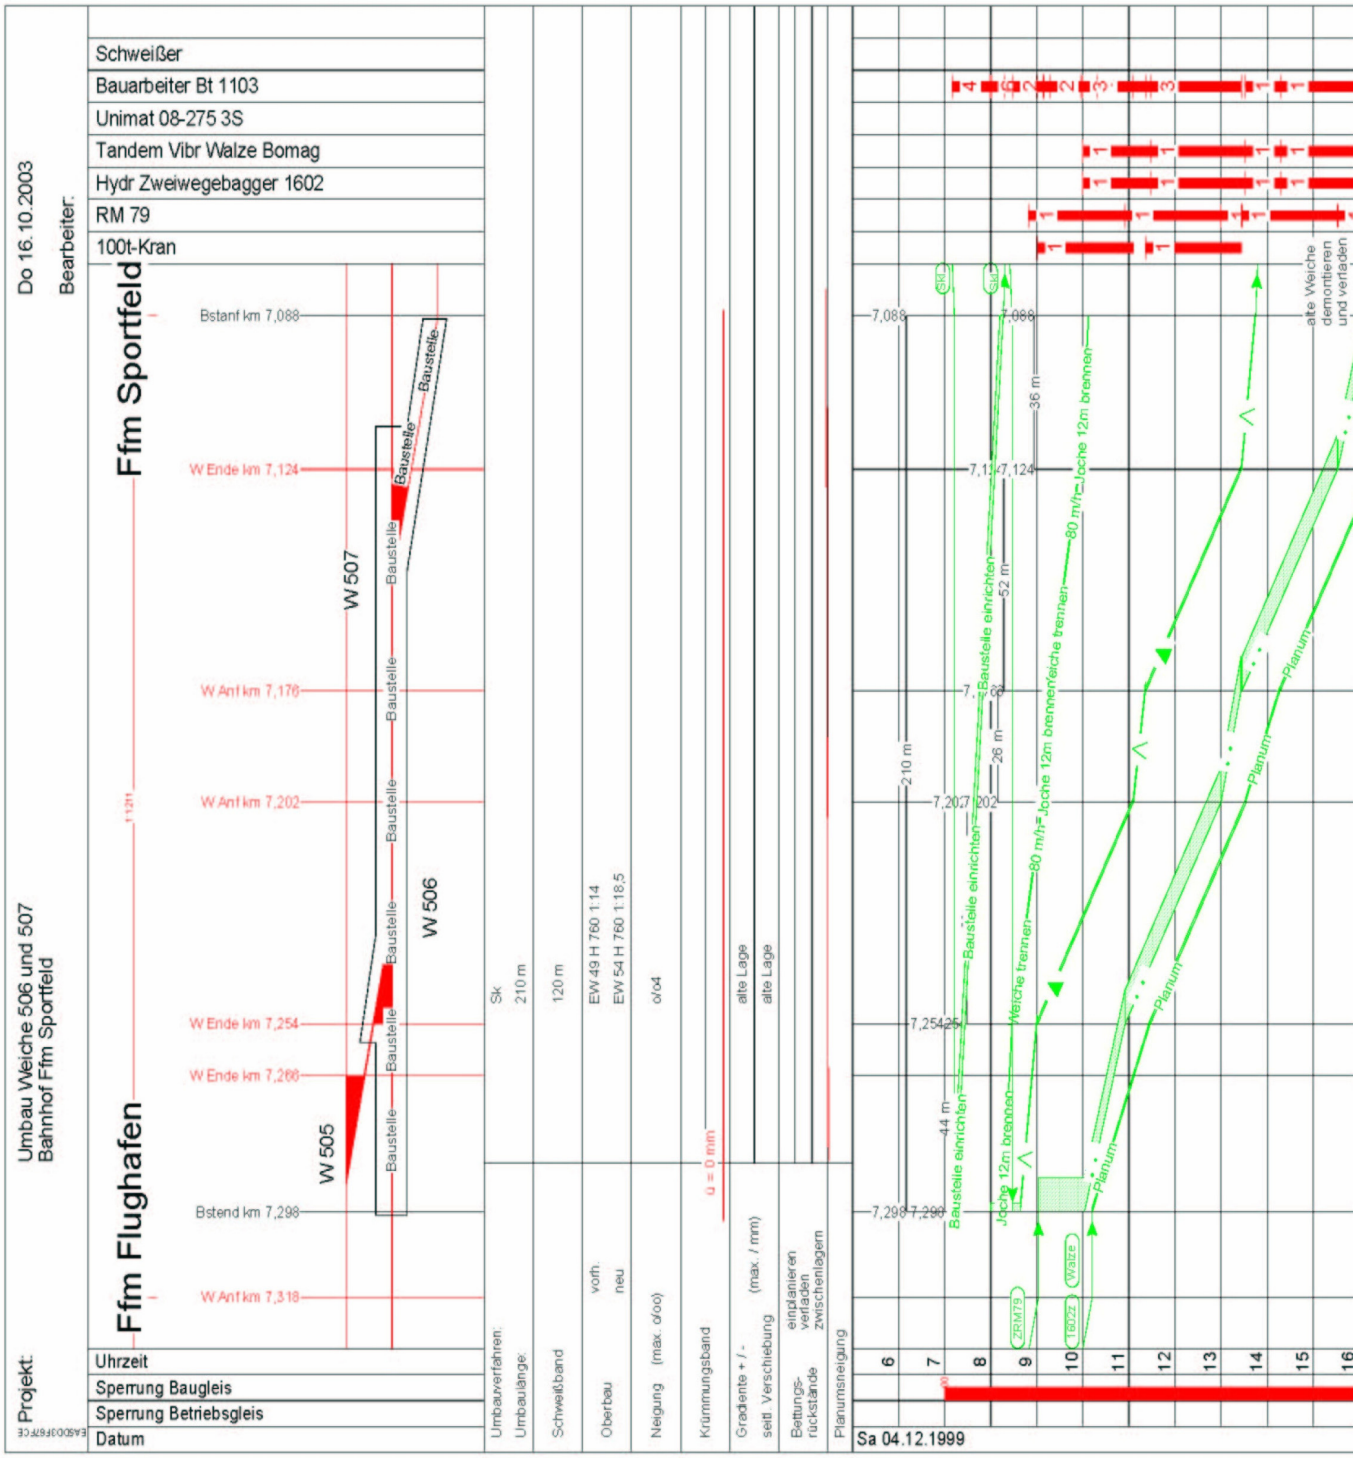
Projekt:
Umbau Weiche 506 und 507
Bahnhof Ffm Sportfeld
Bearbeiter:
Do 16.10.2003
Schweißer
Bauarbeiter Bt 1103
Unimat 08-275 3S
Tandem Vibr Walze Bomag
Hydr Zweiwegebagger 1602
RM 79
100t-Kran
Ffm Sportfeld
Ffm Flughafen
Bstanf km 7,088
W Ende km 7,124
W Anf km 7,176
W Anf km 7,202
W Ende km 7,254
W Ende km 7,266
Bstend km 7,298
W Anf km 7,318
W 507
W 506
W 505
Baustelle
Uhrzeit
Sperrung Baugleis
Sperrung Betriebsgleis
Datum
Umbauverfahren:
Umbaulänge:
Schweißband
Oberbau
vorh.
neu
Neigung (max. o/oo)
Krümmungsband
Gradiente + / - (max. / mm)
seitl. Verschiebung
Bettungs-rückstände
Planumsneigung
Sk
210 m
120 m
EW 49 H 760 1:14
EW 54 H 760 1:18,5
o/o4
alte Lage
alte Lage
einplanieren
verladen
zwischenlagern
Sa 04.12.1999
7,088
7,124
7,207
7,254
7,298
36 m
52 m
26 m
44 m
210 m
Baustelle einrichten
Weiche trennen
Joche 12m brennen
80 m/h
Planum
alte Weiche demontieren und verladen
ZRM79
16022
Walze

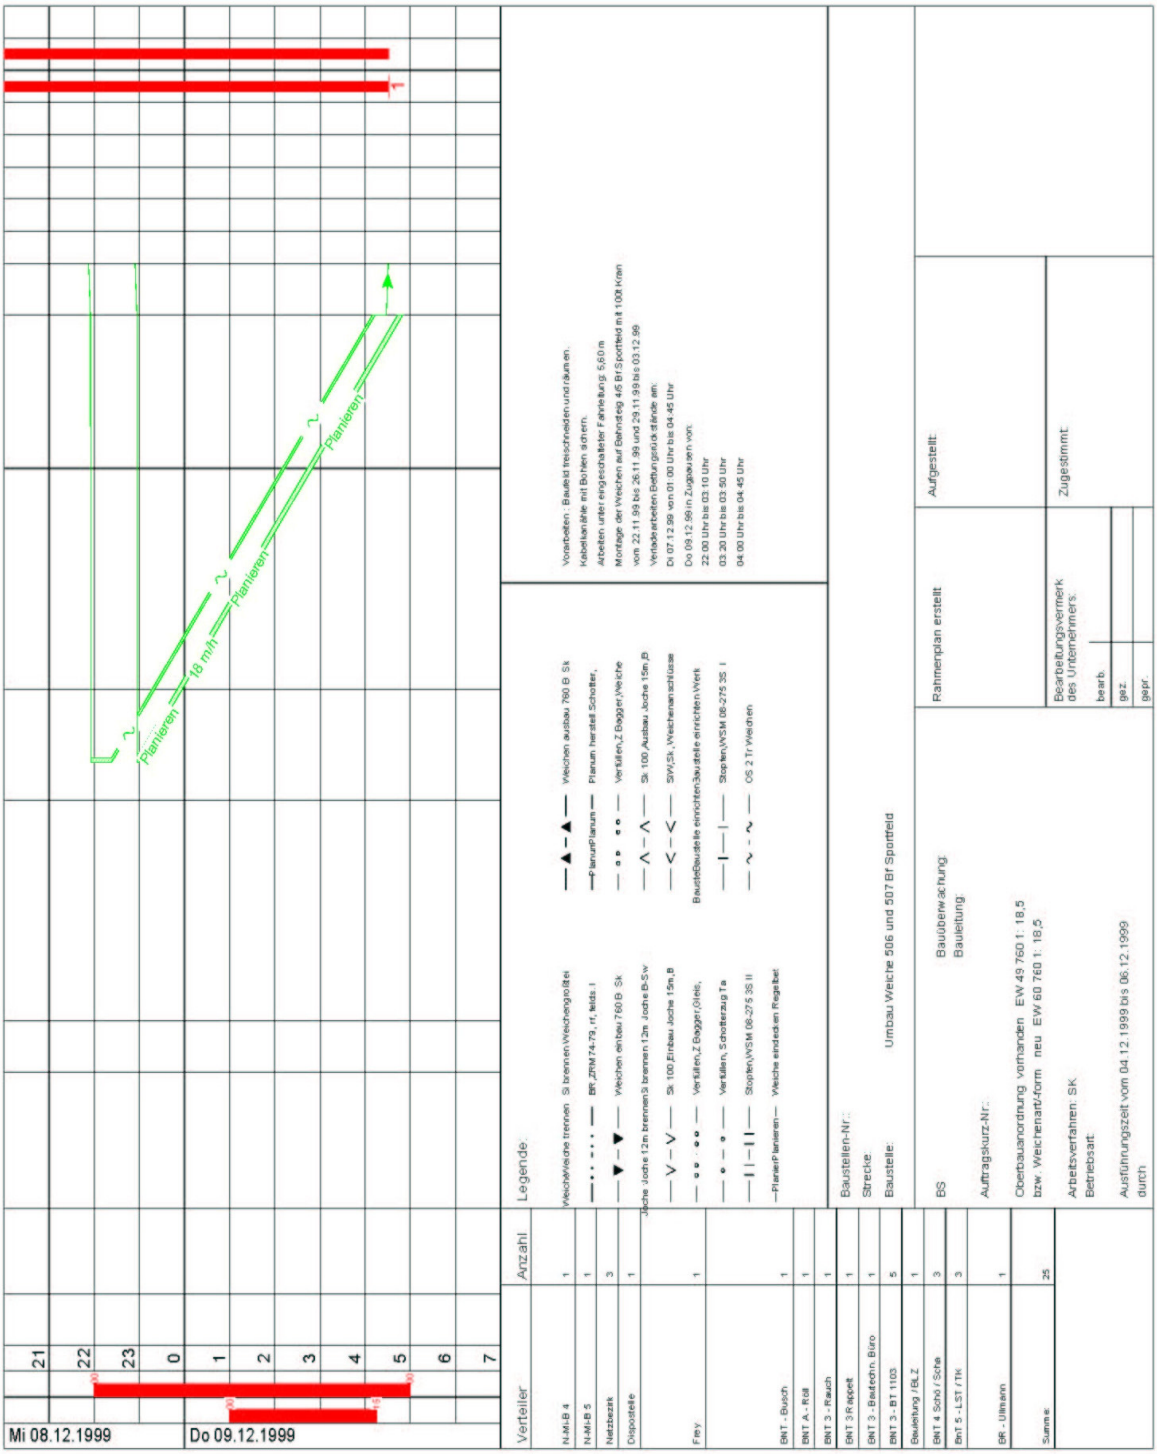
Mi 08.12.1999
Do 09.12.1999
21
22
23
0
1
2
3
4
5
6
7
Planieren
18 m/h
Planieren
Planieren
Legende:
Verteiler
Anzahl
Rahmenplan erstellt:
Aufgestellt:
Zugestimmt:
Bearbeitungsvermerk des Unternehmers:
Baustellen-Nr.:
Strecke:
Baustelle: Umbau Weiche 506 und 507 Bf Sportfeld
Bauüberwachung:
Bauleitung:
Auftragskurz-Nr.:
Oberbauanordnung vom/ändern EW 49 760 1: 18,5
bzw. Weichenart/-form neu EW 60 760 1: 18,5
Arbeitsverfahren: SK
Betriebsart:
Ausführungszeit vom 04.12.1999 bis 06.12.1999
durch
Summe: 25


Richtlinie

Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik	Oberbauarbeiten planen
Planungsphase I, Zeitenplan - Ablaufschema -	**823.0100Z01** **Seite 1**

AU 820 02 04 (alt)

Zeitraum vor Baubeginn **48 Monate**

Vormerkkarte mit Vorschlag des Ausführungsjahres aufstellen (TIV) **Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz** **AIv** **Fachbeauftragte Fb**	**48 bis 40 M** Beteiligung Anderer (z.B. LST, EM) **Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz**	**48 bis 40 M** finanzielle Mittelfreigabe für Planungsleistungen **Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz** **EBA**
Anmeldung begutachten und Festlegung Umbaujahr **Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz** **AIv** **Fachbeauftragter Fb**	**bis 48 M** Fortschreibung der abgestimmten Maßnahmen **Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz, regionale Baubetriebsplanung**	**48 bis 40 M** Auftragsbearbeitung Investmaßn.: Vergabe Ing. Leistungen (Untergrunduntersuchung, Vermessung) **Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz**
Vormerkkarte in SAP R 3/Netz-System eingeben. Kostenschätzung und Zuscheidung Invest / Instand Materialdisposition **Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz**		**40 bis 36 M** Streckenband und E- / A-Blatt erstellen u. prüfen (Umbauverfahren) Erstbegehung **Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz (erstellen u. prüfen)**
Baumaßnahmen mit Besteller und Korridor hinsichtlich strategische Ziele abstimmen **Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz**	**bis 48 M** Maßnahmenplan (MJOP) für mehrjährigen Baubedarf aufstellen **Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz, regionale Baubetriebsplanung**	**40 bis 36M** Entsorgungsplan, SiGeKo, Bauhaftpflicht-Versicherung aufstellen **Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz**
Baumaßnahme Abstimmung hinsichtlich Budget **Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz**		**36 bis 22 M** Baustellenserien bilden **Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz** **Baubetriebskoordinator**

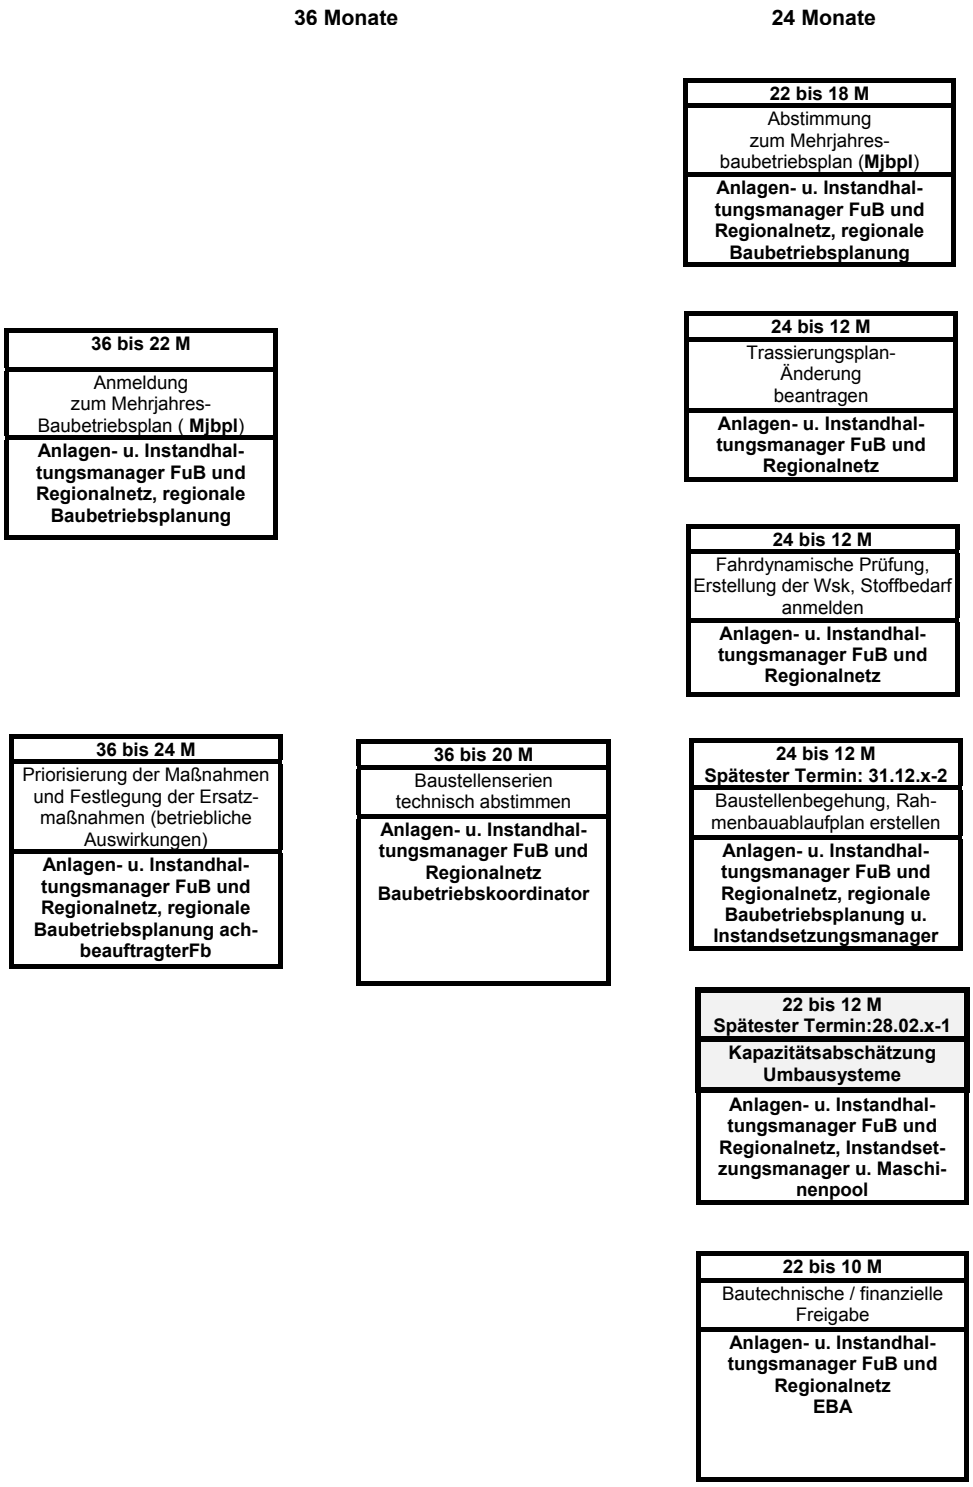
36 Monate
24 Monate
22 bis 18 M
Abstimmung zum Mehrjahres-baubetriebsplan (Mjbpl)
Anlagen- u. Instandhal-tungsmanager FuB und Regionalnetz, regionale Baubetriebsplanung
36 bis 22 M
Anmeldung zum Mehrjahres-Baubetriebsplan (Mjbpl)
Anlagen- u. Instandhal-tungsmanager FuB und Regionalnetz, regionale Baubetriebsplanung
24 bis 12 M
Trassierungsplan-Änderung beantragen
Anlagen- u. Instandhal-tungsmanager FuB und Regionalnetz
24 bis 12 M
Fahrdynamische Prüfung, Erstellung der Wsk, Stoffbedarf anmelden
Anlagen- u. Instandhal-tungsmanager FuB und Regionalnetz
36 bis 24 M
Priorisierung der Maßnahmen und Festlegung der Ersatz-maßnahmen (betriebliche Auswirkungen)
Anlagen- u. Instandhal-tungsmanager FuB und Regionalnetz, regionale Baubetriebsplanung ach-beauftragterFb
36 bis 20 M
Baustellenserien technisch abstimmen
Anlagen- u. Instandhal-tungsmanager FuB und Regionalnetz Baubetriebskoordinator
24 bis 12 M
Spätester Termin: 31.12.x-2
Baustellenbegehung, Rah-menbauablaufplan erstellen
Anlagen- u. Instandhal-tungsmanager FuB und Regionalnetz, regionale Baubetriebsplanung u. Instandsetzungsmanager
22 bis 12 M
Spätester Termin:28.02.x-1
Kapazitätsabschätzung Umbausysteme
Anlagen- u. Instandhal-tungsmanager FuB und Regionalnetz, Instandset-zungsmanager u. Maschi-nenpool
22 bis 10 M
Bautechnische / finanzielle Freigabe
Anlagen- u. Instandhal-tungsmanager FuB und Regionalnetz
EBA

12 Monate | **7 / 4 Monate** | **3 Monate**

22 bis 10 M **Spätester Termin: 28.02. x-1**
Anmeldung zum Jahresbaubetriebsplan (Jbpl)
Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz, regionale Baubetriebsplanung

7 M
Anmeldung zum unterjährigen Baubetriebsplan A-Maßnahme
Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz, regionale Baubetriebsplanung

4 M
Anmeldung zum unterjährigen Baubetriebsplan B-Maßnahme
Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz, regionale Baubetriebsplanung

12 bis 4,5 M **spätestens 140 Tage vor Baubeginn**
Leistungsverzeichnisse und Teilkostenanschläge Bau aufstellen und an N.DI-x-L übergeben
Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz, Instandsetzungsmanager

12 bis 6 M
Material bestellen
Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz

bis 3 M
Tätigkeitsblatt gemäß Planungsphase II erstellen (Ril 823.0150)
Baubetriebskoordinator Projektleiter Anlagen- u. Instandhaltungsmanager FuB und Regionalnetz


Legende:

frühester - spätester Bearbeitungszeitpunkt vor Baubeginn
Tätigkeit
zuständig gemäß Zeitplan – Anhang 01 -

❑

Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik	Oberbauarbeiten planen
Planung und Abwicklung von Oberbaumaßnahmen - Planungsphase I - Mehrjahres- und Jahresplanung - Querprofilskizze	823.0100Z07 Seite 1

AU 820 02 04 (alt)

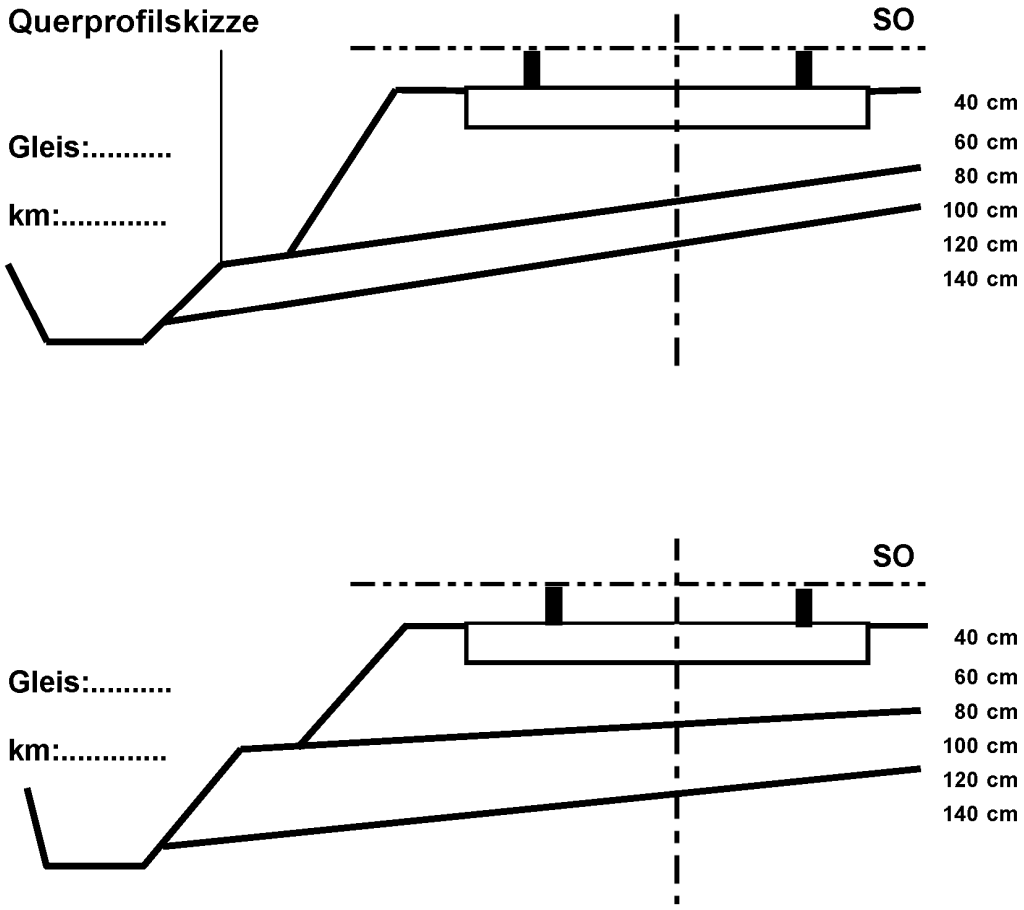

Aufgestellt:
NL --x—
I.NIA-x-L

❑

1 Zweck, Inhalt und Geltungsbereich

(1) Diese Richtlinie steuert die wirtschaftliche und termingerechte Vorbereitung zur Durchführung von Oberbaumaßnahmen. **Zweck**

(2) Die Planungsphase II regelt die Aktivitäten der am Umbau Mitwirkenden, die u.a.: **Inhalt**

- das Tätigkeitsblatt,
- den Bauablaufplan,
- den Gleisbelegungsplan,
- den Betriebsablaufplan,

vorzubereiten haben.

(3) Diese Richtlinie ist für alle **Geltungsbereich**

- im Oberbauprogramm aufgeführten Gleis- und Weichenbaustellen,
- Arbeiten am Oberbau im Zusammenhang mit Bauvorhaben – auch bei Maßnahmen der Neu- und Ausbaustrecken – wenn durch diese die Betriebsabwicklung beeinflusst wird

anzuwenden.

2 Unterlagen zur Baudurchführung

(1) Grundlage für das Koordinieren und Überwachen der Vorbereitungen ist das „Tätigkeitsblatt für die Vorbereitung von Oberbaumaßnahmen“. Es ist von dem Projektleiter für Oberbaumaßnahmen zu führen, für Maßnahmen die nach der RiF 406 als A – Maßnahme oder B – Maßnahme angemeldet wurden sowie bei anderen Baumaßnahmen, wenn es erforderlich ist. **Tätigkeitsblatt**
Anhang 01

Dabei ist sicherzustellen, dass

- die Baumaßnahme finanziell und ggf. bauaufsichtlich genehmigt und freigegeben ist,
- die Betriebsweise nach Art und Dauer festgelegt wurde,

- eine Gleissperrung für andere Baumaßnahmen mitgenutzt werden kann,
- andere an der Baumaßnahme beteiligte Fachdienste ihre Planungen eingeleitet bzw. abgeschlossen haben,
- die vermessungstechnischen Unterlagen (Trassenentwurf) erstellt sind,
- der Rahmenbauablaufplan mit Leistungsverzeichnis erstellt ist,
- der Auftragnehmer (AN) feststeht.

Niederschrift zur T 1 und T 12 Anhang 02

(2) Für die Baudurchführungsbesprechung (T 1) und für die Feinabstimmung (T 12) ist das Arbeitsblatt anzuwenden.

Von den Begehungen und Besprechungen (Nr. 1 und 12 des Tätigkeitsblattes) sind Niederschriften zu erstellen und an die Beteiligten zu verteilen.

Bauablaufplan oder vereinfachter Bauablaufplan

(3) Mit der Bauablaufplanung für Arbeiten an Gleisen und Weichen sind alle Arbeitsgänge zeitlich und räumlich aufeinander abzustimmen und die erforderlichen Baukapazitäten festzulegen. Der Bauablaufplan ist Bestandteil der Anmeldung einer Baumaßnahme zur Unterjährigen Baubetriebsplanung (siehe Ril 406).

Der AN erstellt den Bauablaufplan auf der Grundlage des Rahmenbauablaufplanes. In dem Bauablaufplan sind die Ergebnisse der Planungen und die Vorbereitungsmaßnahmen aller an der Baumaßnahme Mitwirkenden darzustellen.

Der Bauablaufplan ist Grundlage für

- die Festlegung der erforderlichen Baukapazitäten,
- den Gleisbelegungsplan,
- den Betriebsablaufplan.

Unter Baukapazitäten im Sinne dieser Richtlinie sind zu verstehen:

a) Personal

b) Baumaschinen

c) Transportmittel

Inhalt eines Bauablaufplanes

(4) Grundlagen für das Aufstellen eines Bauablaufplanes sind u.a.:

- der Rahmenbauablaufplan (vgl. Ril 823.0100A10)
- das Erhebungs- und Arbeitsblatt mit Streckenband (vgl. Ril 823.0100A02)
- die Arbeitsbehelfe der Maschinenbetreiber
- die Planzeitwerte mit Arbeitsablaufbeschreibung
- die Niederschrift über die Baudurchführungsbesprechung nach dem Tätigkeitsblatt
- das Schweißband bzw. Schienenband
- vermessungstechnische Planunterlagen
- die Materialermittlung

Einzelheiten, die örtlichen Besonderheiten sowie die betrieblichen Auflagen sind darzustellen.

Angaben u.a.sind

für Gleise :

aus dem Erhebungs- und Arbeitsblatt:

- *bautechnische Besonderheiten, die sich aus der Auswertung des Erhebungs- und Arbeitsblattes mit Streckenband ergeben,*
- *Bezeichnung und Lage der Baustelle,*
- *vorhandene Oberbauform,*
- *einzubauende Oberbauform*
- *Umbauverfahren,*
- *Betriebsangaben,*
- *oberleitungstechnische Besonderheiten,*
- *Gleisabstände,*
- *Überhöhungen,*
- *Halbmesser,*
- *Gradientenänderungen,*
- *Richtungsänderungen,*
- *Ausführungszeitraum,*
- *Entsorgung von Schienen, Schwellen, Altschotter und Bettungsrückständen.*

Betriebsangaben sind z. B. Betriebsweise, Langsamfahrstellen, Sperrzeiten.

Oberleitungstechnische Besonderheiten sind z. B. unter Spannung stehende Oberleitungsbereiche mit Angabe der Fahrdrahthöhe.

u.a. sind

für Weichen :

aus dem Erhebungs- und Arbeitsblatt:

- *bautechnische Besonderheiten, die sich aus der Auswertung des Erhebungs- und Arbeitsblattes mit Streckenband ergeben,*
- *Bezeichnung und Lage der Weichen bzw. Kreuzungen,*
- *vorhandene Art und Form der Weichen bzw. Kreuzungen,*
- *einzubauende Art und Form der Weichen bzw. Kreuzungen,*
- *Montagestelle,*
- *Demontagestelle,*
- *Anschlusslängen,*
- *umzubauende Gleislänge im Zusammenhang mit dem Weichenumbau,*
- *Gleisabstände,*
- *Überhöhungen,*
- *Halbmesser,*
- *Gradientenänderungen,*
- *Richtungsänderungen,*
- *Betriebsangaben,*
- *Umbauverfahren,*
- *Ausführungszeitraum,*
- *oberleitungstechnische Besonderheiten,*
- *signaltechnische Besonderheiten,*
- *Entsorgung von Schienen, Schwellen, Altschotter und Bettungsrückständen.*

u.a. sind in den Bauablaufplänen

sowohl für Gleise wie für Weichen :

Bezeichnung und Reihung der Baumaschinen

Zeit-Wege-Linien der einzelnen oberbautechnischen Arbeitsgänge mit Angaben der Schicht- und Stundenleistungen

Pufferzeiten

Personalbereitstellung/Anzahl

Maschinenbereitstellung

Zeit-Wege-Fläche für Aktivitäten, welche die Elektrotechnik und die Leit- und Sicherungstechnik angemeldet haben.

u.a. sind

zu den Buchungsdaten:

- *Projekt - Nr.,*
- *AIB-Nr.,*
- *Bahnstellen - Nr.,*
- *Rahmenkosten – Stellen Nr.,*
- *PSP - Element, SAP R/3 Netz)*

Der Bauablaufplan wird nach Art und Arbeitsaufwand in drei Gruppen unterteilt:

- Bauablaufplan für Gleise **Anhang 03**
- Bauablaufplan für Weichen **Anhang 04**
- Vereinfachter Bauablaufplan (Variante 1 und 2, z. B. Schienenwechsel, einfacher Gleis- und Weichenumbau usw.) **Anhang 05**

Symbole sind nach Anhang 06, Abkürzungen nach Anhang 13, zu verwenden. **Anhang 06** **Anhang 13**

Der gewählte Maßstab soll nicht kleiner als 1 : 25 000 sein.

Das Zeitraster soll 1 cm je Stunde nicht unterschreiten.

Die in den Anhängen 3, 4 und 5 vorgegebenen Daten sind die Grundlage für den Soll-Ist-Vergleich.

Der AN stellt sicher, dass im Bauablaufplan

- die Angaben aus dem Erhebungs- und Arbeitsblatt,

- die Angaben aus dem Rahmenbauablaufplan,
- die Angaben aus dem Leistungsverzeichnis,
- die Regelwerke der DB AG,
- die Arbeitszeitbestimmungen,

angewendet werden.

Der Projektleiter prüft den Bauablaufplan und stimmt. durch Unterschrift der Ausführung zu.

Zusammenstellung der abzustellenden Maschinen und Wagen
Anhang 07

(5) Der erforderliche Gleisbedarf ist im einzelnen aus den Arbeitsbehelfen für die zum Einsatz kommenden Baumaschinen und Transportwagen zu ermitteln. Der AN stellt anhand der zuvor genannten Unterlagen den Gleisbedarf zusammen.

Die in Notfällen zur schnellen Störungsbeseitigung auf der Baustelle erforderlichen Baukapazitäten sind in unmittelbarer Nähe der Baustelle abzustellen.

Erfassung der Abstellmöglichkeiten für Maschinen und Wagen
Anhang 08

(6) Die im Einzugsbereich der Baustelle verfügbaren Abstell- und Überholungsgleise müssen von der zuständigen NL Netz im Benehmen mit

- der Baustellenlogistik
- den entsprechenden Anlagennutzern
- der Örtlichen Betriebsdurchführung bzw. Betriebszentrale

bis zur Vorbesprechung nach zusammengestellt werden.

Dabei ist zu beachten:

- es sind ausreichend Gleise für Rangierbewegungen und Zugbildung freizuhalten.
- bei fehlenden Abstellmöglichkeiten müssen durch andere Maßnahmen die Voraussetzungen für ungehinderte Baudurchführung geschaffen werden.

Möglichkeiten den Bedarf an Betriebsgleisen zu reduzieren sind gegeben durch

- *Verlegen von Behelfsgleisen,*
- *beschleunigten Materialtransportumlauf.*

(7) Der Gleisbelegungsplan soll für alle Oberbaumaßnahmen aufgestellt werden, bei denen Oberbau-Großmaschinen zum Einsatz kommen.

Gleisbelegungsplan Anhang 09

Bei den anderen Bauverfahren entscheidet die NL Netz, ob ein Gleisbelegungsplan aufgestellt werden muss. Die NL Netz legt in Abstimmung mit den zuständigen Anlagennutzern und dem AN auf der Grundlage der Anhänge 07 und 08 die Belegung der Gleise fest und stellt dies nach Anhang 09 bildlich dar.

Bei einem weiträumigen Bedarf an Abstellmöglichkeiten soll dem Gleisbelegungsplan ein Streckenübersichtsplan sowie Bahnhofspläne der Abstellbahnhöfe beigefügt werden.

Steuerung der Materialtransporte sind z. B.:

- *Neuschienen vor Umbaubeginn entladen,*
- *Schotter, Schwellen direkt der Baustelle zuführen.*

(8) Der Betriebsablaufplan wird in bildlicher Form aufgestellt. Im Betriebsablaufplan sind alle Fahrten in Reihung und zeitlicher Folge so festzulegen, dass der Bauablauf eingehalten, eine wirtschaftliche Bauausführung sowie eine sichere und pünktliche Betriebsabwicklung gewährleistet werden können.

Betriebablaufplan Anhang10

Die für die Örtliche Betriebsdurchführung bzw. für den Bahnbetrieb zuständige Stelle des Regionalnetzes erstellt unter Beteiligung des AN den Betriebsablaufplan. Der Baubetriebskoordinator (BBK) erteilt die Freigabe.

Grundlagen für das Aufstellen des Betriebsablaufplanes sind

- *der Bauablaufplan,*
- *der Gleisbelegungsplan für das Abstellen der Fahrzeuge,*
- *die bildliche Übersicht,*
- *der Fahrplan für Zugmeldestellen,*
- *der Rangierplan bzw. Rangierarbeitsplan*

Wegen der besseren Übersichtlichkeit soll im Betriebsablaufplan der zeitliche Ablauf maßstäblich dargestellt werden.

Die bildliche Form ermöglicht dem Anwender einen besseren Überblick. Sie ist besonders dann zu empfehlen, wenn die Baustellenversorgung umfangreich und kompliziert ist, z. B. bei

- *gleichzeitigem Einsatz verschiedener Bauverfahren sowie mehrerer Maschinen und Fahrzeuge,*
- *mehrfacher Ausnutzung der Gleissperrung für verschiedene Baumaßnahmen.*

In dem Betriebsablaufplan muss angegeben werden:

- *Tag und Uhrzeit*
- *Ausgangs- und Zielgleis*
- *ausführende Rangier- oder Arbeitszug - Lok*
- *Kurzbezeichnungen der zu befördernden Fahrzeuge (vgl. Abschn. 11.7)*
- *Zugnummer bei Zugfahrten*
- *Besonderheiten der Fahrt.*

Besonderheiten der Fahrt sind z. B.:

- *geschobene Fahrt,*
- *Sperrfahrt,*
- *Befahren von Streckengleisen gegen die gewöhnliche Fahrtrichtung.*

Die in dem Anhang 10 vorgegebenen Daten bilden die Grundlage für den Soll – Ist - Vergleich.

Den Ist - Ablauf dokumentiert der Bauüberwacher Bahn.

Im Betriebsablaufplan müssen alle Fahrzeuge mit eigenem Antrieb und Wagen mit den Kurzbezeichnungen (vgl. Anhang 13 – Verzeichnis der Abkürzungen –) bezeichnet werden. Die gleichen Kurzbezeichnungen müssen in den Unterlagen für die Baudurchführung angewendet und an den Fahrzeugen angeschrieben bzw. angebracht werden.

Die für die Versorgung und Bedienung der Baustelle notwendigen Fahrten müssen mit den anderen Zug- und Rangierfahrten abgestimmt sein (vgl. Ril 406).

Fahrten in und durch Betriebsgleise müssen auf das unumgängliche Maß beschränkt werden.

Sperrungen von Betriebsgleisen müssen entsprechend den Terminen der Ril 406 beantragt und in der durch die baubetriebliche Zugregelung zu erarbeitenden bildlichen Übersicht berücksichtigt werden.

(9) Ein Personaleinsatzplan wird vom AN aufgestellt.

Personal-einsatzplan
Anhang 11

Der Personaleinsatzplan über die verantwortlichen Ansprechpartner auf der Baustelle wird von der Bauüberwachung aufgestellt . Für die Baudurchführung hat der AN befähigtes und ausreichendes Personal vorzuhalten. Die Baumaschinen sind gemäß den Ausschreibungsunterlagen bereitzustellen. Die zur Bauausführung benötigten Güterwagen sind vom AN zu ermitteln und bereitzustellen.

Die Umbauverfahren und die entsprechenden Materialtransportwagen sind vom AN zu steuern;

Langschienentransporteinheiten und andere Wagen sind vom AN bereitzustellen.

Die erforderlichen Triebfahrzeuge werden anhand des Bauablaufplanes bzw. Betriebsablaufplanes ermittelt und von dem beauftragten Logistik - EVU beigestellt. Die Fahrten sind rechtzeitig bei I.NMV (Vertrieb) zu beantragen.

Die Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb ist nach der Ril 132.0118 sowie der geltenden GUV zu gewährleisten.

(10) Vor Baubeginn muss der Bauüberwacher Bahn die Checkliste als Voraussetzung zum Beginn von Baumaßnahmen unter Betriebsbedingungen unter Mitwirkung des Baubetriebskoordinators aufstellen.

Checkliste
Anhang 12

3 Abwicklung von Begleitarbeiten

(1) Die vorbereitenden Begleitarbeiten (Leit- u. Sicherungstechnik – LST -, Elektrotechnik – E-Technik-, usw.) am umzubauenden Gleis müssen so rechtzeitig abgeschlossen sein, dass die Oberbauarbeiten planmäßig begonnen werden können.

Begleitarbeiten

(2) Alle im Bereich der Baustelle vorhandenen Kabel (LST, E-Technik, usw.) müssen gekennzeichnet und ggf. so gesichert werden, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Wenn erforderlich, muss die Kabellage geändert werden.

Kennzeichnen der Kabellage

Vor Beginn der Bauarbeiten muß der Bauüberwacher Bahn das Kabelmerkblatt gegen Empfangsbescheinigung dem Bauleiter des AN übergeben .

4 Bauleitzentrale

Zweck

(1) Eine Bauleitzentrale (BLZ) koordiniert Baukapazitäten, Baustellenlogistik und die Steuerung des Baubetriebes zur Erhaltung der Betriebsqualität.

Anwendungsbereich

(2) Der Baubetriebskoordinator entscheidet über das Erfordernis einer BLZ.

5 Besondere Maßnahmen

Durch den Projektleiter ist sicherzustellen dass

Beteiligung Dritter

- wenn durch Arbeiten am Oberbau auch Interessen Dritter berührt werden, z. B. Gas- u. Wasserversorgungsunternehmen, diese beteiligt wurden,

Beanspruchung von Grundstücken Dritter

- wenn bei Oberbaumaßnahmen Grundstücke Dritter vorübergehend in Anspruch genommen werden, vor Baubeginn die Zustimmung des Eigentümers eingeholt ist,

Sperrung von Bahnübergängen

- wenn Sperrungen von Bahnübergängen erforderlich sind, die Zustimmung zur Sperrung bei der zuständigen Behörde eingeholt ist,

Behördliche Genehmigung

- wenn bei Nachtarbeit, Wochenendarbeit, Einschränkungen im Straßenverkehr, Lärmbelästigungen im Rahmen des Immissionsschutzgesetzes bei Oberbaumaßnahmen auftreten, die Genehmigungen bei den zuständigen Behörden (je nach der Ländergesetzgebung) eingeholt wurden,

Unterrichtung der Öffentlichkeit

- wenn bei Oberbauarbeiten durch Sperrungen von Bahnübergängen, Einschränkungen im Straßenverkehr erforderlich werden oder wenn Belästigungen durch Lärm oder Staub auftreten, gemäß Ril 809.0301 der BauÜberwacherBahn/FachBauÜberwacher (BÜB/FBÜ) dies durch Veröffentlichung, z. B. Presse, Handzettel usw., bekanntgegeben wurde und dass.

Durchführung der Einsatzbesprechung

- bis spätestens 3 Tage vor Baubeginn die Einsatzbesprechung durchgeführt (vgl. Lfd. Nr. 22 des Anhang 01) und mit den Beteiligten alle Einzelheiten – wenn erforderlich vor Ort – erörtert wurden.

❑

Tätigkeitsblatt
für die Vorbereitung von Oberbau - Baumaßnahmen

Baustellen - Nr.:

Ausführungszeitraum:

Anm.: Terminplanung mit Prozesshandbuch "Fahren und Bauen" abstimmen.

1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Nr.:	**Tätigkeit**	**zuständige**	**zu erledigen**		**bis Wochen vor Baubeginn**	**Erledigungs-vermerk** Datum Unterschrift
			von	bis		
		AN	Datum			
1	**Baudurchführungs-besprechung mit allen Beteiligten**	**Anlagen- u. Instandhal-tungsmanager F u. B u. Regi-onalnetz, regi-onale Baube-triebsplanung u. Instandset-zungsmanager**			**12**	
2	**Planung der Beteiligten abschließen**	**Instandhal-tungs- u. In-standset-zungsmanager**			**12**	
3	**Signaltechn. Ausführungs-pläne genehmigen (EBA)**	**Instandhal-tungs- u. In-standset-zungsmanager**			**12**	
4	**Gleisbedarf ermitteln**	**Instandhal-tungs- u. In-standset-zungsmanager**			**12**	
5	**Bauablaufplan aufstellen**	**AN**			**10**	

6	Zusätzliche Betriebsregelungen festlegen	Regionale Baubetriebs-planung, In-standset-zungsmanager			10	
7	Betriebliche u. organisatorische Maßnahmen zusammenstellen	Regionale Baubetriebs-planung, In-standset-zungsmanager			10	
8	Gleisbelegungsplan aufstellen	Instandhal-tungs- u. In-standset-zungsmanager			10	
9	Betriebsablaufplan aufstellen	Regionale Baubetriebs-planung, In-standset-zungsmanager			9	
10	Sicherungspläne aufstellen	Regionale Baubetriebs-planung, In-standset-zungsmanager			8	
11	Behördliche Genehmigungen einholen (Gewerbe-aufsichtsamt u. a.) SiGeKo genehmigen lassen	Instandhal-tungs- u. In-standset-zungsmanager AN			7	
12	Feinabstimmung mit allen am Umbau Beteiligten, Bauablaufplan ggf. korrigieren Übergang der Bauüberwacher-funktion auf I.NDI-x-L	Instandhal-tungs- u. In-standset-zungsmanager AN			7	
13	Betra-Antrag erarbeiten	Betra-Antragsteller			6	
14	Bauablaufplan zustimmen und verteilen	Instandset-zungsmanager			5	
15	Einsatz d. DB AG-Personale regeln, Zustimmung d. Betriebsrates	Instandset-zungsmanager			4	

16	Zu – u .Abfuhr von Material u. Maschinen disponieren u. einlegen	Instandset-zungsmanager / Maschienen-pool AN			3	
17	Fahrdienstliche Unterlagen ändern bzw. neu aufstellen	Regionale Baubetriebs-planung, In-standset-zungsmanager			3	
18	Tfz f. Az u. zusätzliche Rangierfahrten anfordern	Instandset-zungsmanager			2	
19	Betra u. Betriebsablaufplan verteilen	Regionale Baubetriebs-planung, In-standset-zungsmanager			5 Tage	
20	Öffentlichkeit unterrichten	Instandset-zungsmanager			1	
21	Signal- Telekom m u. E- Anlagen ändern	AN			1	
22	Gesamt-einsatzbesprechung mit allen Beteiligten durchführen	Instandset-zungsmanager			3Tage	
23	Personale d. DB AG u. d. AN örtlich einweisen	Instandset-zungsmanager			1 Tag	
24	Personale d. Betriebsdienstes einweisen u. prüfen	Instandset-zungsmanager, Regionale Baubetriebs-planung			1 Tag	
25	Veränderte Signalanlagen prüfen und abnehmen	Instandset-zungs- u. In-standhal-tungsmanager			1 Tag	
26	Checkliste -Voraussetzungen zum Beginn von Baumaßnahmen unter Betriebsbedingungen-abprüfen	Instandset-zungsmanager			Baubeginn	

27	Personale d. DBAG u. d. AN in die Unfallverhütung einweisen	Instandset-zungsmanager			Baubeginn	

Baubeginn:

Datum:	
Uhrzeit:	
Aufgestellt:	

❑

1 Niederschrift zur Erstbegehung

Arbeitsblatt für Oberbau-Baustellen			
"Niederschrift zur T 1 und Fortschreibung T 12"			
		Text	
		T 1	T 12
1	**Allgemeines**		
	zu beteiligende Stellen:		
	Planendes Büro		
	Baubetriebskoordinator		
	Bezirksleiter Betrieb		
	Anlagenverantwortlicher (Alv)		
	Bezirksleiter LST		
	Bezirksleiter E/M		
	andere Geschäftsbereiche (NL)		
1.1	**Umbauabschnitt**		
	Gleis von Bf bis Bf, von km bis km		
	Weiche in km / Anschluss-länge und einzubauende Oberbau-form		
1.2	**Umbaulänge in [m]**		
1.3	**Umbautermin mit Sperrzeit**		
1.3.1	ggf. erforderliche Stopfarbeiten nach Umbau		
1.4	**Umbauverfahren**		
1.5	**Untergrund**		

1.5.1	**Entwässerungsverhältnisse**		
1.6	**Analyse Schotter/Untergrund**		
1.6.1	**Kampfmittelfreiheit**		
1.7	**Vermessungstechnische Angaben**		
1.8	**Gleisabstände**		
1.9	**Geschwindigkeit nach VzG**		
1.10	**Ausführende**		
	AN		
	Nachunternehmer		
	Nebenunternehmer		
	Bauleiter Oberbau		
	Bauleiter Bau		
	Bauüberwacher (Bahn)		
	Fahrbahn		
	Leit- und Sicherungstechnik		
	Elektrotechnik		
	Sicherungsüberwachung		
	Signalbauarbeiten / AN		
	Oberleitungsarbeiten / AN		
	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator		
1.11	**Arbeitsschutz und Sicherheit nach GUV**		
2	**Oberbautechnische Maßnahmen**		
2.1	**Entwurf des Bauablaufplanes mit allen betrieblichen und baulichen Daten durch den AN erläutern**		
2.1.1	Bauablaufplan-Entwurf über-prüfen auf Beachtung der Angaben aus:		
	Erhebungs- und Arbeitsblatt mit Streckenband		
	Vorgaben des AG (Rahmenplan)		
	Vorbemerkungen der		

	Leistungsbeschreibung		
2.2	**Auf- und Abrüsten der Baueinheit und der Material-transportwagen in einem Gleis mit frei geschalteter Oberleitung:**		
	im Bahnhof		
	im gesperrten Gleis / Baugleis		
2.3	**Tfz-Bedarf und sonstige Maschinen ermitteln, soweit nicht durch Bauablaufplan-Entwurf vorgeschlagen, Bereitstellung von Gleiskraftwagen regeln**		
	Logistik		
	Tarifpunkt		
2.4	**Steuerung des Baugeschehens durch Bauleitzentrale**		
	Standort		
2.5	**Bahnübergangsprovisorien festlegen**		
	Art		
	Ausführende		
2.6	**Aus- und Einbau der Überwegbefestigung festlegen**		
	Art und Umfang		
	Ausführende		
2.7	**Oberbaumaterialien wie z. B.**		
	Schienen		
	Schwellen		
	Kleineisen		
	Weichenteile		
	Schotter		
2.8	**Verladung der Bettungsrückstände**		
	Arbeitszug, LkW, MFS 40 usw.		
2.9	**Wiederverwendung/Entsorgung**		
	Schienen		
	Schwellen		
	Altschotter		
	Aushub		
	Sonstiges		
2.10	**Entladung der Oberbaumaterialien**		

2.11	**Wagenbedarf Entsorgung**		
2.12	**Maßnahmen für Beseitigung der Arbeitsraumein-schränkungen wie Festpunkte, Fundamente usw. festlegen**		
2.13	**Vermessungstechnische Maßnahmen**		
	Sichern der Vermarkungspunkte		
	Trassierung		
	Fahrdynamische Prüfung		
2.14	**Betrachtung der Gleisabschnitte, in denen das gewählte Umbauverfahren nicht angewendet werden kann (Schienenband entsprechend aufstellen)**		
	Brücken		
	Bahnsteige		
	Einschnitte zwischen Stützmauern		
	nicht ausreichender Gleisabstand usw.		
2.15	**Behandlung der Randwege**		
2.16	**Aus- und Einbau von**		
	Führungsschienen		
	Leitschienen		
	Brückenabdeckungen		
2.17	**Lage der Isolierstöße festlegen**		
	Km (Schienenstrang)		
	Anzahl		
	örtl. herzustellende Iso		
2.18	**Ausbohlen an Bauwerken**		
	Brücken		
	Stützmauergeländer usw.		
2.19	**Montage-/ Demontageplätze**		
2.20	**Zwischenlagerplätze / Bereitstellungslager für Bettung und Ähnliches**		

2.21	**Beleuchtung**		
2.22	**Maßnahmen zur Einhaltung der Immissionsschutz-bestimmungen**		
2.23	**Behördliche Genehmigungen**		
	Sonn- Nacht- Wochenendarbeit		
2.24	**Bautechnische Besonderheiten**		
2.25	**Bettungsarbeiten**		
2.26	**Oberbautechnische Planung festlegen**		
	RZ, §18.3		
	Unternehmensinterne Genehmigung (UIG / ZiE)		
	Bauartänderung		
2.27	**Erfassung von Kreuzungen Dritter**		
3	**Signaltechnische Maßnahmen**		
3.1	**Änderungen an den Signalanlagen festlegen**		
3.2	**Änderung der Flankenschutzeinrichtung vereinbaren**		
	Gleisfreimeldeposten		
3.3	**Kennzeichnung der Kabeltrassen (auf Kabelmerkblatt hinweisen)**		
3.4	**Aufstellfläche und Stromversorgung für Hilfsbetriebs stelle sowie Lage der Hilfskabel festlegen**		

3.5	**Überprüfen der erfassten hinderlichen Signaleinrichtungen auf Vollständigkeit und deren kurzfristige Beseitigung festlegen, wie z. B.**		
	Drahtzugleitungen		
	Signale, Antriebe		
	Zugeinwirkungen, Linienleiterkabel, Achszähler		
	Balisen		
3.6	**Standorte der zu versetzenden und neu aufzustellenden Signale überprüfen (Signalsicht)**		
3.7	**Sicherung der Langsamfahrstelle**		
	Indusi		
	Geschwindigkeitsprüfeinrichtung (GPE)		
3.8	**Isolierstöße (Behelfsstöße) festlegen**		
3.9	**Zeit und Dauer der Umschaltung festlegen**		
3.10	**Signaltechnische Besonderheiten**		
3.11	**TK-Einrichtungen**		
	Fernsprecher		
	Heißläuferortungsanlage		
	Kabellage und -querungen		
	Funkausbreitungsmessungen		
3.12	**Signaltechnische Planung festlegen**		
	RZ-Planung		
	Planung der Langsamfahrstellen		
	LST-Planung		
	Gleissperren		
4	**Oberleitungstechnische Maßnahmen**		
4.1	**Änderung an der Oberleitung festlegen**		

4.2	**Ausschalten und Erden der Oberleitung vereinbaren**		
	Schaltantragsteller		
	Erder		
4.2.1	Umbaugleise		
4.2.2	Betriebsgleise		
4.3	**Rückstromführung und Bahnerdung festlegen**		
	Rückstromführung		
	Mast- und Bauwerkserden		
	Erdungsseil		
4.4	**Gleisabschnitte, die unter Spannung stehen**		
4.4.1	Schaltgrenzen festlegen		
4.5	**Angabe der geringsten Höhe der Oberleitung über SO**		
4.6	**Kennzeichnen der Kabeltrassen (auf Kabelmerkblatt hinweisen)**		
4.7	**Zeit und Dauer für vorübergehende Oberleitungsänderungen**		
4.8	**Oberleitungstechnische Besonderheiten**		
4.9	**Schienengebundene und nichtschienengebundende Baufahrzeuge, welche den Sicherheitsabstand bei Arbeiten unter eingeschalteter Oberleitung unterschreiten, müssen mit wirksamer Hub/Schwenkbegrenzung arbeiten und schutzgeerdet sein.**		
4.10	**Elektrotechnische Anlagen für Licht- und Kraftstrom**		
	Beleuchtung		
	Weichenheizung		
4.11	**Oberleitungstechnische Planung festlegen**		
	RZ-Planung		


5	**Betriebliche Maßnahmen**		
5.1	**Umschaltung der Signalanlagen, Sperrzeit**		
5.2	**Sperrzeiten für vorübergehende Oberleitungsmaßnahmen**		
5.3	**Betriebsablaufplan erstellen (Ein-/Ausfahren der Maschinen, Arbeitszüge in das Arbeitsgleis usw.)**		
5.4	**Zusätzliche Sperrzeiten im Betriebsgleis für arbeitsbedingte Abläufe festlegen**		
5.5	**Geschwindigkeitsbeschränkungen festlegen**		
5.6	**Gleisbedarf für das Abstellen der Bautrupps, Baumaschinen und Materialwagen ermitteln, soweit nicht durch Bauablaufplan festgelegt**		
5.7	**Betra-Angaben über Lü-Sendungen bekanntgeben und erläutern**		
5.8	**Einsatz von zusätzlichem Betriebspersonal**		
	FdL		
	Gleisfreimeldeposten		
	Rückmeldeposten/Zugschlussmeldeposten		
	Befehlsübermittler		(Anm.: Mit KoRil 408 abklären)
	Bahnübergangsposten		
5.9	**Einleiten von Maßnahmen zum Schutz der Reisenden**		
5.10	**Maßnahmen für betriebliche Abweichungen wie erforderliche Umleitungen**		


	Schienenersatzverkehr		
	geänderte Zugbildung		
5.11	**Betriebliche Besonderheiten**		
6	**Station & Service**		
6.1	**Behelfsbahnsteige**		
6.2	**Reisendeninformation**		
6.3	**Besonderheiten**		

❑

Hinweis:


Die beiden nachfolgenden Seiten 2 und 3 stellen immer durch ein Aneinanderfügen den Gesamt-Bauablaufplan Gleise dar !

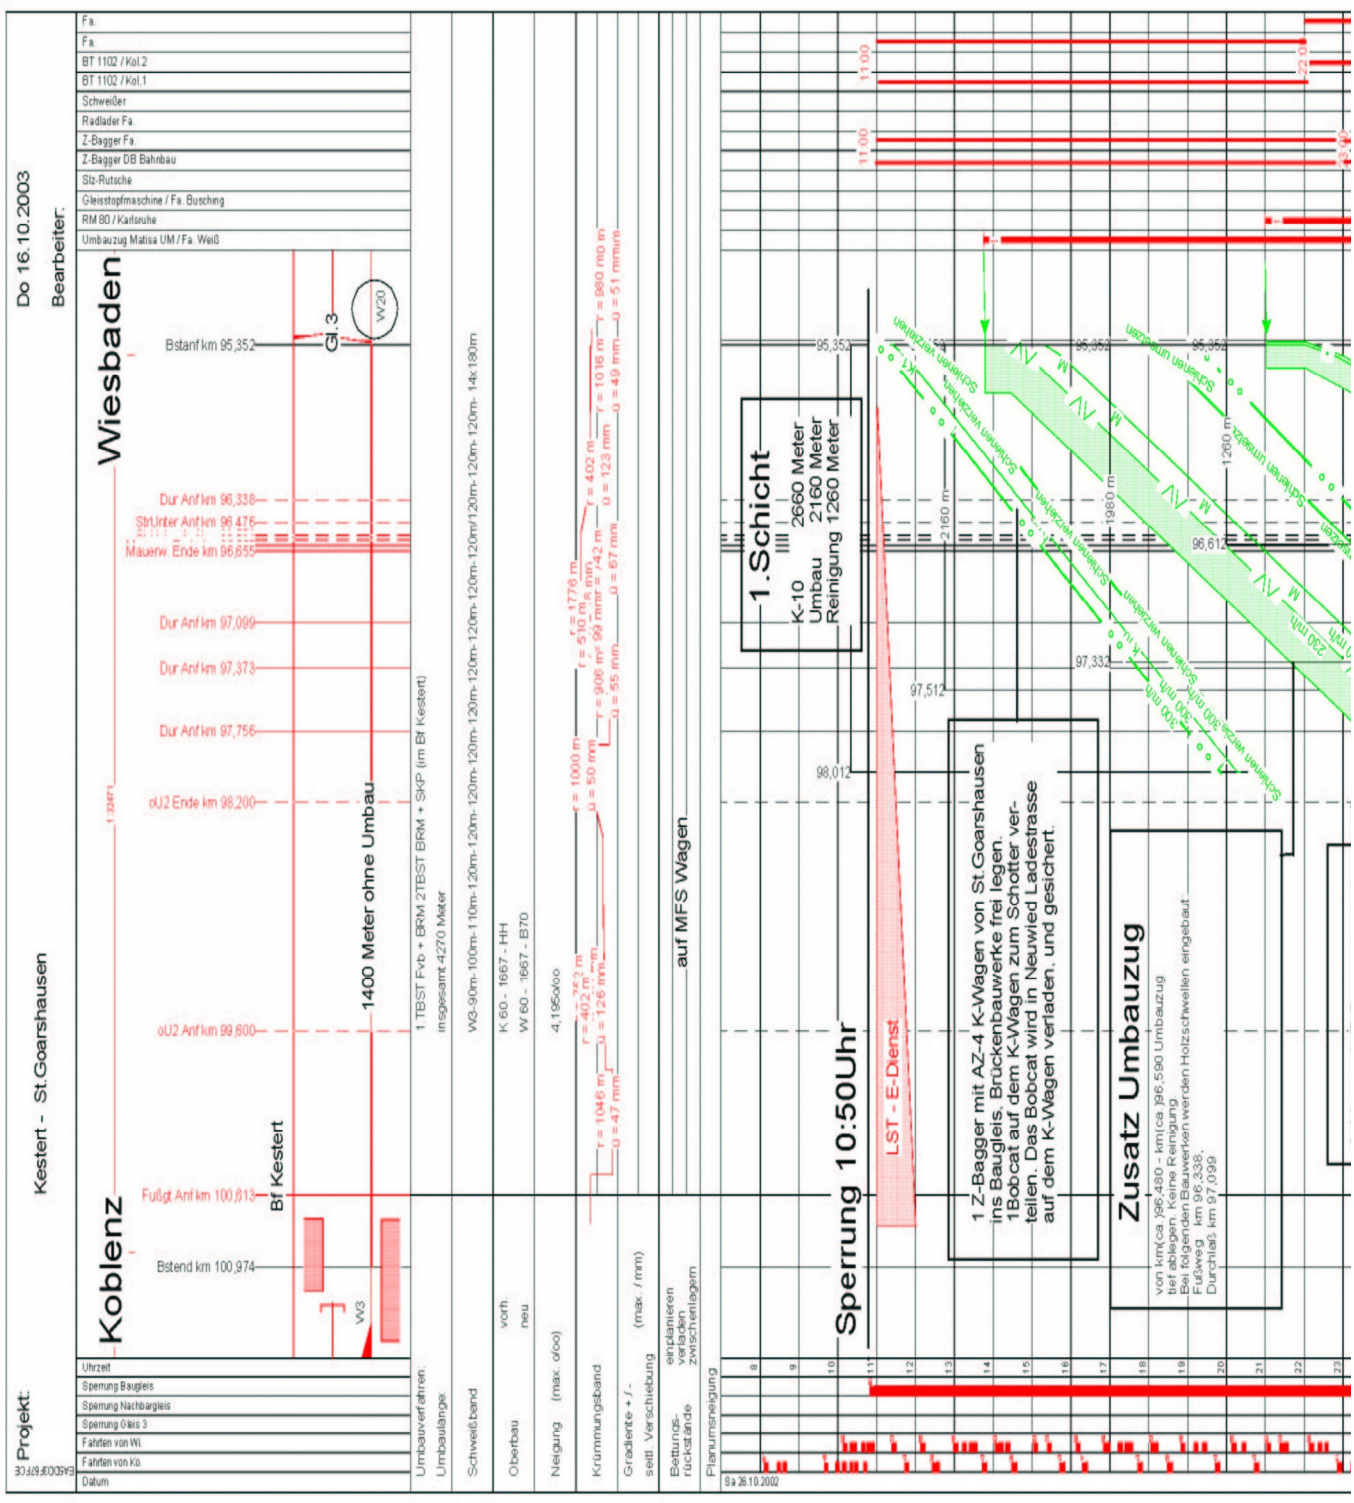

Projekt:
Kestert - St.Goarshausen
Bearbeiter:
Do 16.10.2003
Wiesbaden
Koblenz
Bf Kestert
Bstanf km 95,352
Gl.3
W20
Dur Anf km 96,338
StrUnter Anf km 96,476
Mauerw. Ende km 96,655
Dur Anf km 97,099
Dur Anf km 97,373
Dur Anf km 97,756
oU2 Ende km 98,200
oU2 Anf km 99,600
Fußgt Anf km 100,813
Bstend km 100,974
W3
1400 Meter ohne Umbau
1.Schicht
K-10
Umbau
Reinigung
2660 Meter
2160 Meter
1260 Meter
Sperrung 10:50Uhr
LST - E-Dienst
1 Z-Bagger mit AZ-4 K-Wagen von St.Goarshausen ins Baugleis. Brückenbauwerke frei legen. 1Bobcat auf dem K-Wagen zum Schotter verteilen. Das Bobcat wird in Neuwied Ladestrasse auf dem K-Wagen verladen. und gesichert.
Zusatz Umbauzug
auf MFS Wagen
Fa.
BT 1102 / Kol.2
BT 1102 / Kol.1
Schweißer
Radlader Fa.
Z-Bagger Fa.
Z-Bagger DB Bahnbau
Stz-Rutsche
Gleisstopfmaschine / Fa. Busching
RM 80 / Karlsruhe
Umbauzug Matisa UM / Fa. Weiß
Uhrzeit
Sperrung Baugleis
Sperrung Nachbargleis
Sperrung Gleis 3
Fahrten von Wi.
Fahrten von Ko.
Datum
Umbauverfahren
Umbaulänge
Schweißband
Oberbau
Neigung
Krümmungsband
Gradiente + / -
seitl. Verschiebung
Bettungs-rückstände
Planumsneigung
1 TBST Fvb + BRM 2TBST BRM + SKP (im Bf Kestert)
insgesamt 4270 Meter
W3-90m-100m-110m-120m-120m-120m-120m-120m-120m/120m-120m-120m- 14x180m
K 60 - 1667 - HH
W 60 - 1667 - B70
4,195o/oo
einplanieren
verladen
zwischenlagern
Sa 26.10.2002

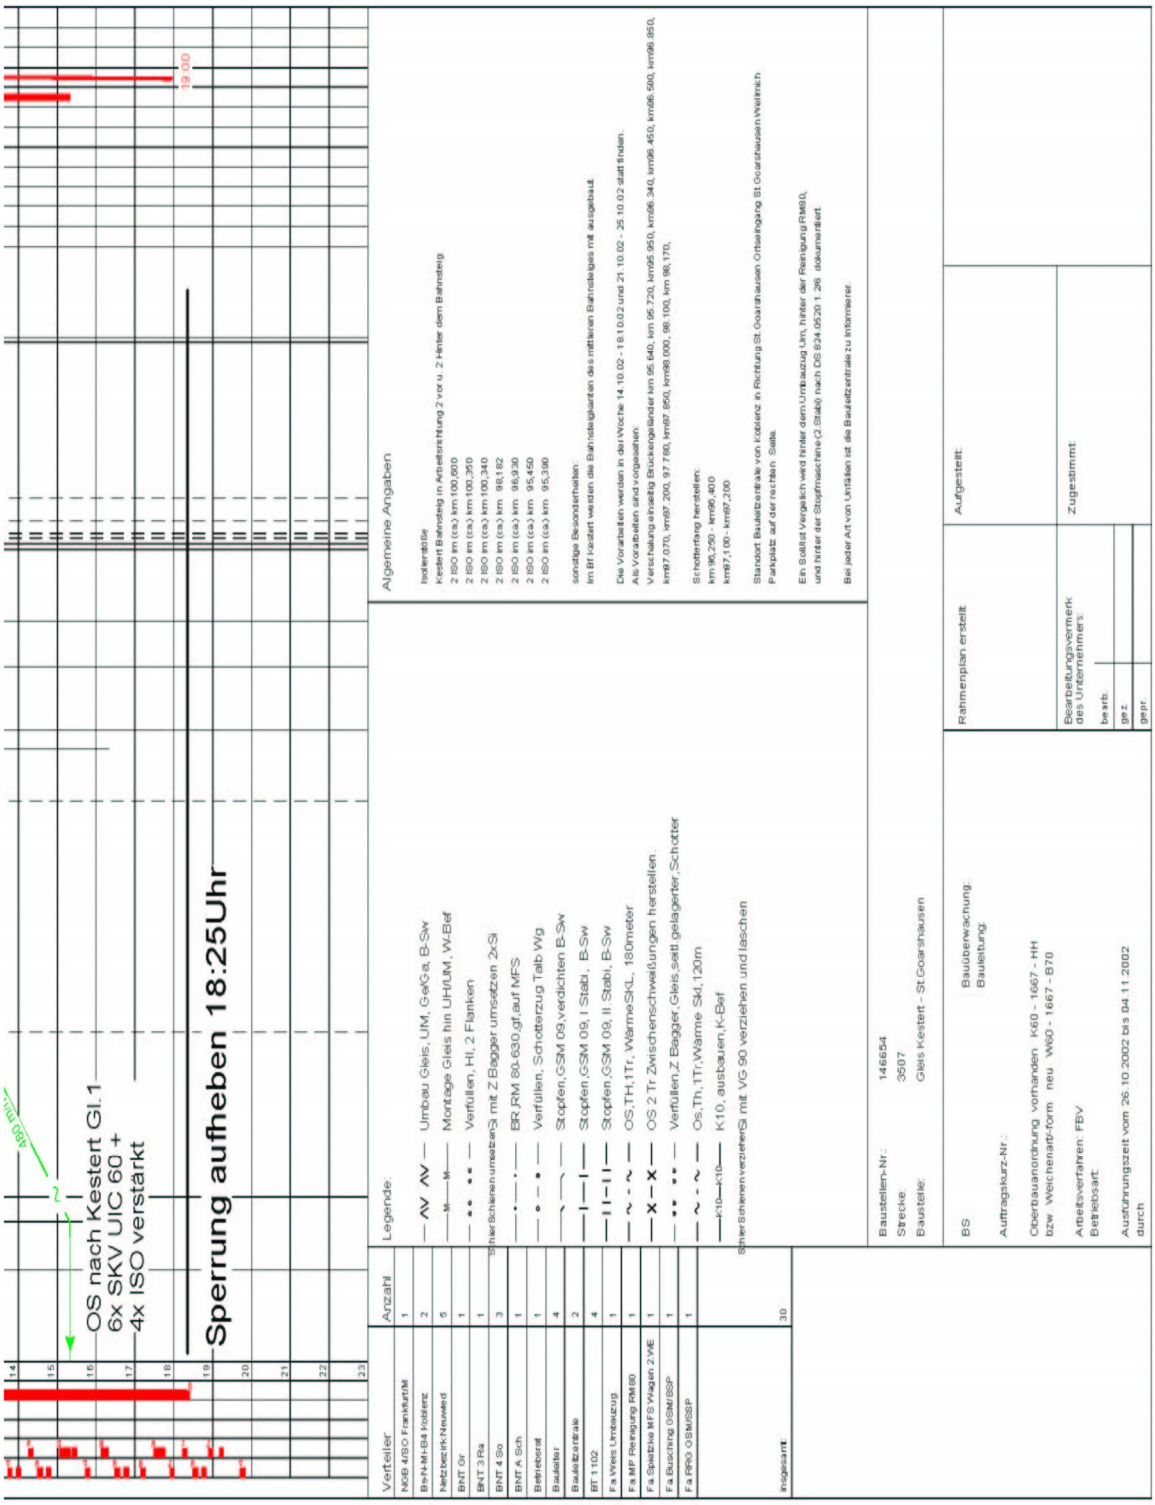
Sperrung aufheben 18:25Uhr
OS nach Kestert Gl.1
6x SKV UIC 60 +
4x ISO verstärkt
19:00
Algemeine Angaben
Legende:
Verteiler
Anzahl
Umbau Gleis, UM, GeKa, B-Sw
Montage Gleis hin UHÜM, W-Bef
Verfüllen, HI, 2 Flanken
Stopfen,GSM 09,verdichten B-Sw
Stopfen,GSM 09, I Stabi, B-Sw
Stopfen,GSM 09, II Stabi, B-Sw
OS,TH,1Tr, WärmeSkL, 130meter
OS 2 Tr Zwischenschweißungen herstellen.
Verfüllen,Z Bagger,Gleis,setl gelagerter Schotter
K10, ausbauen,K-Bef
Baustellen-Nr.: 146654
Strecke: 3507
Baustelle: Gleis Kestert - St.Goarshausen
Rahmenplan erstellt:
Aufgestellt:
Zugestimmt:

Hinweis:

Die beiden nachfolgenden Seiten 2 und 3 stellen immer durch ein Aneinanderfügen den Gesamt-Bauablaufplan Weichen dar !

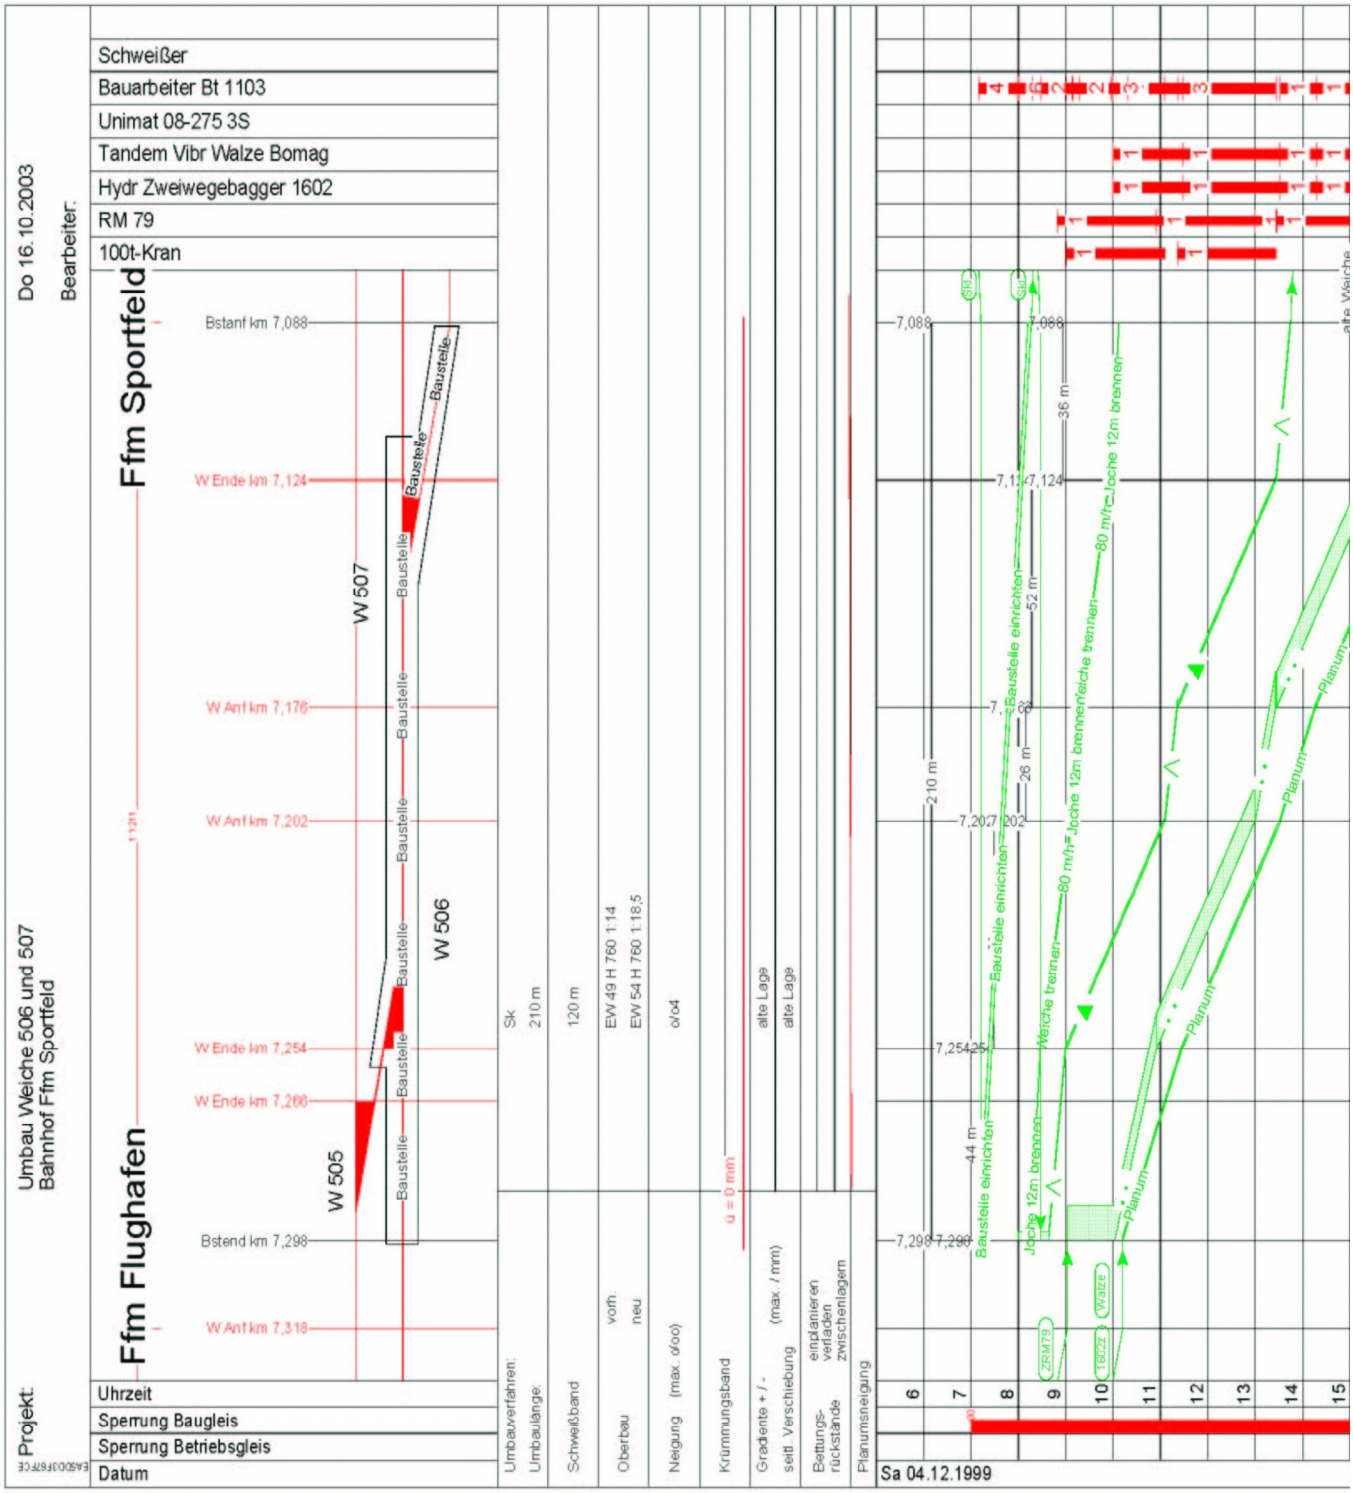
Do 16.10.2003
Bearbeiter:
Projekt:
Umbau Weiche 506 und 507
Bahnhof Ffm Sportfeld
Ffm Sportfeld
Ffm Flughafen
Bstanf km 7,088
W Ende km 7,124
W Anf km 7,176
W Anf km 7,202
W Ende km 7,254
W Ende km 7,266
Bstend km 7,298
W Anf km 7,318
W 505
W 506
W 507
Baustelle
Schweißer
Bauarbeiter Bt 1103
Unimat 08-275 3S
Tandem Vibr Walze Bomag
Hydr Zweiwegebagger 1602
RM 79
100t-Kran
Uhrzeit
Sperrung Baugleis
Sperrung Betriebsgleis
Datum
Umbauverfahren:
Umbaulänge:
Schweißband
Oberbau
vorh.
neu
Neigung (max. o/oo)
Krümmungsband
Gradiente + / - (max. / mm)
seitl. Verschiebung
Bettungs-rückstände
einplanieren verladen zwischenlagern
Planumsneigung
Sk
210 m
120 m
EW 49 H 760 1:14
EW 54 H 760 1:18,5
o/o4
alte Lage
alte Lage
Sa 04.12.1999
7,088
7,124
7,202
7,254
7,298
210 m
36 m
52 m
26 m
44 m
Baustelle einrichten
Weiche trennen
Joche 12m brennen
80 m/h
Planum
ZRM79
T822
Walze

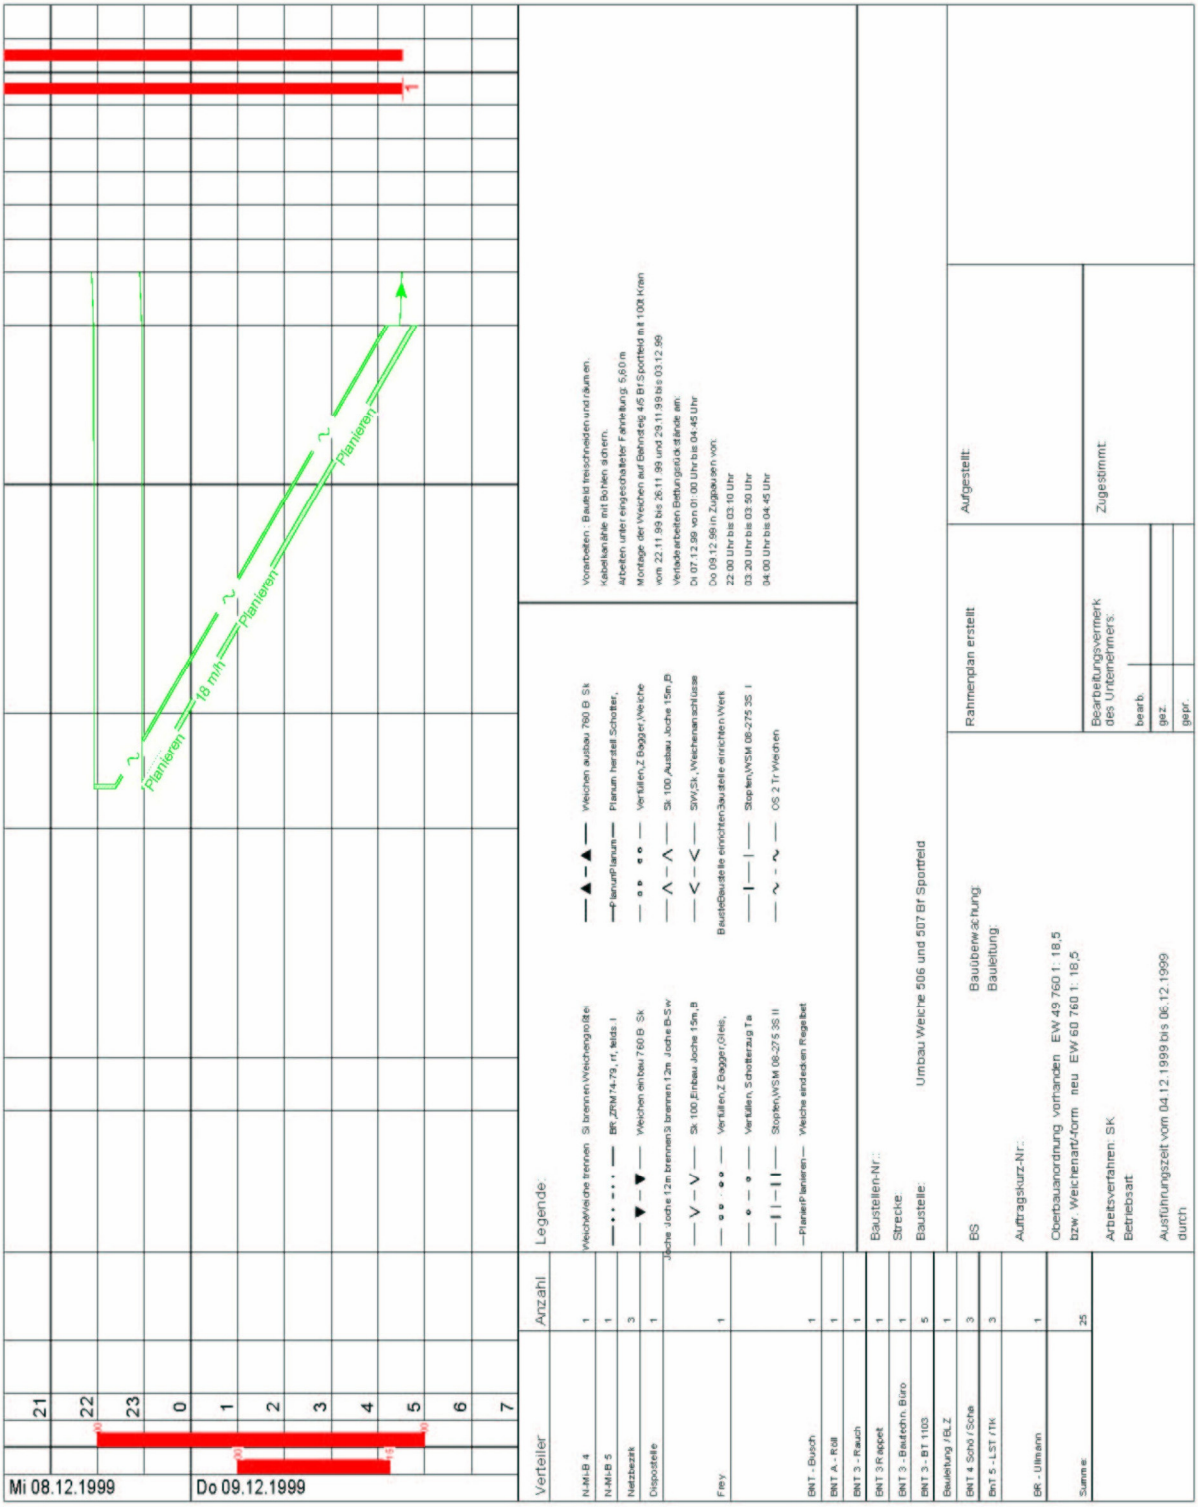
Mi 08.12.1999
Do 09.12.1999
21
22
23
0
1
2
3
4
5
6
7
Planieren
18 m/h
Planieren
Planieren
Legende:
Verteiler
Anzahl
Vorarbeiten: Bauteil freischneiden und räumen.
Kabelkanäle mit Bohlen sichern.
Arbeiten unter eingeschalteter Fahrleitung: 5,60 m
Montage der Weichen auf Bahnsteig 4/5 Bf Sportfeld mit 1008 Kran
von 22.11.99 bis 26.11.99 und 29.11.99 bis 03.12.99
Verladearbeiten Betlungsgleis stände an:
Di 07.12.99 von 01:00 Uhr bis 04:45 Uhr
Do 09.12.99 in Zugpausen von:
22:00 Uhr bis 03:10 Uhr
03:20 Uhr bis 03:50 Uhr
04:00 Uhr bis 04:45 Uhr
Baustellen-Nr.:
Strecke:
Baustelle: Umbau Weiche 506 und 507 Bf Sportfeld
BS
Bauüberwachung:
Bauleitung:
Auftragskurz-Nr.:
Oberbauanordnung vorhanden EW 49 760 1: 18,5
bzw. Weichenart/-form neu EW 60 760 1: 18,5
Arbeitsverfahren: SK
Betriebsart
Ausführungszeit vom 04.12.1999 bis 06.12.1999
durch
Rahmenplan erstellt
Aufgestellt:
Bearbeitungsvermerk des Unternehmers:
bearb.
gez.
gepr.
Zugestimmt:

Vereinfachter Bauablaufpan(Variante 1)

Montage	Demontage	Lageskizze	Oberleitung nicht/ ausgeschaltet u. geerdet Fahrdrahthöhe . . . m
Zeit durch Ort			

Tag / Datum Uhrzeit Sperrung	Umbaugleis Nachbargleis	Personal-bedarf	Arbeits-richtung	

Geschwindigkeit im Gleis nach Betra	
Personalbereitstellung	

Lok- und Wagenbereitstellung		

Bemerkungen:	Verteiler		

Buchungsmerkmale :

Maßnahme:

Strecke:

Projekt - Nr.:

AIB - Nummer:

Bahnstellen - Nr.:

Rahmenkostenstellen - Nr.:

PSP-Element, Projekt - Nr. (SAP-R 3/Netz):

Aufgestellt: ,den

....20 .....

(Unterschrift) (Namenszeichen)

Vereinfachter Bauablaufplan
(Variante 2)

DB AG

Netzbezirk ..... - 10 – x

Datum und Zeichen: .....
Bearbeitung:.....
Telefon:.....
Anlagen:.....

Thema:.....

1. **Buchungsmerkmale:**

NL: .....
Netzbezirk: .....
Projekt - Nr.: .....
AIB – Nr.: .....
Bahnstellen – Nr.: .....
Rahmenkostenstellen – Nr.: .....
PSP – Element, Projekt – Nr. (SAP – R /Netz):.....

2. **Gleis von Bf: .....bis Bf: .....**
   Weiche/n im Bf: .....

3. **Gleis von km: .....bis km .....**
   Weichen – Nr.: .....

4. **Umbaulänge: .....**
   WE: .....

5. **Oberbauform alt / neu : .....**

6. **Ausführungszeit von : .....bis.....**

7. Betriebliche Angaben:

Sperrzeiten: .....
Betriebsweise: .....
Langsamfahrstellen: .....
Besonderheiten: .....

8. Bauüberwachung: .....

9. Auftragnehmer: .....

10. Bauleitung: .....

11. Oberbautechnische Maßnahmen: .....
.....
.....
.....
.....

12. Signaltechnische/ Telekom Maßnahmen: .....
.....
.....
.....
.....

13. Oberleitungstechnische Maßnahmen: .....
.....
.....
.....
.....

14. Bauablaufbeschreibung:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

15. Oberbauschweißung
durch: .....
.....
.....

16. Baukapazitäten:
a) Personal: .....
.....
.....
.....

b) Baumaschinen: .....
.....
.....
.....

c) Transportmittel: .....
.....
.....
.....

17. Besonderheiten: .....
.....
.....
.....
.....

.....
.....


Aufgestellt: **zugestimmt:**

(Name) (Unterschrift)

❑

Symbole der wichtigsten Arbeitsgänge

Zeichenerklärung :

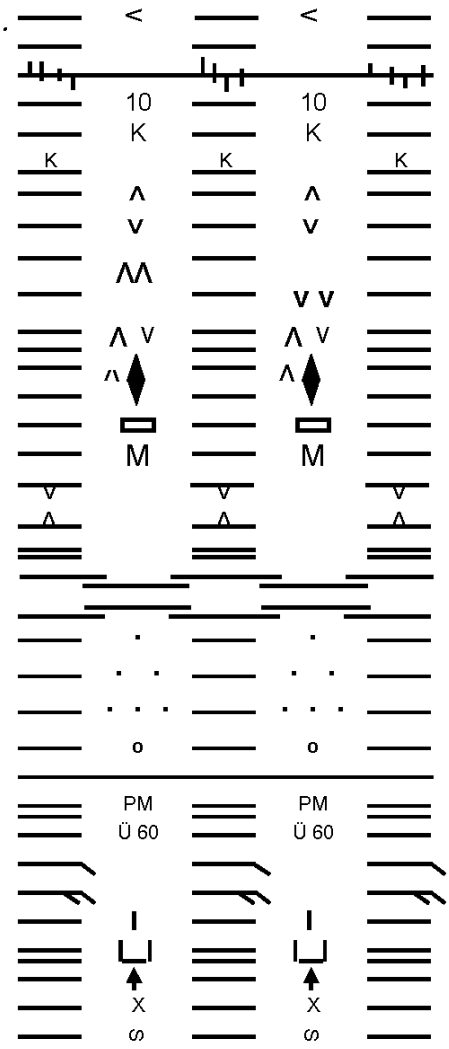

= Schienen um - und aufsetzen
= Arbeitsschienenbau
= Schienen auf ..... m trennen,verziehen
= Vorbehandl.d. Kleineisens u. Ausbau b.a.jede 10.Schwelle
= Vollständiger Kleineisenausbau vor dem Umbau
= Altkleineisen verladen
= Gleisjochausbau
= Gleisjochvorbau
= Schwellenausbau
= Schwellenvorbau
= Gleisaus - und - vorbau
= Weichenausbau
= Weicheneinbau
= Schwellenwechsel voraus
= Gleismontage
= Schienen entladen
= Schienen aufladen
= Schienenerneuerung bzw. - auswechselung
= Schwellen abladen
= Schwellen aufladen
= Bettungsreinigung mit BRM gleisfahrbar
= Bettungsreinigung mit BRM raupenfahrbar
= Bettungsausbau mit Erdbaumaschinen
= Schotter aus gf. Wagen entladen
= Schotter / Sand planieren u. verdichten
= Plv / Be v mit Planumsverbesserungsmaschine
= Überhöhung auf 60 mm reduzieren
= 1. Verdichtgang
= 2. Verdichtgang
= 1. Stabilisierung
= 2. Stabilisierung
= Gleisverschwenkung
= Zwischenschweißung herstellen
= Entspannen, Schlußschweißung, Verspannen

Zusammenstellung der abzustellenden Maschinen und Wagen

Baustelle: Ehrenbreitstein - Vallendar

Baustellen-Nr.:

Ausführungszeitraum: 27. - 29.09.2004

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lfd. Nr.	Art d. Maschinen und Wagen	Kurz-bezeichng	An-zahl	Einzel Lüp [m]	Gesa mtLüp [m]	Einzel-gewicht [t]	Gesamt-gewicht [t]	Zeitraum: An- / Abfuhr (Datum) An:	Ab:	Bemerkung
1	Gleishublader	H1	1	12	12		0	26.09. 2004	28.09. 2004	VG 90
2	Umbauzug	UM	7	20	138		0	26.09. 2004	28.09. 2004	
3	Neuschwellenwagen	Ns	22	20	438		0	26.09. 2004	28.09. 2004	
4	Altschwellenwagen	As	1	20	20		0	26.09. 2004	28.09. 2004	
5	Schienentransporteinheit	T	1	205	205		0	26.09. 2004	28.09. 2004	180m
6	Gleishublader	H2	1	12	12		0	26.09. 2004	28.09. 2004	VG 90
7	Bettungsreinigungs-maschine	B	1	32	32		0	26.09. 2004	28.09. 2004	RM 80
8	Material-Föder-Silo-Wagen	MFS	10	20	199		0	26.09. 2004	28.09. 2004	9 MFS
9	Gleisstopfmashine	G1	1	28	28		0	26.09. 2004	27.09. 2004	09-32
10	Schotterplanierm.	P1	1	13	13		0	28.09. 2004	28.09. 2004	SSP 100
11	Schotterwagen	Fc	15	16	240		0	27.09. 2004	30.10. 2004	
12	Gleisstopfmaschine.	G2	1	28	28		0	27.09. 2004	30.10. 2004	09-32
13	Schotterplanierm.	P2	1	13	13		0	27.09. 2004	30.10. 2004	SSP 100
14	Skl Os	21	1	15	15		0	29.09. 2004	30.10. 2004	

Aufgestellt:
AN: _____ **Datum:** _____

Erfassung der Abstellmöglichkeiten für Maschinen und Wagen

Baustelle Ehrenbreitstein - Vallendar

Ausführungs-zeitraum: 27.– 29.09.2004

Baustellen - Nr.:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bahnhof	**Gleisbe-zeich-nung**	**Besonderheit des Gleises**	**Nutzbare Länge** [m]	Verlänge-rung des Gleises möglich	**Benutzung möglich** **von bis**	Ober-leitungs Über-spannung	Elektr. Anschluß (V) (A)	Sonstige Anschlüsse Wasser (W)	Kanal (K)	Telefon (T)	**Verwendungs-vorschlag**
Oberlahnstein	4C		550	nein	28.-30.09.	ja	-	nein	nein	nein	Fc
Oberlahnstein	5B		900	nein	27.-30.09.	ja	-	nein	nein	nein	Ns, As
Oberlahnstein	7C		550	nein	28.-30.09.	ja	-	nein	nein	nein	Fc, Ux
Oberlahnstein	13M		300	nein	25.-30.09.	ja	-	nein	nein	nein	B, MFS
Oberlahnstein	14M		700	nein	25.-30.09.	ja	-	nein	nein	nein	UM, T
Ehrenbreitstein	4		774	nein	23.-30.09.	ja	-	nein	nein	nein	G1, P1, G2, P2
Ehrenbreitstein	8	Stumpfgleis	178	nein	ab 25.09.	ja	-	nein	nein	nein	21
Ehrenbreitstein	11	Stumpfgleis	88	nein	ab 25.09.	ja	-	nein	nein	nein	H1, H2,
Ehrenbreitstein	12	Stumpfgleis	214	nein	ab 25.09.	ja					

Aufgestellt:

Datum:

Baustelle: Ehrenbreitstein - Vallendar **Ausführungszeitraum:** **27. - 29.09.2004**

Baustellen-Nr.:

Gleisbelegungsplan

Abstellung: Umbau/Plv-Systeme Oberbaumaschinen Wagen	Fc-Wagen	Ns-Wagen, As-Wagen	Fc-Wagen	B,MFS	UM, T					G1, P1, G2, P	21	H1, H2,		
Lfd. Nr.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Bahnhof:	**Oberlahnstein**									**Ehrenbreitstein**				
Gleis - Nr.:	4C	5B	7C	13M	14M					4	8	11		
nutzbare Länge (m)	550	900	550	300	700					774	178	88		
Oberleitungsüberspannung	ja									nein		nein		
elektrische Anschlüsse	nein									nein		nein		
sonstige Anschlüsse	nein									nein		nein		
Datum														
26.09.2004														
27.09.2004														
28.09.2004														
29.09.2004														
30.09.2004		**458m**		**240m**	**343m**							**24m**		
	160m		**80m**							**82m**	**15m**			

Aufgestellt:..... **Datum:.....**

Bemerkungen:

Lfd. Nr.	BZ	Maschine
1	**H1**	Gleishublader
2	**UM**	Umbauzug UM
3	**Ns**	Neuschwellenwagen
4	**As**	Altschwellenwagen
5	**T**	Schienentranstorteinheit
6	**H2**	Gleishublader
7	**B**	Bettungsreinigungsmasch.
8	**MFS**	Material-Förder-Silo-Wg.
9	**Fc**	Schotterwagen
10	**P1 P2**	Schotterplaniermaschinen
11	**G1 G2**	Gleisstopfmaschinen
12	**21**	Skl Os
		Gleis ständig belegt
		Gleis zeitweise belegt

W=Wasser K=Kanal T=Telefon

Anlage zur Betra _____
NL
I.NBB-x-L 31
I.NDI-x-L 2 - 5

Betriebsablaufplan

Baustelle: **Ehrenbreitstein - Vallendar**
Baustellen - Nr.: _____
Ausführungszeitraum: **27. - 29.09.2004**

Betra - Nr.: _____

1. Arbeitsrichting: Ehrenbreitstein - Vallendar

2. Kurzbezeichnungen und Abkürzungen:

H 1	=	Hublader	MFS	=	Material-Förder- u.Silowgn.
UM	=	Umbauzug	33	=	Arbeitszuglok V 211
Ns	=	Neuschellenwagen	G 1	=	Gleisstopfmaschine
As	=	Altschwellenwagen	P 1	=	Schotterplaniermaschine
31	=	Arbeitszuglok V 290	Fc	=	Schotterwagen
T	=	Schienentransporteinheit	G 2	=	Gleisstopfmaschine
32	=	Arbeitszuglok V 290	P 2	=	Schotterplaniermaschine
H 2	=	Hublader	21	=	Skl OS
B	=	Bettungsreinigungsmasch.			

ObLst = Oberlahnstein
NLst = Niederlahnstein

3. Lokeinsatz


Datum:	Az-Lok-Nr.	Zeit von:	bis:
27.09.2004	31	06:00	00:00
27.09.2004	32	20:00	00:00
27.09.2004	33	22:00	00:00
28.09.2004	31	00:00	00:00
28.09.2004	32	00:00	00:00
28.09.2004	33	00:00	00:00
29.09.2004	31	00:00	10:00

4. Zugnummern
Für die Arbeitszüge und Sperrfahrten sind die Nummern aus der Zugmeldereihe 80 526 - 8053
für den Bereich des Netzbezirks Koblenz zu verwenden.

Betriebsablaufplan

Baustelle: **Ehrenbreitstein - Vallendar**
Baustellen - Nr.:
Ausführungszeitraum: 27. - 29.09.2004
Betra - Nr.:

Anlage zur Betra
I.NBB-x-L 31
I.NDI-x-L 2 - 5

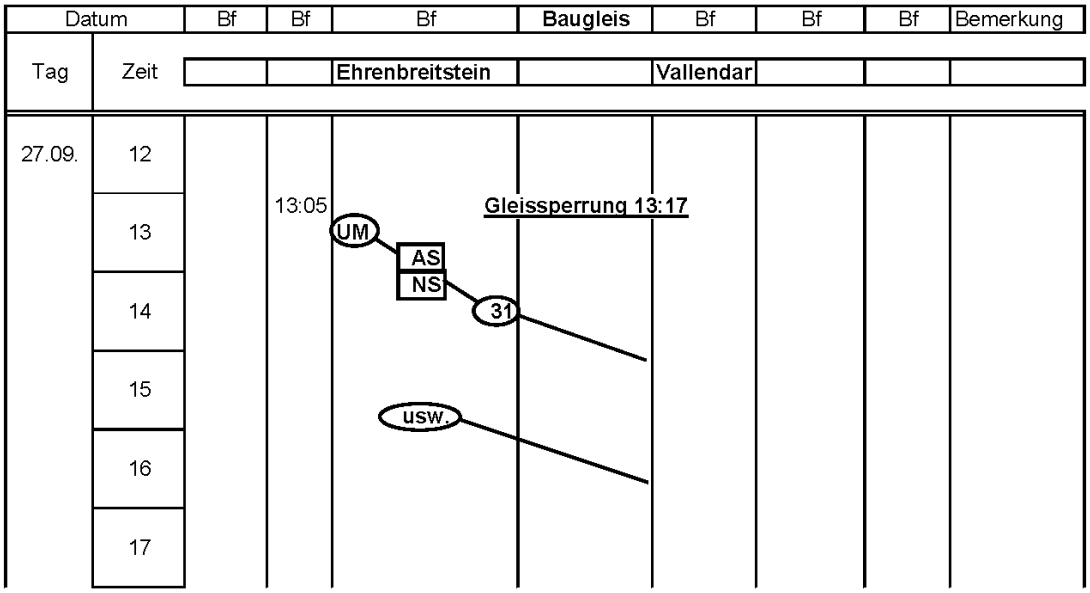

Personaleinsatzplan der Ansprechpartner

Baustelle:..... **Baustellen-Nr.:.....**

	Tag	Samstag												Sonntag												usw.		
	Datum	27.09.2004												28.09.2004												01.10.2004		
Personale	Uhrzeit	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	02	04	06
Name: zuständig für: **Fb**																												
Name: zuständig für: **LST**																												
Name: zuständig für: **E**																												
Name: zuständig für: **. . .**																												

usw.

Aufgestellt :.....

Checkliste

Voraussetzungen für den Beginn von Bauarbeiten unter Betriebsbedingungen

Baumaßnahme:

Baustellen - Nr.:

Ausführungszeitraum:

Maßnahmen	ja	nein	entfällt	Bemerkungen, Auflagen	Verantwortlicher	Kontrolle durch/ wann
Planung / Genehmigungen /Betra						
Liegt Tätigkeitsblatt nach Richtlinie 823.0150 (Planungsphase II, Anhang 01) vor						
Ist es vollständig und ordnungsgemäß mit den entsprechenden Erledigungsvermerken geführt						
Liegt geprüfter, vom AG genehmigter Bauablaufplan vor und ist dieser verteilt						
Sind darin Parameter für einen qualifizierten Abbruch angegeben						
Liegen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vor (Nachtarbeit, Lärmbelästigung, Straßensperrung usw.) vor						
Betriebliche Maßnahmen						
Liegt Betra vor und ist verteilt						
Ist zuständiger Baubetriebskoordinator festgelegt und erreichbar						
Kabel						
Ist aktualisierter Kabellageplan auf der Baustelle vorhanden						
Ist Kabellage bekannt und markiert						

Maßnahmen	ja	nein	entfällt	Bemerkungen, Auflagen	Verantwortlicher	Kontrolle durch/ wann
Sind Kabel gesichert						
Sind Bauausführende über Kabellage unterrichtet						
Ist Kabelmerkblatt ausgehändigt und unterzeichnet						

Personal

Ist Sicherungspersonal ausreichend vorhanden						
Ist Sicherungspersonal eingewiesen						
Sind in der Betra für alle Funktionen Verantwortliche festgelegt (Bauüberwachung, Schaltantragsteller, Bauleiter f. Einzelarb., Zuständ. f. Bahnerden)						
Sind die Funktionsträger laut Betra anwesend oder erreichbar?						
Sind Funktionsträger eingewiesen?						
Ist Bauleiter AN benannt und anwesend						
Ist Personal AN gemäß Bauablaufplan ausreichend vorhanden						
Ist Personal AN eingewiesen						

Material / Logistik, auch Az -Lok, Az - Führer, Tf

Sind alle erforderlichen Materialien vorhanden						
Sind die dafür erforderlichen Abstellgleise/Lagerplätze bekannt						
Liegt Betriebsablaufplan zur Zuführung vor und sind die Kapazitäten entsprechend bereitgestellt						
Sind die erforderlichen Wagen vorhanden						
Sind die Wagen richtig gereiht						
Stehen die Wagen in der erforderlichen Arbeitsrichtung						

Maßnahmen	ja	nein	entfällt	Bemerkungen, Auflagen	Verantwortlicher	Kontrolle durch/ wann
Sind die erforderlichen Tfz vorhanden						
Sind die dafür erforderlichen Abstellgleise bekannt						
Sind die erforderlichen Tf vorhanden						
Sind die erforderlichen Az - Führer vorhanden und eingewiesen.						

Maschinen

Sind alle erforderlichen Maschinen vorhanden						
Sind die dafür erforderlichen Abstellgleise/-plätze bekannt						
Sind die Maschinen richtig gereiht						
Stehen die Maschinen in der erforderlichen Arbeitsrichtung						
Sind Ersatzmaschinen erforderlich						
Sind Ersatzmaschinen vorhanden						
Sind die dafür erforderlichen Abstellgleise/-plätze bekannt						

UVV

Liegt Sicherungsplan nach „RIMINI“ vor; ist SiGeKo erfolgt.						
Sind die Personale der DB AG und der AN in örtliche Unfallverhütung eingewiesen						

Bauüberwacher:

Name: ----------
Titel: ----------
OE: ----------

Die vorgenannten Kriterien wurden vor Baubeginn geprüft und es wurde festgestellt, daß ein planmäßiger Bauablauf gewährleistet ist

Datum: ----------
Unterschrift: ----------

ergänzende Auflagen der Bauüberwachung:	Verantwortlicher	Kontrolle durch / wann

Bei Abweichungen vom Bauablauf > ..... min und anderen Unregelmäßigkeiten ist der Baubetriebskoordinator zu verständigen:

Name: ---------- Telef ---------- OE:___

❑

Verzeichnis der Abkürzungen

Fahrzeuge mit eigenem Antrieb

Az - Lok	=	Arbeitszuglokomotive
B	=	BRM
DS	=	Dynamischer Gleisstabilisator
F	=	Flankenreiniger
G	=	Gleisstopfrichtmaschine
H	=	Hublader
K	=	Kran
Köf	=	Kleinlok - Ölverbrennungsfahrzeug
KSE	=	Kies - Schotter - Einbaumaschine (KSEM)
P	=	Schotterplaniermaschine
PM	=	Planumsverbesserungsmaschine
Skl	=	Schwerkleinwagen
SMD	=	Schnellumbaumaschine (SMD 80)
SUM	=	Schnellumbaumaschine
SVV	=	Sandverteil - und Verdichtmaschine (SVV 100)
UH	=	Umbauzug Hochleistung
UM	=	Umbauzug Matisa
UPZ	=	Umbauzug Plasser Zweischwellen
UN	=	Umbaumaschinensatz Niemag
VFW	=	Umbauzug (VFW 2001)
W	=	Weichenstopfrichtmaschine
Y	=	Schwellenwechsler
Z	=	Zweiwegebagger
Nr. 21 - 29 Skl	=	Schwerkleinwagen
Nr. 31 - 39 A-Lok	=	Arbeitszuglokomotive
TVT	=	Turmverbrennungstriebwagen

A b k ü r z u n g e n

A	=	Mobilbagger
Ak	=	Altkleineisensammelwagen
A - Lok	=	Arbeitszuglokomotive
Anschl.	=	Anschluß
As	=	Altschwellenwagen
AR	=	Abraumverladeanlage
AT	=	Antriebswagen
B	=	BRM
Baua	=	Bauarbeiter
Be t	=	Bettungserneuerung teilweise
Be v	=	Bettungserneuerung vollständig
BLZ	=	Bauleitzentrale
BRM	=	Bettungsreinigungsmaschine
BSG	=	Schüttgutwagen (BSG 60)
Bstg	=	Bahnsteig
BSW	=	Bunker - Silo - Wagen (BSW 2000)
BT	=	Bautrupp
BÜZ	=	Bauüberwachungszentrale
BW	=	Bauweiche
C	=	Schienenumsetzgerät
D	=	Doppelvibrationswalzen
DS	=	Dynamischer Gleisstabilisator
E	=	Seilbagger
F	=	Flankenreiniger
Fc	=	Schotterwagen
Fz	=	Muldenkippwagen
G	=	Gleisstopfrichtmaschine
gf	=	gleisfahrbar
Gs	=	Gleissperre
Gü	=	Güterwagen
Gw	=	Gerätewagen
H	=	Hublader
Hd	=	Hand
Jn	=	Jochtransportwagen " UN " BA 227, BA 245
Jt	=	Jochtransportwagen
KW	=	K - Wagen
K	=	Kran
Köf	=	Kleinlok - Ölverbrennungsfahrzeug
Kr	=	Kreuzung
Ks	=	Kleineisensammelmaschine
KSE	=	Kies - Schotter - Einbaumaschine (KSEM)
L	=	Laderaupe

W	=	Leere Wagen
max.	=	maximal
min.	=	minimal
MFS	=	Materialförder- und Siloeinheit
Mv	=	Materialverladestation
Mw	=	Maschinenwärter
Nk	=	Neukleineisenwagen
NL	=	nutzbare Gleislänge
Ns	=	Neuschwellenwagen
n	=	Baubeginn
P	=	Schotterplaniermaschine
Plv	=	Planumsverbesserung
PM	=	Planumsverbesserungsmaschine
RW	=	Rungenwagen
R	=	Planierraupe

1 Bestellung der Schienen

(1) Der Netzbezirk (NB) stellt nach den jeweiligen Erfordernissen ein Schienenband auf (vgl. Anhang 1). Bei Anforderung von Schienen, die mit v > 160 km/h befahren werden, ist im Schienenband die zul. Geschwindigkeit in roter Schrift einzutragen.

Schienenband Anhang 1

Der NB legt das Schienenband I.NIA-X-I 2 zur Planung und Einleitung der Beschaffung vor.

2 Kontrolle der aufgearbeiteten Schienen an der Einbaustelle auf äußere Mängel, die dem Schweißwerk anzulasten sind

(1) Die vom Schweißwerk gelieferten Schienen sind vom NB durch Augenschein stichprobenweise auf äußere Mängel hinsichtlich:

Kontrolle der Schienen

a) Anzahl und Mindestabstand der Schweißungen gemäß Ril 820.2010

b) der Schienengüte

c) Schienenhöhen gem. DBS 918255

d) Abfasung an den Schienenenden und den Bohrlöchern bei Schienen für Stoßlückengleise zu kontrollieren.

Bei Unregelmäßigkeiten ist der Anlagenverantwortliche einzuschalten.

3 Behandlung gewährleistungspflichtiger Gleis- und Weichenschienen

Gewährleistung

(1) Gewährleistungen, die durch den Hersteller zu vertreten sind, regelt der Liefervertrag.

Gewährleistungsfrist

(2) Die Gewährleistungsfristen für Gleis- und Weichenschienen sind im Liefervertrag geregelt und werden von Ag Einkauf überwacht.

Prüfung der Schienen beim Einbau auf der Baustelle

(3) NB muss die gelieferten Schienen vor dem Einbau überprüfen.

a) auf Einhaltung der Bestellung:
Abweichungen sind direkt der Lieferfirma und Ag Einkauf anzuzeigen.

b) auf sichtbare Mängel, wie z. B:

1. Oberflächenfehler,
2. Verbiegungen und
3. mechanische Beschädigungen.

Mängel sind I.NIA-X-I 2 sofort telefonisch zu melden und schriftlich dem Ag Einkauf anzuzeigen.

Prüfung der Schienen im Gleis

(4) Vor Ablauf der Gewährleistungsfrist sind alle Schienen vom NB einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen.

Schäden und Brüche, auch durch Ultraschallprüfung entdeckte Mängel der Fehlergruppen 1 und 2, auf Schnellfahrstrecken Fehlergruppen 1, 2 und 3 sind vom NB zu erfassen und gemäß Abs. (5) zu melden.

Anhang 2

Die beanstandeten Schienen sind vom Fachbeauftragten (Fb) im Gleis dahingehend zu überprüfen, ob gewährleistungspflichtige Fehler vorliegen. Die Stellungnahme ist im Verzeichnis für innerhalb der Gewährleistungsfrist schadhaft gewordene Schienen (vgl. Anhang 2) abzugeben.

Meldeverfahren

(5) Gewährleistungspflichtige Schadschienen sind in das Formblatt "Verzeichnis für innerhalb der Gewährleistungsfrist schadhaft gewordene Schienen" (siehe Anhang 2) getrennt für

a) Brüche

b) Innere Fehler (Ultraschall)

c) Oberflächenfehler

einzutragen.

Das Formblatt ist I.NIA-X-I 2 vorzulegen.

I.NIA-X-I 2 erstellt das Verzeichnis und legt es Ag Einkauf vor.

(6) Der Einkauf leitet die Abwicklung der Gewährleistung auf der Grundlage der "Allgemeinen Einkaufsbedingungen der DB AG" (AEB) ein.

Abwicklung der Gewährleistung

4 Meldung schadhafter oder gebrochener Schienen in Gleisen und Weichen

(1) Bei jedem Schienenschaden oder Schienenbruch in durchgehenden Hauptgleisen, einschließlich der dazugehörenden Weichen und Kreuzungen, ist sofort nach der Entdeckung, die Meldung für schadhafte oder gebrochene Schienen in Gleisen und Weichen (in SAP R3) zu erstellen.

Meldung in SAP

5 Kennzeichnung von Schienen vor dem Ausbau

(1) Vom M Fb (SÜ) sind Schienen vor dem Ausbau auf Fehler und Beschädigungen zu untersuchen. Bekannte bzw. sichtbare Fehler und Schäden sind auf beiden Seiten der Schienen mit gelber Ölfarbe gemäß Anhang 3 zu kennzeichnen.

Kennzeichnung der Schienenfehler

Die zur Aufarbeitung geeigneten Schienen werden dem Schweißwerk zugeführt.

❑

NL .....
NB .....
Tel. ...../.....

Anforderung/
Schienenband Nr. .....

Schienenband **Muster**

Strecke .....
Gleis von ..... nach ..... von km ..... bis km .....

Bahnhof .....Gleis Nr. .....

Max v .....

Durchgehende Hauptgleise G
Sonstige Hauptgleise G
Nebengleise G
Gleiskategorie .....

Gleisbelastung (Gesamtzuglast) .....t/Tag

Ganzzugverkehr mit max 22,5 t Radsatzlast	ja G	nein G
Streckenverkehr mit max 22,5 t Radsatzlast	ja G	nein G
Neuschienen	ja G	nein G
Hemmschuhbetrieb	ja G	nein G
Zufuhr der Schiene mit Langschienentransporteinheit (Te)	ja G	nein G
Güterwagen des öffentlichen Verkehrs	ja G	nein G

einzubauende Oberbauform ..... Umbauverfahren .....
Oberbauprogramm Gj .....
Projektnummer ..... Leistung für Dritte ja G nein G
Aib-Nr. .....

Empfangsstelle	**Entladetermin**	**Aufgestellt**	**Geprüft**
NB ..... PLZ ..... Bestimmungs- Bahnhof ..... Ansprechpartner Tel. ..... Fax Nr.	(Tag + Uhrzeit) ..... Einbautermin von - bis	NB ..... Datum ..... Name .... Unterschrift	NL ..... Datum ..... Name .... Unterschrift

Buchungsleiste


Bahnstellennummer	**Zettel-Nr.**	**FAA-Nr.**	**Kunden Nr.**	**Rahmenkostenstelle**

Zusammenstellung der Schienen

Lfd. Nr.	**Schienen-form Und Güte**	**Material Nr.**	**Stück-zahl**	**Einzel-Länge m**	**Gesamtlänge m**	**Anzahl der ISO-Stöße S[1]/v[2]/I[3]**	**Bemerkungen**	**Auftrags-kurz-Nr.**
1	54 E3	**00591854**	**30**	**120**	**3600**	**1 S, v**		

[1] **S = Stoß** (im Schweißwerk hergestellt)
[2] **v = Stoß** (verstärkt)
[3] **I = IVG 30**

Hinweis: Mit Einführung des elektronischen Schienenbandes entfällt dieser Anhang

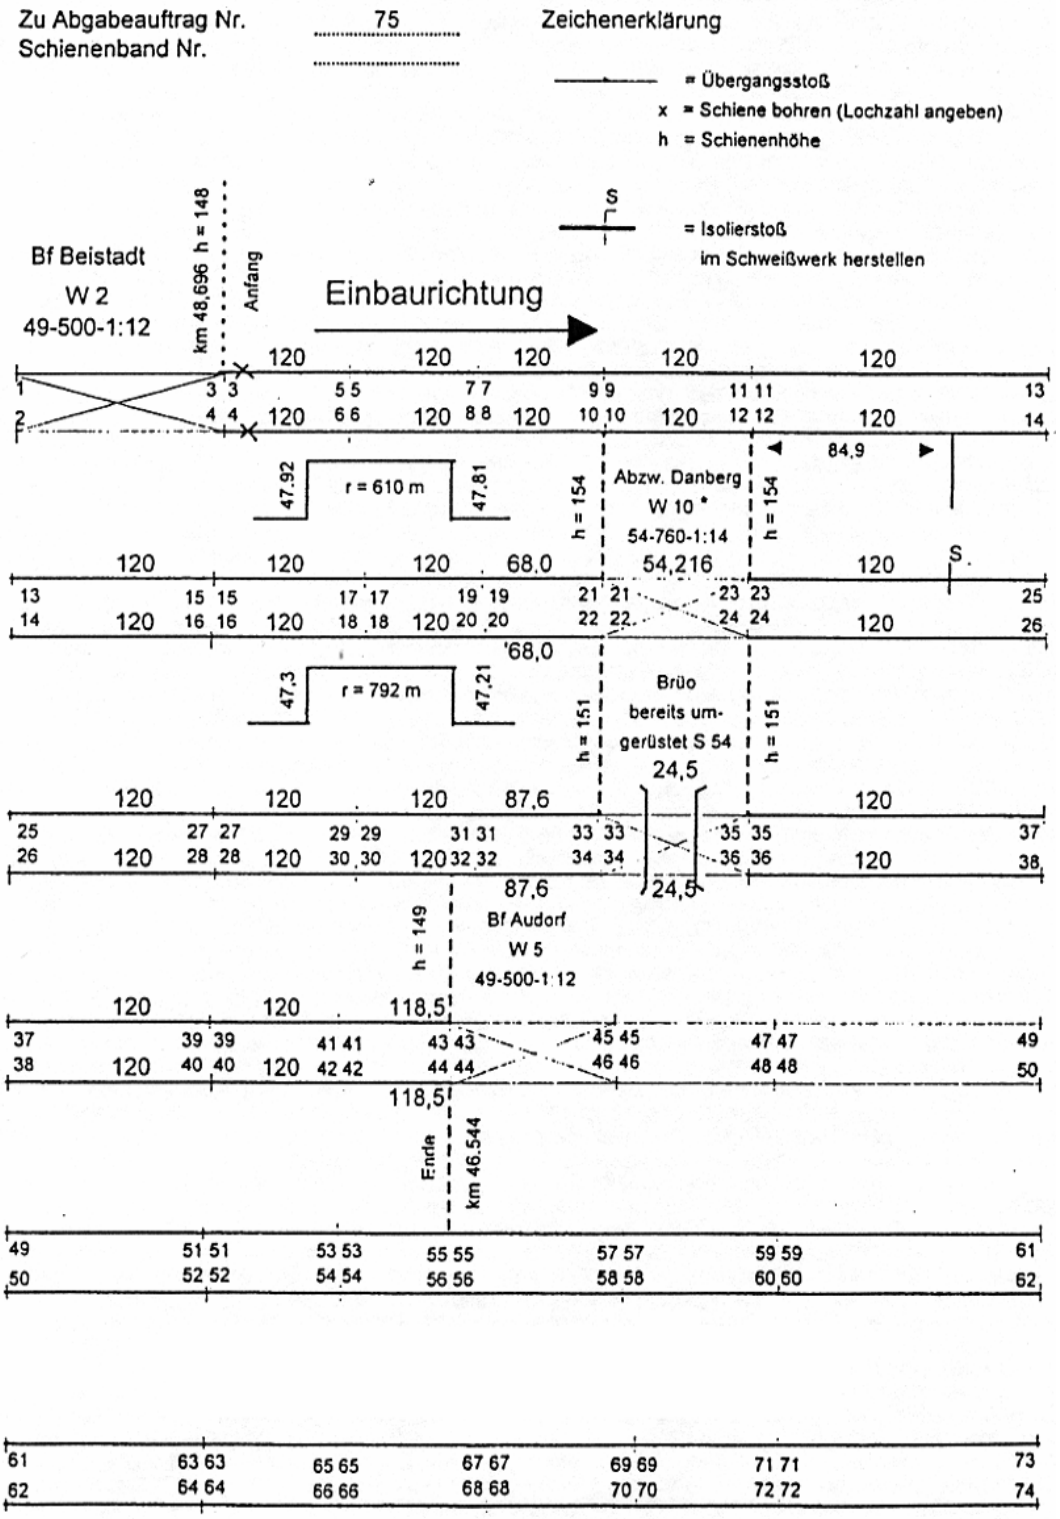
Zu Abgabeauftrag Nr. 75
Schienenband Nr.
Zeichenerklärung
= Übergangsstoß
x = Schiene bohren (Lochzahl angeben)
h = Schienenhöhe
S = Isolierstoß im Schweißwerk herstellen
Bf Beistadt
W 2
49-500-1:12
km 48,696 h = 148
Anfang
Einbaurichtung
120
r = 610 m
47,92
47,81
h = 154
Abzw. Danberg
W 10
54-760-1:14
84,9
68,0
54,216
r = 792 m
47,3
47,21
h = 151
Brüo
bereits um-
gerüstet S 54
24,5
87,6
Bf Audorf
W 5
49-500-1:12
h = 149
118,5
Ende
km 46,544

NL _____ Ort/Datum _____
NB _____ Telefon _____
Beanstandungs-Nr.: _____
(wird von Ag Einkauf eingesetzt)

VERZEICHNIS
für innerhalb der Gewährleistungsfrist schadhaft gewordene Schienen

Aufgestellt und

_____

Fachbeauftragten Fb vorgelegt

_____
(Name Unterschrift)

An I.NIA-X-I 2
Kenntnis genommen, geprüft und Ag Einkauf übersandt
I.NIA-X-I 2 _____
(Datum und Zeichen)

_____
(Name Unterschrift)

Stellungnahme des Fachbeauftragten Fb:
1) Örtlich geprüft am 04.02.97
2) Zu 1 – 2: Riefen auf der Fahrfläche nach Bild 2212 (40 und 20 cm lang)
Zu 3 – 4: Walzsplitter auf der Fahrfläche nach Bild 2211
3) Zu 1 – 4: Gewährleistung ist anzumelden – Ausbau z. Z. nicht erforderlich

_____
(Name Unterschrift)

Bestellschreiben		Walzzeichen				Lage	
Nummer	Datum	Hersteller-werk	Walzjahr	Schienen-form	Stahlsorte Zusatz-zeichen	Geis von	Geis nach
19.287	17.11.96	K	1996	S 54	____ _____	Holzkirchen	Rosenheim


	Prägezeichen			Lage		Schaden		
Lfd. Nr.	Schmelz-nummer	Schienen-bezeich-nung	Gespann-block Nr.	von km	bis km	Fehlerbeschreibung US-Fehlergruppe (vgl. Ril 821.2007)	Bild nach DS 820/ I/ 4A künftig Ril 821.2007	Schienenersatz-länge
1	45 931	Z	23	1,11	1,112	Riefe	2212	10 m
2	53 039	Z	43	1,41	1,43	Riefe	2212	10 m
3	56 498	Z	37	3,630	3,633	Walzsplitter	2211	10 m
4	56 487	Z	16	3,671	3,674	Walzsplitter	2211	10 m

❑


Fehlerkennzeichnung





Schienenfelder sind auf beiden Seiten mit gelber Ölfarbe zu kennzeichnen.

Der Schadensbereich ist durch Pfeile einzugrenzen.



Ist die gesamte Schienenlänge betroffen, ist die Schiene jeweils am Anfang und am Ende zu kennzeichnen, wobei die Pfeile zu den Enden zeigen.



Fehlerart	**Kennzeichnung** gemäß Ril 821.2007
a) Ultraschallfehler (werden vom US-Prüfer angeschrieben)	
b) Fahrkantenschäden - Shelling Schäden - Anrisse - schwarze Flecken	
c) periodisch wiederkehrende Schlagstellen ("Kugeleindruck")	
d) Sonstige Fehler auf der Fahrfläche (Dellen, Schleuderstellen usw.	
e) Riffel und Wellen	

❑

820.2120 (alt)

1 Schienenform

Einteilung der Schienen

(1) Schienen werden eingeteilt:

- in Neuschienen
- altbrauchbare Schienen mit und ohne Aufarbeitung
- nach dem Profil
- nach der Stahlsorte
- nach der Schienenlänge


Bezeichnung der Schienen

(2) Schienen werden mit dem Metergewicht in kg/m, nach den Bezeichnungen der Euronorm EN 13674-1 bezeichnet. (z.B. 49 E 1, 54 E3, 60 E 2).

Walzzeichen

(3) Die Walzzeichen sind erhaben auf einer Schienenseite in Stegmitte im Abstand von höchstens 4 m aufgewalzt.

Beispiele für Walzzeichen:

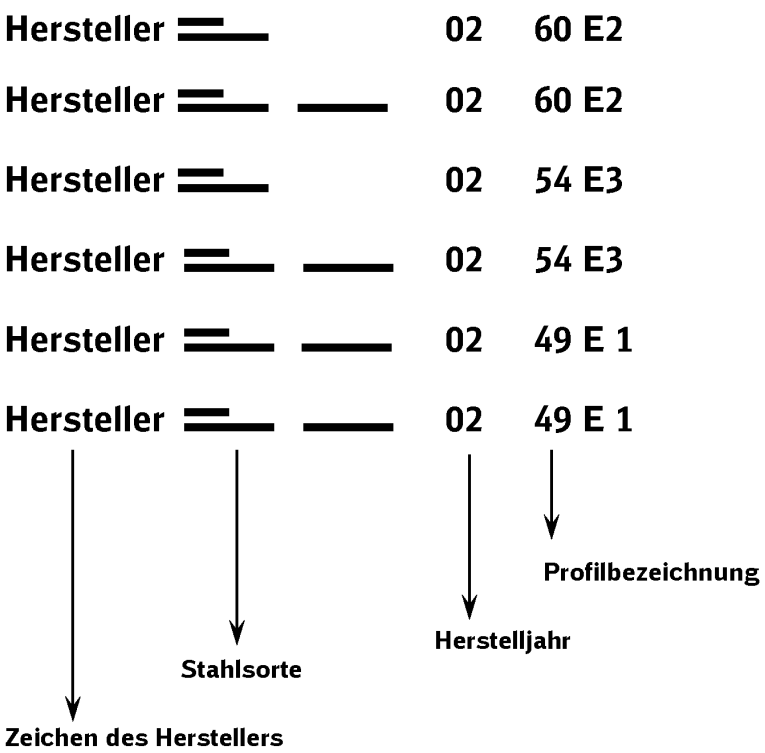

2 Symbole für das Erschmelzungsverfahren

Verfahren	Zeichen
Basisches Siemens-Martin-Verfahren	
Elektroverfahren	
Sauerstoffblasverfahren	



Warmstempel

Zusätzlich zu dem Walzzeichen muss jede Schiene mittels eines numerischen und/oder alphabetischen Codes auf der dem Walzzeichen gegenüberliegenden Seite des Schienensteges fortlaufend im Abstand von höchstens 5 m eingeprägt werden.

Beispiele für Prägezeichen beim Stranggussverfahren

Schmelz-Nr	Schienenbezeichnung	Gespann-Nr.	Block-Nr.
77	**A**	**2**	**7**

3 Stahlsorten

Stahlsorte	Härtebereich HBW	Beschreibung	Walzzeichen	Güte
R 200	200 – 240	Kohlenstoff-Mangan (C-Mn)-Stahl	Ohne Strich	700
R 220	220 – 260	Kohlenstoff-Mangan (C-Mn)-Stahl		800
R 260	260 – 300	Kohlenstoff-Mangan (C-Mn)-Stahl		900A
R 260 Mn	260 – 300	Kohlenstoff-Mangan (C-Mn)-Stahl		900B
R 320 Cr	320 – 360	Legierter Stahl (1% Cr)		1100
R 350 HT	350 - 390	Kohlenstoff-Mangan (C-Mn)-Stahl wärmebehandelt		Kopfgehärtet

❑

1 Allgemeines

Zweck der Weichenskizze

(1) Die Weichenskizze (Wsk) ist die Grundlage für die Beschaffung von Weichen, Kreuzungen, Hemmschuhauswurfvorrichtungen und Schienenauszüge, im folgenden als Weichen bezeichnet. Sie ist mit Vordruck 823.0700V01 aufzustellen. Für die Beschaffung von Schienenauszügen ist der Vordruck 823.0700V02 zu verwenden.

Anlegen der Weichenskizze

(2) Die Weichenskizze ist vom Auftraggeber im Maßstab 1:500 anhand der Festlegungen im Trassierungsentwurf zu erstellen. Zum Umfang der Darstellung gehören die zu beschaffenden Weichen einschließlich 40 m langer Gleisabschnitte vor und hinter den Weichen sowie, wenn nicht das Gleis anschließt, die benachbarten Weichen. Zusätzlich ist für die zu beschaffenden Weichen eine Isolierskizze zu erstellen. Bei der Erneuerung oder Auswechslung von Weichen in unveränderter Lage kann die letzte Weichenskizze als Grundlage verwendet werden.

Ergänzende Unterlagen

(3) Für Bogenweichen mit Überhöhung ist nach Ril 883.0030 zusätzlich ein Weichenhöhenplan vom Auftraggeber zu erstellen und der Weichenskizze hinzuzufügen.

Für Weichenverbindungen mit nicht parallelem Gleisabstand ohne Überhöhung oder in Fällen, in denen der Abzweig der Weiche in ein nicht vermarktes Gleis führt, ist ein Weichenbeiblatt vom Auftraggeber zu erstellen und der Weichenskizze hinzuzufügen.

Für Weichen S 49, die entgegen den Festlegungen der Richtlinie „Bauarten des Oberbaues für Gleise und Weichen“ bestellt werden, ist vom Auftraggeber eine UiG zu erwirken und der Weichenskizze hinzuzufügen.

Die ergänzenden Unterlagen sind im Vordruck der Weichenskizze zu vermerken.

Nummerierung der Weichenskizze

(4) Die Weichenskizze (vgl. Vordruck 823.0700V01) ist vom Auftraggeber mit einer Nummer zu kennzeichnen. Die Nummer setzt sich zusammen aus

- dem Gattungszeichen Wsk
- dem Jahr
- der Kennziffer für den Instandhaltungsstandort (s. Ril 823.0700A01 Tabelle 1)

- der laufenden Nummer innerhalb eines Geschäftsjahres aus dem jeweiligen Nummerkreis der bestellenden Organisationseinheit (s. Ril 823.0700A01 Tabelle 2)

Beispiel Wsk 2003.11.0001

Die Vergabe der fortlaufenden Nummern ist durch die in Tabelle 2 angeführten Organisationseinheiten oder in deren Auftrag durch die zuständige Niederlassung innerhalb der vorgegebenen Nummernkreise zentral vorzunehmen. Nummern für die Organisationseinheit „Andere“ müssen von den jeweiligen Auftraggebern bei den Niederlassungen DB Netz beantragt werden.

Die zur Nummernvergabe berechtigten Personen der Organisationseinheiten sind an DB Netz Zentrale (N.VT) zu melden.

Die Nummer der Weichenskizze erhält für die Beschaffung zusätzlich folgende Buchstaben

- nur Schwellensatz „S"
- nur Weichenfahrbahn ,,F“ (Zungenvorrichtung, Zwischenschienen, Fahrschienen mit Radlenkern, Schienenverbindungsmittel)

Die vergebenen Nummern der Weichenskizzen eines Jahres müssen bestehen bleiben. Sie werden bei jeder Änderung zusätzlich mit Großbuchstaben (A, B, C usw.) ergänzt.

Mitwirkung der DB-Fachbereiche bei der Weichenskizze

(5) Bei der vom Auftraggeber angelegten Weichenskizze müssen die DB-Fachbereiche Vermessung, Fahrbahn, LST und EM-Technik mitwirken. Bei der Bestellung eines Schienenauszuges müssen die DB-Fachbereiche Vermessung, Fahrbahn, und Brückenbau mitwirken. Die Mitwirkung des Fachbereiches Fahrbahn entspricht der oberbautechnischen Prüfung.

Die Prüfberechtigten der genannten Fachbereiche sind von den Niederlassungen an DB Netz Zentrale (N.VT) zu melden.

Freigabe der Weichenskizze

(6) Skizzen für Weichen in Hauptgleisen müssen die gemäß Ril 820.0103 dem Fachbereich Fahrdynamik DB Netz Zentrale (N.VTS (F)) zur Mitwirkung vorgelegt werden. Durch die Zentrale erfolgt die Freigabe mit dem Vermerk: fahrdynamisch und oberbautechnisch geprüft.

Für Weichen in Nebengleisen erfolgt die fahrdynamische und oberbautechnische Prüfung und Freigabe in der zuständigen Niederlassung.

Bestellung von Weichenverlegeplänen

(7) Nach der Freigabe der Weichenskizze sind durch den Auftraggeber (N.BI-X-L, Planungsgesellschaften, Ing. Büro) mit der Weichenskizze Verlegepläne bei DB Netz, Werk Oberbaustoffe Witten zu bestellen. Für eine geordnete Planung (Angebotseinholung, Herstellung) und Durchführung der Baumaßnahmen muss die Weichenskizze 6 Monate vor dem geplanten Beginn der Baumaßnahme im Weichenwerk vorliegen.

Aufträge für Sonderkonstruktionen

(8) Wenn die geplanten Weichen nicht mit Regelkonstruktionen gebaut werden können, müssen Sonderkonstruktionen (Definition s. Ril 800.0120, Abschn. 1, Abs. 10, 12, 13) erstellt werden. Der Einbau von Sonderkonstruktionen ist durch den Auftraggeber bei DB Netz, Zentrale (N.VT) zu beantragen. Aufträge für die Erstellung von Sonderkonstruktionen darf nur DB Netz, Zentrale erteilen.

Die Erstellung der Sonderkonstruktion erfordert einen zusätzlichen Planungsvorlauf, d. h. für die geordnete Durchführung der Baumaßnahmen muss die Weichenskizze 12 Monate vor Beginn der Baumaßnahme im Weichenwerk vorliegen.

2 Vermessungstechnische Angaben in der Weichenskizze

Darstellung der Weichen

(1) Die Darstellung der zu beschaffenden Weichen hat nach Ril 800.0120 und im Maßstab 1:500 zu erfolgen. Alle benachbarten Weichen in der Weichenskizze, die nicht zum Beschaffungsumfang gehören, sind mit leerem Weichendreieck darzustellen.

Maßeinheiten

(2) Alle Längenmaße und Radien sind in Meter, alle Winkel in Gon und die Überhöhung in Millimeter anzugeben.

Weichennummer und -bezeichnung

(3) Weichen und Schienenauszüge müssen mit der

- Weichennummer (eingekreiste arabische Zahl)
- Weichenbezeichnung (Weichenart, Schienenform, Radius der Weichengrundform, Neigung, Bauart des Herzstückes mit beweglicher Spitze, Links- bzw. Rechtsweiche, Schwellenart)
- SA-Bezeichnung (Auszugslänge, Schwellenart, Art der Führung)

versehen werden (vgl. Beispiel in Vordruck 823.0700V01 für Weichen bzw. 823.0700V02 für Schienenauszüge).

Angaben zu Gleisabschnitten, Gleisverbindungen und Weichenanschlüssen

(4) Die Bezeichnung der geometrischen Elemente und der Bogenhauptpunkte der Gleise müssen der DIN 1080 Teil 9 und der DIN 18790 Teil 2 sowie den Ergänzungen der Ril 883.9001 entsprechen.

Bei Gleisverbindungen zwischen parallelen Gleisen ist zusätzlich der Gleisabstand anzugeben.

Angaben, die aus Tafeln oder Regelzeichnungen entnommen werden können (Weichenlängen, Spreizmaße und dgl.), sind nicht einzutragen.

Darüber hinaus sind anzugeben:

- das Maß des Weicheneingriffs (Längenangabe mit negativen Vorzeichen für Weichenanschlüsse „WA an WE“ z. B. bei Grundform 190 – 1:7,5 mit fortlaufenden Bogen im Zweiggleis oder bei der Grundform 500 - 1:12 mit gekürzten Zungen und für Weichenanschlüsse „WE an WE“ mit Einkürzung der Herzstücke)
- die Gleislängen zwischen Weichenanfang (WA) bzw. Weichenende (WE) und Bogenhauptpunkten, Bogenanfang (BA), Bogenende (BE), Bogenwechsel (BW), Übergangsbogenanfang (UA), Übergangsbogenende (UE) mit Angabe der zugehörigen Radien (r), der Übergangsbogenlängen (l_u) und der Überhöhung (u)
- die Gleislängen zu benachbarten Weichen, Drehscheiben, Gleisbremsen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen, deren Abstand von der zu beschaffenden Weiche $l \leq 40$ m ist. Bei der Längenbestimmung ist von der letzten Weichenschwelle auszugehen. Andernfalls reicht die Angabe $l > 40$ m.

Für Weichenverbindungen mit längeren Zwischengleisen kann zusätzlich die Lage der Übergangsstöße mit den Schienenprofilen UIC 60 und S 54. angegeben werden.

Zusätzliche Angaben für Bogenweichen

(5) Bei Weichen im Kreisbogen ist der größere Radius mit r_s (Radius des Stammgleises) und der kleinere Radius mit r_z (Radius des Zweiggleises) zu bezeichnen.

Liegen Weichen zum Teil im Kreisbogen und zum Teil in der Geraden, so sind neben den Radien r_s und r_z auch die Bogenlängen l_b anzugeben.

Bei Weichen, die ganz oder zum Teil im Übergangsbogen liegen, sind anzugeben:

- die Entfernung des Weichenanfangs (WA) bzw. des Weichenendes (WE) vom Übergangsbogenanfang (UA) sowie die Übergangsbogenlänge (l_u)
- der Radius am Übergangsbogenende
- bei Übergangsbögen zwischen Korbbögen zusätzlich der Radius am Übergangsbogenanfang
- die Radien am Weichenanfang (r_{sa} und r_{za}) und am Weichenende (r_{se} und r_{ze}); bei Weichen, die ganz im Übergangsbogen liegen, sind zusätzlich die Radien in Weichenmitte (r_{sm} und r_{zm}) anzugeben. Der größere Radius r_s bezeichnet immer das Stammgleis, das in der Regel auch durchgehendes Strecken- oder Bahnhofsgleis ist.

(6) In Weichenskizzen für Schienenauszüge sind anzugeben:

Zusätzliche Angaben für Schienenauszüge

- eine Systemskizze der Überbauten und Anordnung der Fest- und Loslager (schematische Darstellung der Überbauten kann unmaßstäblich sein).
- Kilometrierung der dammseitigen Innenkante des Schotterabschlußbleches an der Dehnfuge des Tragwerks sowie die Kilometrierung des Beginn und des Endes des Schienenauszuges mit einer Genauigkeit von 3 Nachkommastellen
- Anordnung von Führungen (einseitig, beidseitig) und Kilometrierung des Beginns und des Endes der Führungen einschließlich der Fangvorrichtungen im Dammbereich.
- Gleislänge zwischen Überbauende und benachbarter Weiche im Dammbereich, wenn die Länge:
  1. bei zul. örtlicher Geschwindigkeit $v > 160$ km/h kleiner als 100 m
  2. bei zul. örtlicher Geschwindigkeit 80 km/h $< v \leq$ 160 km/h kleiner als 76 m
  3. bei zul. örtlicher Geschwindigkeit $v \leq 80$ km/h kleiner als 36 m ist.

Bei einer Unterschreitung dieser Gleislängen sind die Festlegungen für verkürzte Bereiche mit verminderten Durchschubwiderstand der Ril 820.2040 bei der Verlegeplanerstellung zu beachten.

3 Bestellangaben in der Weichenskizze

Angaben für Weichen

(1) Im Tabellenteil der Weichenskizze sind die im Vordruck Ril 823.0700V01 angeführten Angaben vom Auftraggeber und von den DB Fachbereichen Oberbau, EM und LST einzutragen.

Zusätzliche Angaben für Weichen S 49

(2) Für die Bestellung von Weichen S 49 ist immer der zugehörige Lageplan zu benennen. Werden in den Weichen von der Grundform abweichende Endteile verwendet, so sind sie ebenfalls in der Weichenskizze anzugeben.

Angaben zur Geschwindigkeit

(3) Es ist die örtlich zulässige Geschwindigkeit (zul v) in km/h; ggf. getrennt für Richtung und Gegenrichtung sowie die betrieblich zulässige Abzweiggeschwindigkeit für das Zweiggleis anzugeben. Für NeiTech-Strecken sind zusätzlich die zulässigen Geschwindigkeiten bei Befahrung mit Neigetechnik in Klammern mit dem Zusatz NT zu ergänzen.

Beispiel: 110 / 60 (NT 125 / 60)

Angaben zum Ausrüstungsstandard

(4) Die Angaben zur Weichenfahrbahn, zu den Schwellen und Ausrüstungskomponenten der Weiche sind entsprechend den Vorgaben der Richtlinie „Bauarten des Oberbaus Gleise und Weichen, Ausrüstungsstandard Weichen“, Technische Mitteilung lfd. Nr. RO 12/2002 festzulegen. Nicht zutreffende Felder sind in der Tabelle zu streichen bzw. zu beschaffende Ausrüstungskomponenten sind entsprechend den geschwindigkeitsabhängigen Vorgaben zu übernehmen.

Hinweise auf konstruktive Besonderheiten

(5) Bei Weichen, die konstruktive Besonderheiten (z. B. DKW mit getrennten Antrieben, gekürzte Zungen, vertauschte Zungenvorrichtung, FAKOP oder Hemmschuhauswurfvorrichtung innerhalb einer Weiche) aufweisen, sind diese Bezeichnungen eindeutig und sichtbar auf der Weichenskizze zu vermerken.

Lieferung zusätzlicher Weichenschwellen bei Gleisabschnitten mit $l \leq 40$ m

(6) Für Gleisabschnitte $l \leq 40$ m zwischen erster und letzter Weichenschwelle zweier benachbarter Weichen ist die Art der benötigten zusätzlichen Weichenschwellen mit senkrechter Schienenstellung anzugeben. Die benötigte Schwellenanzahl ist bei der Bauplanung oder bei der Erstellung der Verlegepläne zu ermitteln.

Angaben zu Schwellen im Übergangsbereich zum Gleis mit $l > 40$ m


(7) Bei UIC 60- und S 54-Weichen auf Betonschwellen sind am Weichenanfang und an den Weichenenden in Abhängigkeit von der Lage je 25 Schwellen B90 W 14 K 900-60 oder B90 W 14 K-60 bzw. B90 W 14 K-54 einzubauen, wenn der Abstand zu benachbarten Weichen > 40 m ist.

Der Einbauort ist durch eine parallele Linie zur Gleislinie zu kennzeichnen und mit der Beschriftung 25 x B90 ... zu ergänzen.

(8) Für die Erneuerung der Übergangsbereiche Weiche/Gleis können vormontierte Gleisjoche verwendet werden. Der unterschwellte Bereich eines Joches darf maximal 17,5 m lang sein, die Gesamtlänge des Joches darf maximal 24 m betragen. Überschreitet die Länge des Übergangsbereiches 24 m, so ist der Übergangsbereich in mehrere Joche untergliedern. In diesem Fall kann die Lieferung der Joche mit Fahrschienen oder für den Einbau eines durchgehenden Schienenbandes mit Montageschienen erfolgen.

Vormontierte Gleisjoche

Bild 1: Angaben zu Gleisjochen



Joch 1	Teilbereich TB1	Teilbereich TB2	Teilbereich TB3	Teilbereich TB4	zu bestellendes Schienenband
Stück Schwellen	ESS W 4	ESS W 3			13,30 m Übergangsschiene
Länge Schiene	10,050 m UIC 60	3,25 m S 54			UIC 60/S54
Joch 2	Teilbereich TB1	Teilbereich TB2	Teilbereich TB3	Teilbereich TB4	zu bestellendes Schienenband
Stück Schwellen	ESS W 2	17 x B 90 W14K-60			
Länge Schiene	10,050 m UIC 60	10,2 m UIC 60			20,25 m UIC 60
Joch 3	Teilbereich TB1	Teilbereich TB2	Teilbereich TB3	Teilbereich TB4	zu bestellendes Schienenband
Stück Schwellen	8 x B 90 W14K-60	3 x B 70 W14K-60	15 x B 70 W14K-54	GS	20,4 m Übergangsschiene
Länge Schiene	4,8 m UIC 60	1,8 m UIC 60	9 m S 54	4,8 m S 54	UIC 60/S54

Joch 4	Teilbereich TB1	Teilbereich TB2	Teilbereich TB3	Teilbereich TB4	zu bestellendes Schienenband
Stück Schwellen	25x B 90 W14K-60	GS			18,25 m UIC 60
Länge Schiene	15,0 m UIC 60	3,25 m S 54			

Für vormontierte Gleisjoche mit Fahrschienen sind die Schienen vom Auftraggeber mit einer Schienenbandbestellung gemäß Ril 820.2122 zu beschaffen und an die Montagewerke zu liefern.

Vormontierte Gleisjoche sind mit den in Bild 1 dargestellten Symbolen in der Weichenskizze zu bestellen. Setzt sich das Joch aus unterschiedlichen Schwellen zusammen (z. B. Übergangsschiene UIC 60 / S 54) oder liegen Teilbereiche des Joches auf dem Endschwellensatz (ESS) der Weiche bzw. auf vorhandenen Gleisschwellen (GS), so ist die Gesamtlänge des Joches in Teilbereiche zu untergliedern und die Abfolge der Teilbereiche (TB) im Joch kenntlich zu machen. Die jeweils verwendete Schienenart und -länge und die Schwellenart sind für das vormontierte Gleisjoch und die ggf. vorhandenen Teilbereiche in einer Tabelle anzugeben.

Sicherungskappen

(9) Für Weichen mit Holzschwellen ist die Anzahl der erforderlichen Sicherungskappen im Weichen- und Anschlussbereich gemäß DS 820 01 42 (zukünftig Ril 820.20xx) in der Tabelle der Weichenskizze anzugeben.

Bei Weichen auf Betonschwellen sind keine Sicherungskappen einzubauen.

Signaltechnische Angaben

(10) Die Ausführung und Anordnung der Stell- und Überwachungssysteme sind in der grafischen Darstellung der zu liefernden Weichen einzutragen. Es sind die Symbole gemäß Ril 823.0700A01 Abschnitt 3 zu verwenden.

Angaben für Schienenauszüge

(11) Im Tabellenteil der Weichenskizze für Schienenauszüge sind die im Vordruck Ril 823.0700V02 angeführten Angaben vom Auftraggeber und von den DB Fachbereichen Oberbau und Brückenbau einzutragen.

Angaben zur Bemessung und Einstellung

(12) Für die Bemessung und Einstellung der Schienenauszüge werden folgende Angaben vom Fachbereich Brückenbau zu den Überbauten benötigt:

- Ausgleichslänge AL der beweglichen Überbauten bzw. der längsbeweglichen Schienen

- Verschiebung des Überbaues $\pm \Delta l_{AB}$ durch Anfahren und Bremsen je Lastrichtung
- Verkürzung des Überbaues Δl_{KS} durch Kriechen und Schwinden bei Überbauten aus Beton
- Ausdehnungskoeffizient α_{Br} des Überbaues
- Maximale Längenänderung $\Delta L_Ü$ an der beweglichen Brückenfuge ($\Delta L_Ü = \alpha_{Br} \times \Delta T_{Br} \times AL + 2\ \Delta l_{AB} + \Delta l_{KS}$)
- Art des Überbaues (massive Brücke und Überbauten mit einbetonierten Walzträger (Beton) oder stählerne Überbauten und Stahlverbundbrücken (Stahl))
- Oberbauart auf dem Überbau (Brückenbalken, Schotter, Feste Fahrbahn)
- Angaben zur Schienenbefestigung auf dem Überbau (Spannklemme / Klemmplatte)
- Schwellenteilung auf Überbauten mit Brückenschwellen

Für die anschließenden Dammbereiche sind folgende Angaben zu machen:

- Oberbauart auf dem Widerlager (Schotter, Feste Fahrbahn)

❑

1 Kennziffern der Instandhaltungsstandorte

Niederlassung	Kenn ziffer	Instandhaltungs-standort	**Kenn-ziffer**
Ost in Berlin	10	Berlin	**11**
		Cottbus	**12**
		Magdeburg	**13**
		Pasewalk	**14**
		Schwerin	**15**
OE Regionalnetze Ost			**19**
Nord in Hannover	20	Hannover	**21**
		Bremen	**22**
		Hamburg	**23**
		Kiel	**24**
		Osnabrück	**25**
OE Regionalnetze Nord			**29**
West in Duisburg	30	Duisburg	**31**
		Düsseldorf	**32**
		Hagen	**33**
		Hamm	**34**
		Köln	**35**
OE Regionalnetze West			**39**
Südost in Leipzig	40	Leipzig	**41**
		Dresden	**42**
		Erfurt	**43**
		Halle	**44**
		Zwickau	**45**
		Magdeburg	**46**
OE Regionalnetze Südost			**49**

Mitte in Frankfurt	50	Frankfurt	**51**
		Kassel	**52**
		Koblenz	**53**
		Mainz	**54**
OE Regionalnetze Mitte			**59**
Süd-West in Karlsruhe	60	Karlsruhe	**61**
		Freiburg	**62**
		Saarbrücken	**63**
		Stuttgart	**64**
		Ulm	**65**
OE Regionalnetze Süd-West			**69**
Süd in München	70	München	**71**
		Augsburg	**72**
		Nürnberg	**73**
		Regensburg	**74**
		Würzburg	**75**
OE Regionalnetze Süd			**79**


Tabelle 1: Kennziffer der Instandhaltungsbezirke

2 Nummerkreise der Organisationseinheiten


Organisationseinheit	Weichen	Schienenauszüge
DB Netz (Fern- und Ballungsnetz)	0001 - 0899	0900 – 0999
DB Netz Regionalnetze	1001 - 1899	1900 – 1999
DB Netz Zugbildungs-/ -behandlungsanlagen	2001 – 2899	2900 – 2999
DB ProjektBau	3001 – 3899	3900 – 3999
Andere (Vergabe durch NL)	4001 – 4899	4900 – 4999

Tabelle 2: Nummerkreise für Weichenskizzen


3 Darstellung der Stelleinrichtungen für Weichen und Kreuzungen




Ortsgestellte Weiche mit Stellbock, Riegel




Ortsgestellte Weiche mit Stellbock, Gestängeübertragung zum Mittelverschluss auf der Seite des Stellbock



Ortsgestellte Weiche mit Stellbock, Gestängeübertragung zum Mittelverschluss auf der dem Stellbock gegenüberliegenden Seite



Ortsgestellte Weiche mit Stellbock, Gestängeübertragung zum Mittelverschluss auf der Seite des Stellbocks
Zungenmittelprüferübertragung auf der dem Stellbock gegenüberliegenden Seite



Rückfallweiche mit Zungenprüfkontakt
Grundstellung gerades Gleis



Ferngestellte Weiche, mechanischer Weichenantrieb



Ferngestellte Weiche, mechanischer Weichenantrieb, Weichensignal



Ferngestellte Weiche, mechanischer Weichenantrieb, Gestängeübertragung zum Mittelverschluss auf der Seite des Antriebs



Ferngestellte Weiche, mechanischer Weichenantrieb, Gestängeübertragung zum Mittelverschluss auf der Seite des Antriebs, Weichensignal



Ferngestellte Weiche, mechanischer Weichenantrieb, Gestängeübertragung zum Mittelverschluss auf der dem Antrieb gegenüberliegenden Seite



Ferngestellte Weiche, mechanischer Weichenantrieb, Gestängeübertragung zum Mittelverschluss auf der dem Antrieb gegenüberliegenden Seite, Weichensignal



Ferngestellte Weiche, mechanischer Weichenantrieb, Gestängeübertragung zum Mittelverschluss auf der Seite des Antriebs, Zungenmittelprüferübertragung auf der dem Antrieb gegenüberliegenden Seite




Ferngestellte Weiche, elektrischer Weichenantrieb, Gestängeübertragung zum Mittelverschluss und 1 Zungenprüfkontakt auf der Seite des Antriebs



Ferngestellte Weiche, elektrischer Weichenantrieb, hydraulische Kraftübertragung zum Mittelverschluss und 1 Zungenprüfkontakt auf der Seite des Antriebs




Ferngestellte Weiche, elektrischer Weichenantrieb, 1 Zungenprüfkontakt auf der Seite des Antriebs, Gestängeübertragung zum Mittelverschluss auf der dem Antrieb gegenüberliegenden Seite, Weichensignal



Ferngestellte Weiche, elektrischer Weichenantrieb, 1 Zungenprüfkontakt auf der Seite des Antriebs, Gestängeübertragung zum Mittelverschluss auf der dem Antrieb gegenüberliegenden Seite, bewegliche Herzstückspitze mit Gestängeübertragung zum Mittelverschluss, Weichensignale



Ferngestellte Weiche, 2 elektrische Weichenantriebe und 2 Zungenprüfkontakte



Ferngestellte Weiche, elektrischer Weichenantrieb, Gestängeübertragung zum Mittelverschluss auf der dem Antrieb gegenüberliegenden Seite und 3 Zungenprüfkontakte auf der Seite des Antriebs, bewegliche Herzstückspitze mit Gestängeübertragung zum Mittelverschluss, Weichensignale



Ferngestellte Weiche, 3 elektrische Weichenantriebe und 3 Zungenprüfkontakte an der Zungenvorrichtung, 2 elektrische Weichenantriebe und Niederhalter an der beweglichen Herzstückspitze, Weichensignale



Stellbock




mechanischer Weichenantrieb



elektrischer Weichenantrieb



Grundstellung der Weiche



mechanischer Zungenmittelprüfer




mechanischer Riegel




elektrischer Zungenprüfkontakt



Weichensignal




mechanische Gestängeübertragung zum Mittelverschluss




hydraulische Mittelverschlussübertragung




Niederhalter an der beweglichen Herzstückspitze




Einfache Kreuzungsweiche, Zungenpaar a mechanisch ferngestellt, Zungenpaar b ortsbedient mit Riegelhandschloss




Einfache Kreuzungsweiche, beide Zungenpaare mechanisch ferngestellt mit Zungenprüfer, Weichensignal




Einfache Kreuzungsweiche, beide Zungenpaare elektrisch ferngestellt , Weichensignal




Doppelte Kreuzungsweiche, alle Zungenpaare mechanisch ferngestellt mit Zungenprüfer, Weichensignal



Doppelte Kreuzungsweiche, alle Zungenpaare mechanisch ferngestellt, Zungenpaare b und d mit Zungenprüfer, Weichensignal



Doppelte Kreuzungsweiche, außenliegende Zungenpaare elektrisch ferngestellt, Gestängeübertragung zum Mittelverschluss auf der Seite des Weichenantriebs



Kreuzung mit beweglichen Herzstückspitzen, elektrisch ferngestellt



Stellbock



mechanischer Weichenantrieb



elektrischer Weichenantrieb



Weichensignal



mechanische Gestängeübertragung zum Mittelverschluss

Pr — mechanischer Zungenprüfer

RH — Riegelhandschloss

❑


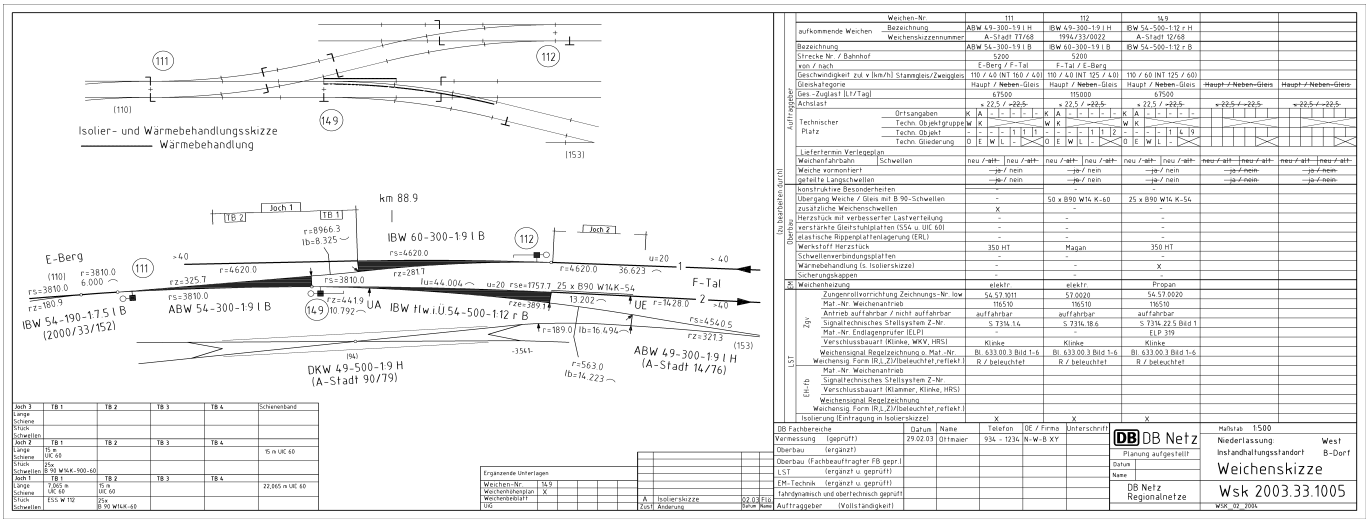


Bild 1: Vordruck der Weichenskizze

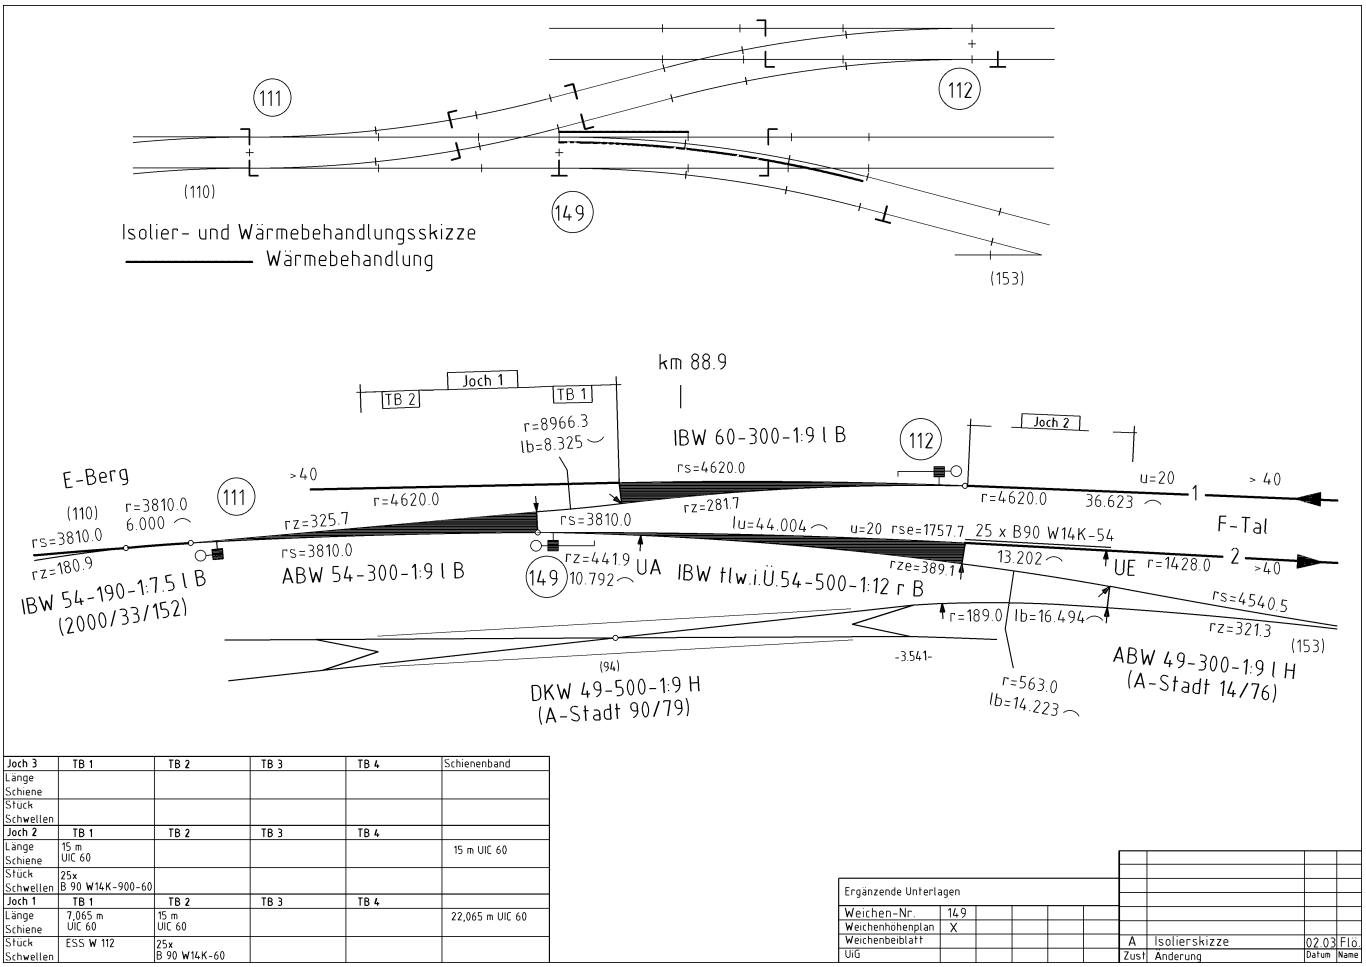


Joch 3	TB 1	TB 2	TB 3	TB 4	Schienenband
Länge Schiene					
Stück Schwellen					
Joch 2	**TB 1**	**TB 2**	**TB 3**	**TB 4**	
Länge Schiene	15 m UIC 60				15 m UIC 60
Stück Schwellen	25x B 90 W14K-900-60				
Joch 1	**TB 1**	**TB 2**	**TB 3**	**TB 4**	
Länge Schiene	7,065 m UIC 60	15 m UIC 60			22,065 m UIC 60
Stück Schwellen	ESS W 112	25x B 90 W14K-60			

Ergänzende Unterlagen									
Weichen-Nr.	149								
Weichenhöhenplan	X								
Weichenbeiblatt									
UiG									

A	Isolierskizze	02.03	Flo	
Zust	Änderung	Datum	Name	

Bild 2: Detailansicht Weichendarstellung

| (zu bearbeiten durch) | | |

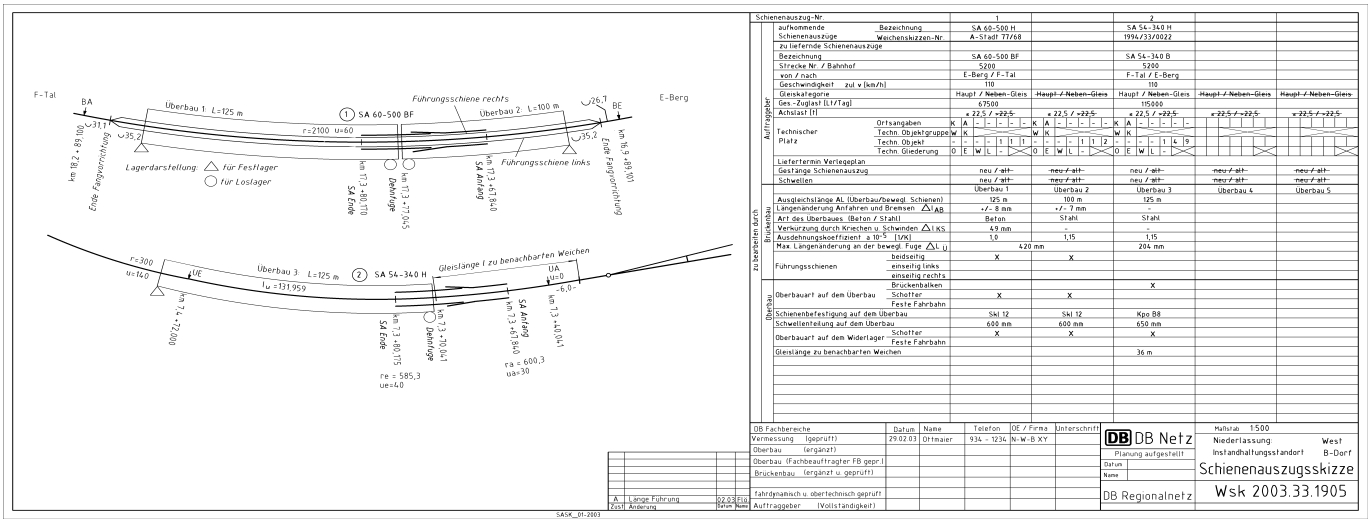

Schienenauszug-Nr		1		2		
aufkommende Schienenauszüge	Bezeichnung	SA 60-500 H		SA 54-340 H		
	Weichenskizzen-Nr	A-Stadt 77/68		1994/33V0022		
zu liefernde Schienenauszüge						
Bezeichnung		SA 60-500 BF		SA 54-340 B		
Strecke Nr. / Bahnhof		5200		5200		
von / nach		E-Berg / F-Tal		F-Tal / E-Berg		
Geschwindigkeit zul. v [km/h]		110		110		
Gleiskategorie		Haupt / Neben-Gleis	Haupt / Neben-Gleis	Haupt / Neben-Gleis	~~Haupt / Neben-Gleis~~	~~Haupt / Neben-Gleis~~
Ges.-Zuglast [Lt/Tag]		67500		115000		
Achslast [t]		≤ 22,5 / ~~>22,5~~	≤ 22,5 / ~~>22,5~~	≤ 22,5 / ~~>22,5~~	~~≤ 22,5 / >22,5~~	~~≤ 22,5 / >22,5~~
Technischer Platz	Ortsangaben	K A - - - - - -	K A - - - - - -	K A - - - - - -		
	Techn. Objektgruppe	W K	W K	W K		
	Techn. Objekt	- - - 1 1 1	- - - 1 1 2	- - - 1 4 9		
	Techn. Gliederung	0 E W L - -	0 E W L - -	0 E W L - -		
Liefertermin Verlegeplan						
Gestänge Schienenauszug		neu / ~~alt~~	~~neu~~ / ~~alt~~	neu / ~~alt~~	~~neu~~ / ~~alt~~	~~neu~~ / ~~alt~~
Schwellen		neu / ~~alt~~	~~neu~~ / ~~alt~~	neu / ~~alt~~	~~neu~~ / ~~alt~~	~~neu~~ / ~~alt~~
		Überbau 1	Überbau 2	Überbau 3	Überbau 4	Überbau 5
Ausgleichslänge AL (Überbau/beweql. Schienen)		125 m	100 m	125 m		
Längenänderung Anfahren und Bremsen: Δl_{AB}		+/- 8 mm	+/- 7 mm	-		
Art des Überbaues (Beton / Stahl)		Beton	Stahl	Stahl		
Verkürzung durch Kriechen u. Schwinden Δl_{KS}		4,9 mm	-	-		
Ausdehnungskoeffizient α 10^{-5} [1/K]		1,0	1,15	1,15		
Max. Längenänderung an der beweql. Fuge Δl_u		420 mm		204 mm		
Führungsschienen	beidseitig	X	X			
	einseitig links					
	einseitig rechts					
Oberbauart auf dem Überbau	Brückenbalken			X		
	Schotter	X	X			
	Feste Fahrbahn					
Schienenbefestigung auf dem Überbau		Skl 12	Skl 12	Kpo B8		
Schwellenteilung auf dem Überbau		600 mm	600 mm	650 mm		
Oberbauart auf dem Widerlager	Schotter	X	X	X		
	Feste Fahrbahn					
Gleislänge zu benachbarten Weichen				36 m		

OB Fachbereiche	Datum	Name	Telefon	OE / Firma	Unterschrift
Vermessung (geprüft)	29.02.03	Ottmaier	934 – 1234	N-W-B XY	
Oberbau (ergänzt)					
Oberbau (Fachbeauftragter FB gepr.)					
Brückenbau (ergänzt u. geprüft)					
fahrdynamisch u. obertechnisch geprüft					
Auftraggeber (Vollständigkeit)					

DB DB Netz
Niederlassung: West
Instandhaltungsstandort: B-Dorf
Planung aufgestellt
Datum
Name
DB Regionalnetz
Maßstab 1:500
Schienenauszugsskizze
Wsk 2003.33.1905

A	Länge Führung	02.03	Flö
Zust	Änderung	Datum	Name

SASK_01-2003

Bild 1: Vordruck der Weichenskizze für Schienenauszüge

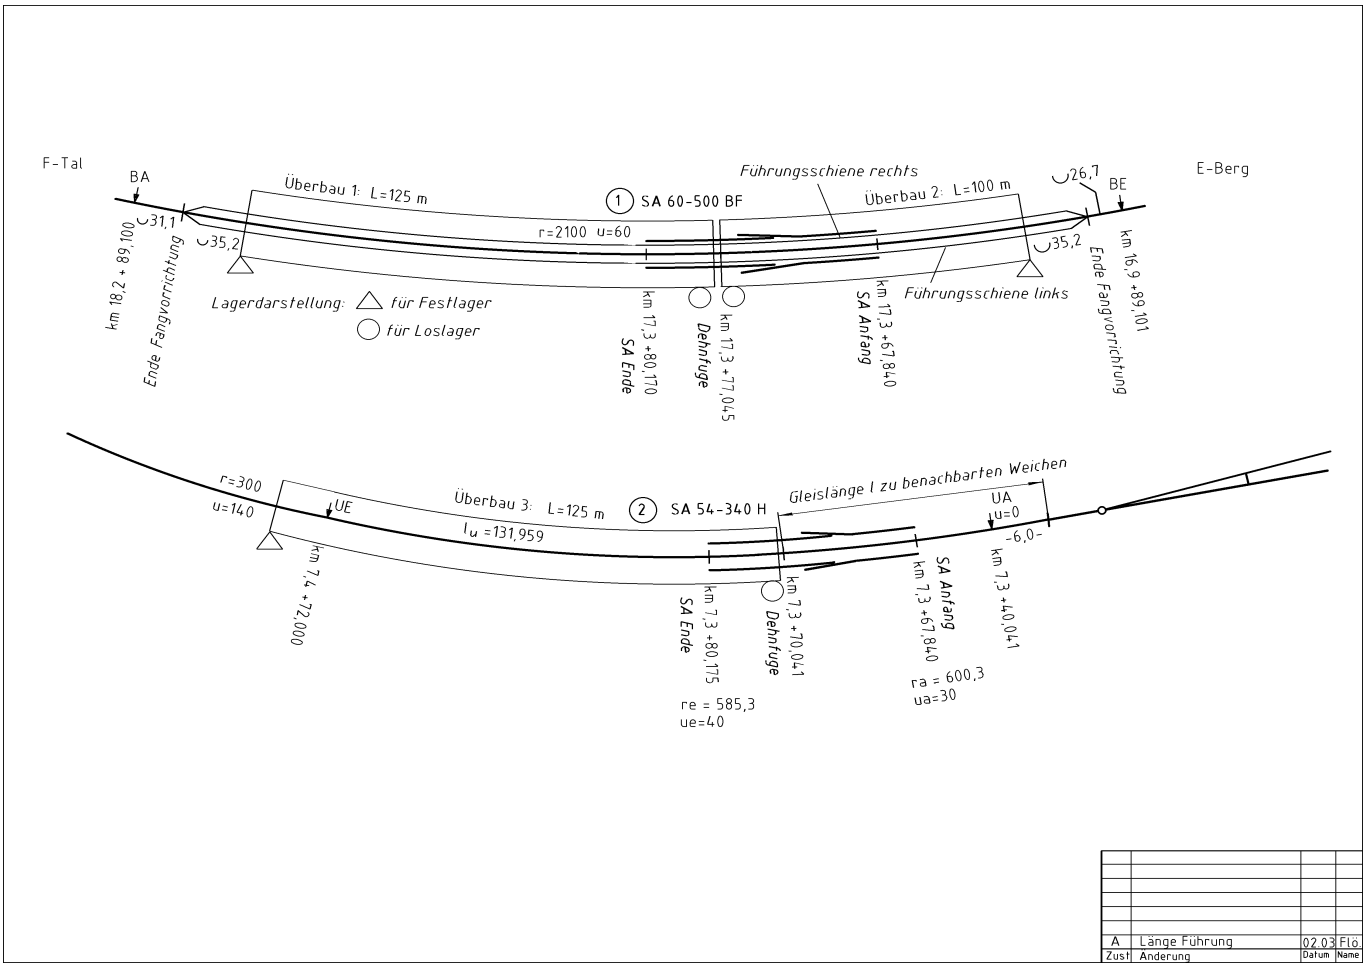


Bild 2: Detailansicht Darstellung der Schienenauszüge

| | | |

1 Allgemeines

Zweck

(1) Die Richtlinie regelt den Inhalt und die Darstellung der Verlegepläne auf der Grundlage der freigegebenen Weichenskizzen als vertragliche Grundlage für die Lieferung von Weichen, Kreuzungen und Schienenauszügen und die Montage und Verlegung der Weichen einschließlich der Teile der LST-Außenanlagen und der Oberbaumaterialien im angrenzenden Bereich.

Anwendungsbereich

(2) Verlegepläne werden für alle Weichen der DB Netz AG erstellt. Sie sind Bestellgrundlage für Lieferung und Einbau der Weiche und Teil der Bestandsunterlagen der Niederlassung.

Mitgeltende Richtlinien

(3) Die Verlegepläne sind auf der Grundlage des gültigen Regelwerks zu erstellen:

- Ril 823.0700 (Oberbauarbeiten planen, Bestellen von Weichen, Kreuzungen und Schienenauszugsvorrichtungen)
- Ril 820.2010 (Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen)
- Ril 820.2040 (Oberbau auf Brücken)

Grundsätze

(4) Alle Angaben des Bestellers auf der Weichenskizze werden übernommen. Sollten Abweichungen gegenüber der Bestellung auftreten, sind diese in fortgeschriebenen Weichenskizzen (Zusatz a,b usw.) zu dokumentieren.

2 Grundlagen der Verlegepläne

Regelzeichnungen

(1) Ein Verlegeplan umfasst eine Weiche/Kreuzung oder Schienenauszug mit den zum Lieferumfang gehörenden Abweichungen vom

- Regellageplan (z.B. low.01.XXXX; low 54.01.XXXX),
- Großteillageplänen (z.B. low 02.XXXX; low 54.02.XXXX – Zungenvorrichtungsbereiche-; low 03.XXXX; low 54.03.XXX – Herzstückbereiche-)
- Musterlageplänen für Bogenweichen (z.B. low 92.XXXX)
- Endschwellensatz (z.B. low 97.XXXX)

- Anordnungszeichnung der Lagerung der Weichenantriebe und Zungenprüfer sowie Übertragungsteile für den Antrieb von Mittelverschlüssen S XXX

Sonderentwürfe

(2) Sonderentwürfe sind Standardpläne für Gleisverbindungen und Anschlüsse, die wiederkehrende Situationen darstellen. Sie werden im Zg. –Nr. Bereich low 70.XX.XXX bis low 89.XX.XXX bzw. low 54.60.XX.XXX bis low 54.89.XX.XXX archiviert.

Die Erstellung neuer Sonderentwürfe umfasst zusätzlich Stücklisten für die vom Regellageplan abweichende Schienenbefestigung und Schwellenkoordinaten.

Auf den Verlegeplänen der dargestellten Anschlüsse und Gleisverbindungen sind die Zeichnungsnummern der Sonderentwürfe anzugeben (Anhang 01 Bild 1).

Sonderkonstruktionen

(3) Sonderkonstruktionen stellen eine in der Regel einmalig an die Örtlichkeit angepasste Konstruktion dar, die neue oder veränderte Großteile erfordern. Diese sind UiG-pflichtig und benötigen den nach Ril 823.0700 festgelegten Planungsvorlauf.

Einzelteilzeichnungen, Schwellenkoordinaten und Stücklisten gehören zur Dokumentation.

3 Inhalt und Darstellung

Inhalt des Verlegeplanes

(1) Pro Verlegeplan soll eine Weiche / Kreuzung / Schienenauszug dargestellt werden. Ausnahmen sind in begründeten Fällen zulässig (z.B. Doppelte Gleisverbindungen o. ä.).

Angrenzende Weichen werden für die eindeutige Bestimmung der Lage der Weiche zur Nachbarweiche teilweise und in Strich-Strich-Linien dargestellt (Anhang 01 Bild 2). Diese Bereiche gehören nicht zum Lieferumfang der im Verlegeplan dargestellten Weiche.

Darstellung

(2) Auf einem Verlegeplan werden dargestellt (Anhang 01 Bilder 3,4 und 5):

- Weichen und Kreuzungen in der der Weichenskizze entsprechenden Lage
- Absteckbild der Grundform der Weiche (1)
- Beginn und Ende von Bögen bzw. Übergangsbögen (2)
- Weichenfahrbahn in Form des Fahrkantenbildes (3)

- Schienenstöße (4)
- Bauteile für den Wanderschutz (5)
- Längen der Fahrbahnteile (6)
- Schwellenachsen (7)
- Schwellennummern (8)
- Richtung der Verschiebung bei verschobenen Schwellen (9)
- Seite der Kürzung bei verkürzten Schwellen (10)
- Sonderrippenplatten einschließlich Bezeichnung (11)
- Anordnung von verlängerten Rippenplatten für die Aufnahme von Lagereisen (12)
- Anordnung von Zungenrollvorrichtungen (13)
- Isolierstöße (14)
- Übergangsschienen und Anschlußschienen (ggf. unmaßstäblich) (15)
- zusätzlich bestellte Gleisschwellen (ggf. nur teilweise mit textlichem Hinweis auf Stückzahl und Schwellenteilung) (16)
- Lage des Stellsystemes (17)
- Lage der Zungenprüfer (18)
- Lage des Weichenantriebes und -signales (19)
- Abrückmaße des Stammgleises von der Geraden (in Bogenweichen) (20)
- Korrekturwerte der Backenschienenverbiegung bei FAKOP-Zungenvorrichtungen an jeder Schwelle (bei Bogenweichen unter Berücksichtigung der Verbiegung)

(3) Als Text enthält der Verlegeplan folgende Angaben: **Texte**

- Weichengrundform
- Weichennummer
- Zeichnungsnummer und Ausgabe des Lageplanes der Grundform
- Zeichnungsnummer der verwendeten Sonderlagepläne
- Hinweis auf den verwendeten Endschwellensatz (Anhang 01 Bild 6)

- Tabelle mit auflaufenden Maßen der Schwellenteilung in Stamm- und Zweiggleis (Anhang 01 Bild 7)
- Tabelle über Längenänderung bzw. Verschiebung von Schwellen (Anhang 01 Bild 8)
- Angaben zu speziellem Kleineisen (Montagelaschen, Klemmplatten für Isolierstöße usw.)

Maßstab

(4) Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge, Anschlüsse und Verbindungen sind in der Regel im Maßstab 1:100 darzustellen, Absteckbilder im Maßstab 1:500

Linienarten- und -breiten

(5) Folgende Linienarten und –breiten sind zu verwenden:

- Schienen - Linie 0,5 mm
- Schwellen - Linie 0.35 mm
- Maßlinien - Linie 0.25 mm
- Zubehör - Linie 0.25 mm

Maße

(6) Schienen und Großteile erhalten Längenmaße. Bei von der Regellänge abweichenden Maßen sind diese mit einem Kasten einzurahmen ; Schrifthöhe 2,5 mm

Maße der Tangenten sowie Abrückmaße bei Bogenweichen ;

Schrifthöhe 2,5 mm

Symbole

(7) Folgende Ausrüstungskomponenten werden als Symbol dargestellt (Anhang 01 Bild 9):

- vom Regellageplan abweichende Schienenlängen
- verlängerte Rippenplatten (für Montage der Lager- und Übertragungsteile)
- Weichenantrieb
- Zungenprüfkontakt bzw. Riegel
- Weichensignal
- Übertragungsgestänge zum Mittelverschluss
- Zungenrollvorrichtungen

4 Regeln für die Bearbeitung der Verlegepläne

(1) Schwellen **Schwellen**

- Die Bezeichnung der Schwellen erfolgt grundsätzlich auf der vom Weichenanfang gesehen linken Seite. Muss bei der Darstellung davon abgewichen werden, sind die Schwellennummern mit einem * zu versehen. Betonschwellen mit Schienebefestigung KS erhalten das Präfix „b“, Betonschwellen mit Schienenbefestigung W „w“
- Schwellen mit Stromschienenträgern für die S-Bahnen Berlin und Hamburg sind nach Zeichnung low 54.10.0024 auszuführen und erhalten den Zusatz Sb (Schienenbefestigung KS) bzw. Sw (Schienenbefestigung W)
- Werden Regelschwellen verändert, erhalten sie die Zusatzbezeichnung „a“, „b“ usw. Die Längenänderung ist in einer Tabelle einzutragen (Anhang 01 Bild 8)
- Bei Verschiebung von Schwellen quer zur Gleisachse ist die Richtung der Verschiebung mit einem Pfeil zu kennzeichnen. Die Länge der Verschiebung ist in der Tabelle der veränderten Schwellen einzutragen.

(2) Rippenplatten werden nur benannt, wenn sie vom Regellageplan abweichen (z.B. Rippenplatten mit Zungenrollvorrichtungen, Stützbockrippenplatten). Werden Rippenplatten örtlich montiert, werden sie angekreuzt und mit einem entsprechenden Vermerk auf dem Verlegeplan versehen. Die gleiche Verfahrensweise gilt, wenn Rippenplatten bei der Auflage im Weichenwerk montiert werden. **Rippenplatten**

(3) Zur Begrenzung der Schwellenlänge bei Gleisverbindungen werden die Regelschwellen einseitig gekürzt. Zur Sicherung der Spurweite im Verbindungsgleis erfolgt die Kürzung in Abhängigkeit der Abzweigrichtung links bzw. rechts. Die verkürzten Schwellen werden über eine zusätzliche Mittelschiene aus Schienenprofil S 54 verbunden. Die Kürzung der Schwellen beträgt in der Regel 900 mm für R bzw. L – Schwellen und 1600 mm für Ra bzw. La – Schwellen. Die Koordinaten der Regelschwellen werden um den Strang 5 bzw. 6 ergänzt (mittig zu Strang 1 und 2 bzw. 3 und 4) und soweit verschoben, dass der Überstand 325 mm zur Mitte Mittelschiene beträgt. Schwel- **Geteilte Schwellen mit Mittelschienen**

len L und La werden auf der linken Seite gekürzt. Schwellen R und Ra werden rechts gekürzt (Anhang 01 Bild 10).

Abweichungen können in Einzelfällen möglich sein, wobei der Abstand der Schwellenenden 20 mm bzw. 100 mm betragen soll.

Gleisverbindungen bei denen die Schienenform wechselt, erfordern einen Höhenausgleich der Mittelschienenbefestigung. Angaben zur Schienenbefestigung sind auf dem Verlegeplan zu vermerken. Eine Gleisverbindung UIC 60/ S 54 erfordert eine KS-Befestigung der Mittelschiene mit SRp 1b auf den Schwellen der Weiche UIC 60. Alle übrigen Befestigungen erhalten W-Befestigung.

Kürzung und Verschiebung von Schwellen bei Anschlüssen

(4) Langschwellen sollen vermieden werden. Dazu können Regelschwellen gekürzt und verschoben werden. Die Kürzung bzw. Verschiebung erfolgt in 50 mm – Schritten. Schwellen sollen nur soweit gekürzt werden, dass der Überstand von 380 mm von Fahrkante nicht unterschritten wird. In begründeten Ausnahmefällen (direkte Anschlüsse) kann zur Vermeidung von Sonderschwellen der Überstand bei Betonweichenschwellen bis auf 239 mm bei UIC 60 bzw. 224 mm bei S 54 verringert werden. Dafür ist eine Schienenbefestigung KS nach low 10.0021 vorzusehen. Die Befestigung der Schwellenverbindungsplatten ändert sich entsprechend (Lochabstand 495 mm). Der Abstand der Schwellenenden soll 100 mm betragen.

Bei Weichen UIC 60 mit elastischer Rippenplattenlagerung W ist im Bereich der Gleitstuhlplatten ein Schwellenüberstand von min. 370 mm vorzusehen.

Schwellenabstände

(5) Zur Sicherung der Stopfbarkeit ist der Schwellenabstand 500 mm (540 bei Betonschwellen) < a < 700 mm einzuhalten.

Schwellenlängen

(6) Die Schwellenlänge bei Betonweichenschwellen ist auf 4800 mm begrenzt.

Schienenstöße

(7) Schienenstöße sind entsprechend der Ausführung durch Symbole (Anhang 01 Bild 11) zu kennzeichnen, die Bohrungen an den Schienenenden sind zu vermaßen:

Bohrungen an den Schienenenden werden nach folgenden Zeichnungen ausgeführt:

S 49	- loarst 228, loarst 230
S 54	- low 54.22.0001
UIC 60	- low 22.0001

Stöße innerhalb der Weiche werden auf jedem Verlegeplan von links oben nach rechts unten durchgehend nummeriert.

Zur Herstellung einer AS-Schweißung sollen Stöße einen Mindestabstand von 100 mm zur Schwellenkante haben (Ril 824.5010).

(8) Isolierstöße: **Isolierstöße**

Die Ausführung der Isolierstöße ist entsprechend Ril 820.2010 festzulegen. Für die Anordnung von Isolierstößen in Weichen und Kreuzungen gelten die Regelzeichnungen:

- Weichen S 49: Iow 49.92.0001
- Weichen S 54 Iow 54.92.0002
- Weichen UIC 60 Iow 97.0010

Ist die Anordnung von Isolierstößen zwischen Weichengroßteilen unumgänglich, sind Mindestabstände zu den benachbarten Schienenbefestigungen zu berücksichtigen (Anhang 01 Bild 12):

(9) Bei Weichen mit Schienenprofil 60 E2-40 ist zu berücksichtigen, dass **Weichen mit Schienen 60 E2-40**

- Schienen im Bereich der Weichenschwellen hinter WE und in Bereichen bis 40 m zwischen 2 angrenzenden Weichen Weichenschienen 60 E2-40 sind und zum Lieferumfang der Weiche gehören
- Schienenstöße UIC 60 1: 40 geneigt an senkrecht stehende Weichenschienen 60 E2-40 mit besonderem Symbol gekennzeichnet werden (Anhang 01 Bild 11)
- die Stöße entfallen und eine durchgehende Schiene vorgesehen werden kann, wenn die Länge der Fahrschienen des Herzstückbereichs einschließlich Endschwellen nicht die größte Ladelänge überschreitet (Abweichung zum Regellageplan)

(10) Besonderheiten bei Bogenweichen und EKW/DKW 500 **Bogenweichen und EKW/DKW r=500**

Die Abrückmaße beziehen sich bei Bogenweichen auf eine am Weichenanfang angelegte Tangente, bei EKW/DKW auf eine Sehne zwischen den Weichenanfängen. Sie sind in 5 m - Schritten anzugeben. Bei Weichen im Übergangsbogen sind im Zungenvorrichtungsbereich Abrückmaße in 1,5 m - Schritten im Stamm- und Zweig-

gleis beginnend am Zungenvorrichtungsende bzw. Weichenanfang anzugeben.

Bei Außenbogenweichen kann die Tangente um das Abrückmaß am Weichenende nach außen verschoben angegeben werden.

Eine Skizze, in der die Schiene in der Linienbreite 0.5 mm und die Tangente in der Linienbreite 0.25 mm angegeben sind, ist unmittelbar oberhalb bzw. unterhalb der Weiche anzuordnen. (Anhang 01 Bild 13)

Übergangsbogenanfang- und -ende sowie Länge des Übergangsbogens müssen in jedem Fall angegeben werden, auch wenn dieser außerhalb der Weiche liegt.

Abweichende Schwellenanordnung und -teilung gemäß Musterlageplänen (Absatz 2 (1))

ergänzende Angaben

(11) Bei Zwangspunkten (z.B. benachbarte Weichen) sind zusätzliche Abstandsmaße vorzusehen, die eine Vormontage erleichtern.

Schwellen, die nicht rechtwinklig zur Gleisachse liegen und durch die Tabelle der auflaufenden Schwellenabstandsmaße nicht eindeutig in ihrer Lage bestimmt sind, erhalten zusätzliche Angaben zur Schwellenteilung im Verlegeplan.

Lager- und Übertragungsteile LST

(12) Ist bei Weichen in beengter Lage die Anordnung der Lager- und Übertragungsteile nicht nach Regelzeichnung möglich, sind die Abweichungen der LST-Bauteile zu dokumentieren.

In den Fällen, wo zwischen Weichenantrieb und Zungenvorrichtung ein Gleis liegt, sind durchgehende Schwellen zu verwenden bzw. ein Formschluss über Verbindungslaschen zwischen den Schwellen herzustellen.

5 Schriftfeld und ergänzende Angaben

Angaben im Schriftfeld

(1) Folgende Angaben müssen im Schriftfeld enthalten sein:

- Weichennummer
- Weichenskizzennummer
- Regionalbereich
- Netzbezirk
- Einbaustelle
- Prüfender

- Zustand des Verlegeplanes
- Zeichnungsnummer
- Besteller
- Empfänger

Zeichnungsnummer

(2) Die Zeichnungsnummer des Verlegeplanes setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

- Ersteller:
  - Iowit für Weichenwerk Witten
  - W für BWG Werk Brandenburg
  - B für BWG Werk Butzbach:
- Jahr (XX)
- Schlüssel der Regionalbereiche
  (XX; Ril 823.0700A01)
- Weichenskizzen-Nr. (XXXX)
- Blatt – Nr. (01, 02,...)
- Ausgabe (a, b,...)

(Anhang 01 Bild 14)

Skizze zur Schwellenteilung

(3) Über dem Schriftfeld ist eine Skizze für die Zuordnung der Angaben in der Tabelle der Schwellenabstandsmaße darzustellen (Anhang 01 Bild 14).

zul. Geschwindigkeiten und Belastung

(4) Die Angaben der Weichenskizze zur örtlich zulässigen Geschwindigkeit und zur Belastung der Weiche sind auf den Verlegeplan zu übertragen (Anhang 01 Bild 14).

Ausrüstungskomponenten

(5) Über dem Schriftfeld ist eine Tabelle anzuordnen, die alle erforderlichen Informationen über die verwendeten Komponenten, die entsprechende Regelzeichnung und ggf. Technische Anweisung für Einbau und Instandhaltung enthält.

Seitenangriffe für Verschlüsse CKA 12 und Zubehörteile für Bogenweichen sind gesondert aufzuführen.

Zusätzlich ist die Summe der Längen aller zum Lieferumfang gehörenden Schwellen in [m] und die Differenz zum Regellageplan in [m] anzugeben (Anhang 01 Bild 14).

6 Archivierung

Verlegepläne archivieren

(1) Alle Verlegepläne sind im Weichenwerk Witten und in den Regionalbereichen als Bestandsunterlagen zu archivieren. Die Archivierung erfolgt in den Formaten .tif und .dwg.

Schwellenkoordinaten

(2) Schwellenkoordinaten für Regelweichen und Regelendschwellensätzen ESS 0 bis 7 werden durch VTZ 115 im IZ-Plan archiviert.


Die Archivierung der Koordinaten für Sonderentwürfe und Sonderkonstruktionen erfolgt im Zusammenhang mit der Erstellung des Sonderentwurfes bzw. -konstruktion durch das Weichenwerk Witten.

Die Darstellung der Koordinaten ist einheitlich im Format .xls nach Anhang 01 Bild 15 bis Bild 18 auszuführen.

❑

1 Grundlagen der Verlegepläne

Bild 1 Beispiel Sonderentwurf

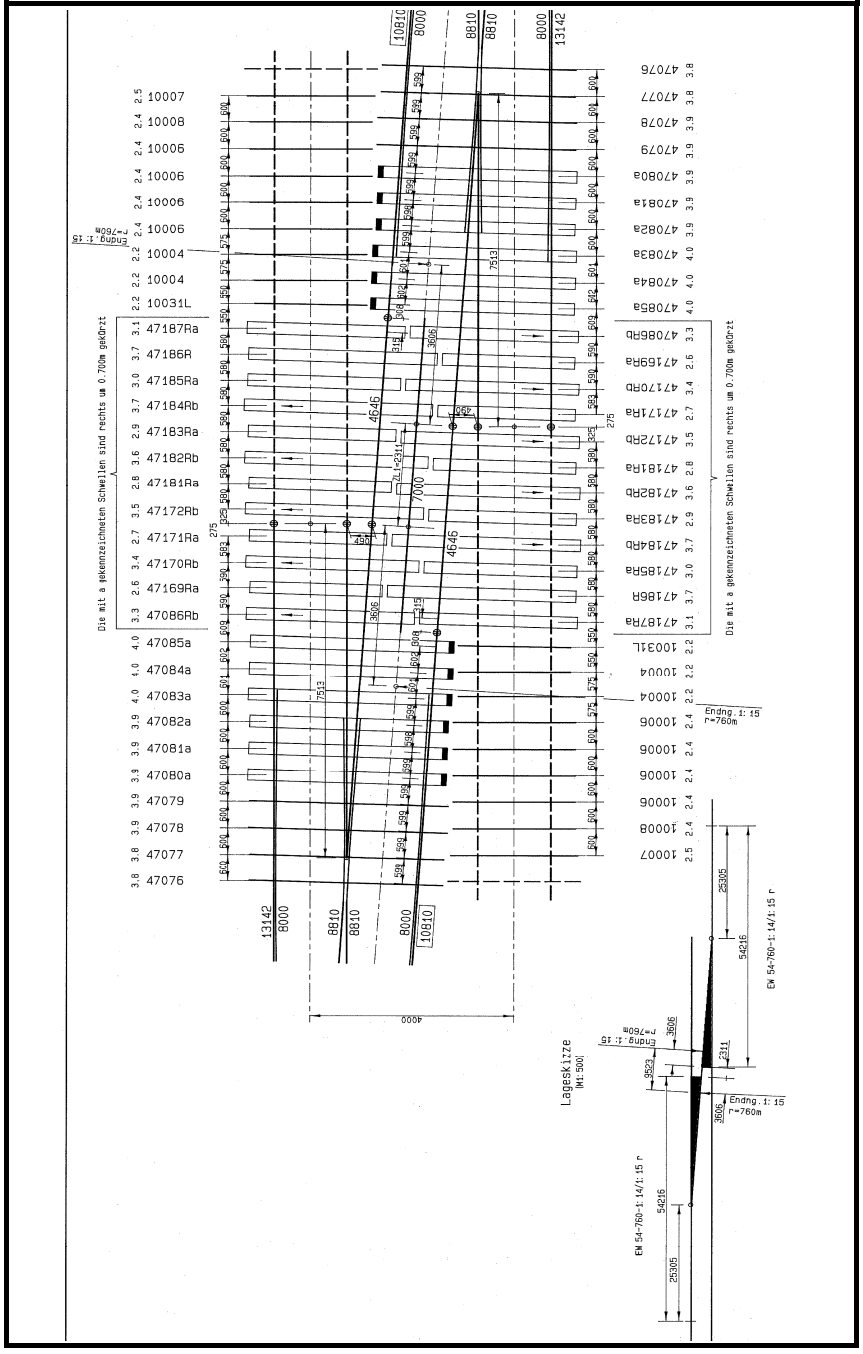

2 Inhalt und Darstellung

Bild 2 Darstellung der angrenzenden Weichen

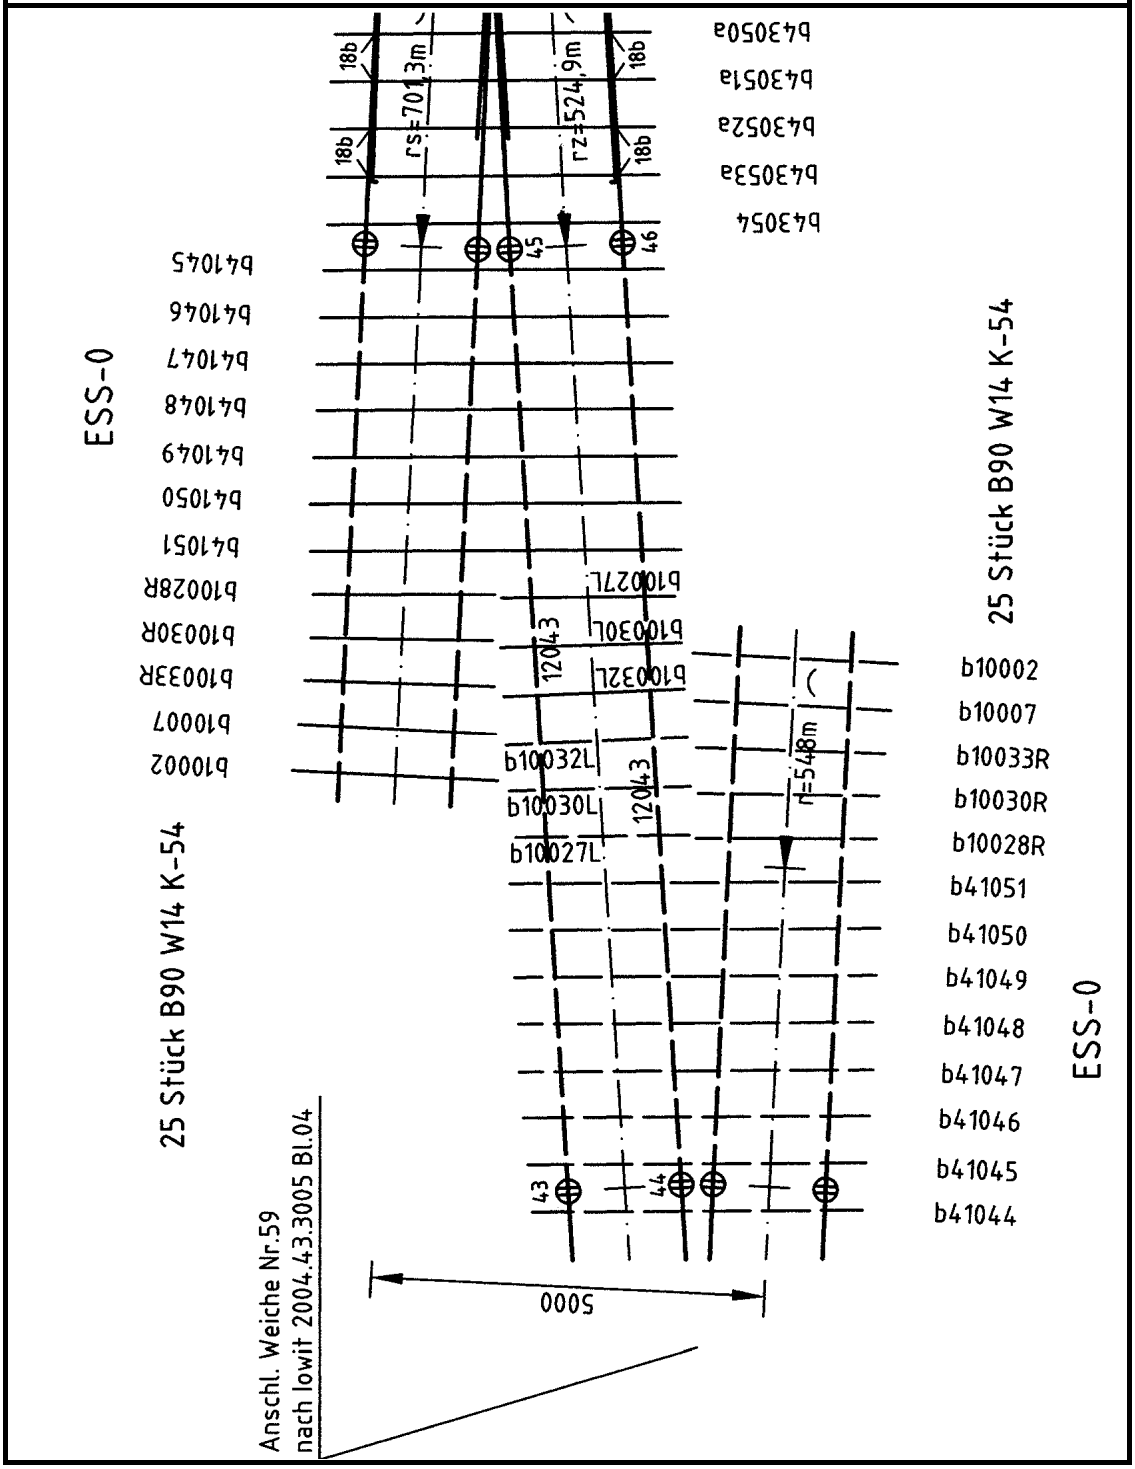


Bild 3 Darstellung der Weiche

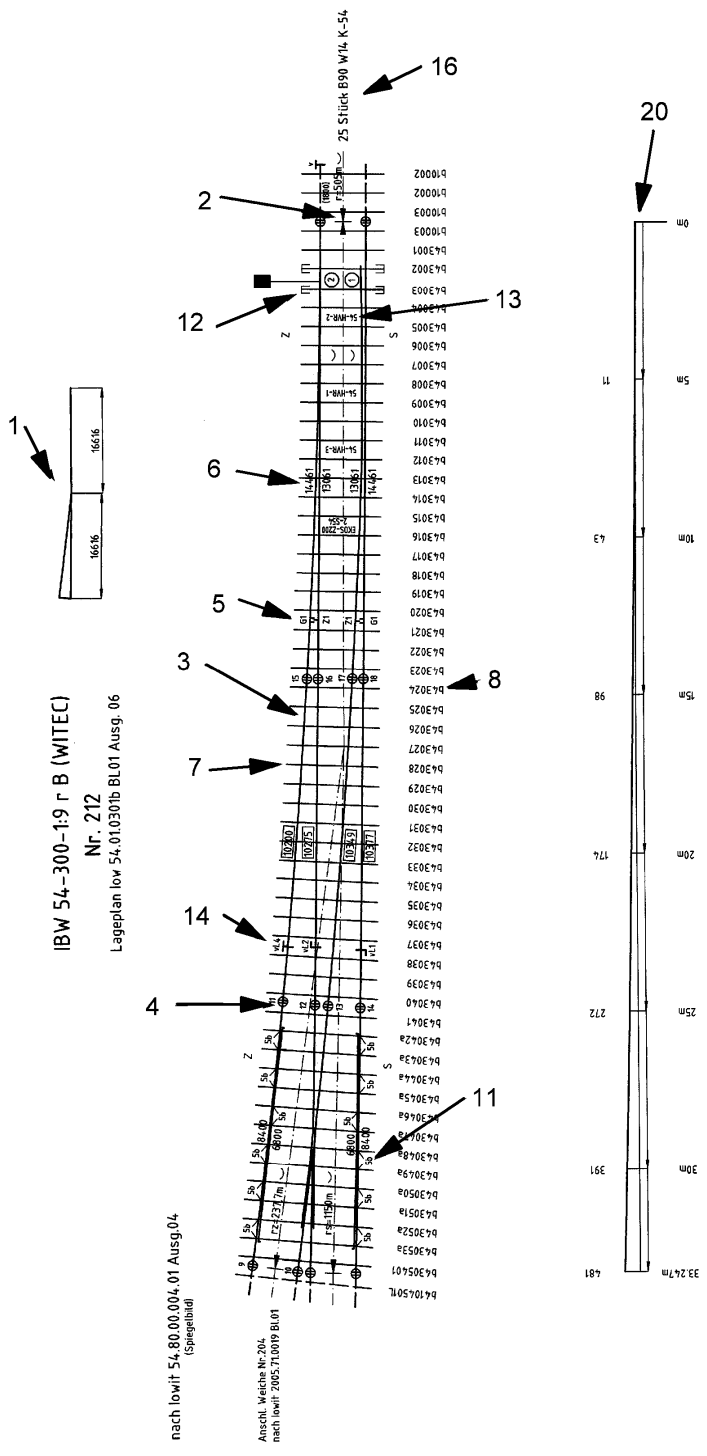


Bild 4 Darstellung LST-Komponenten

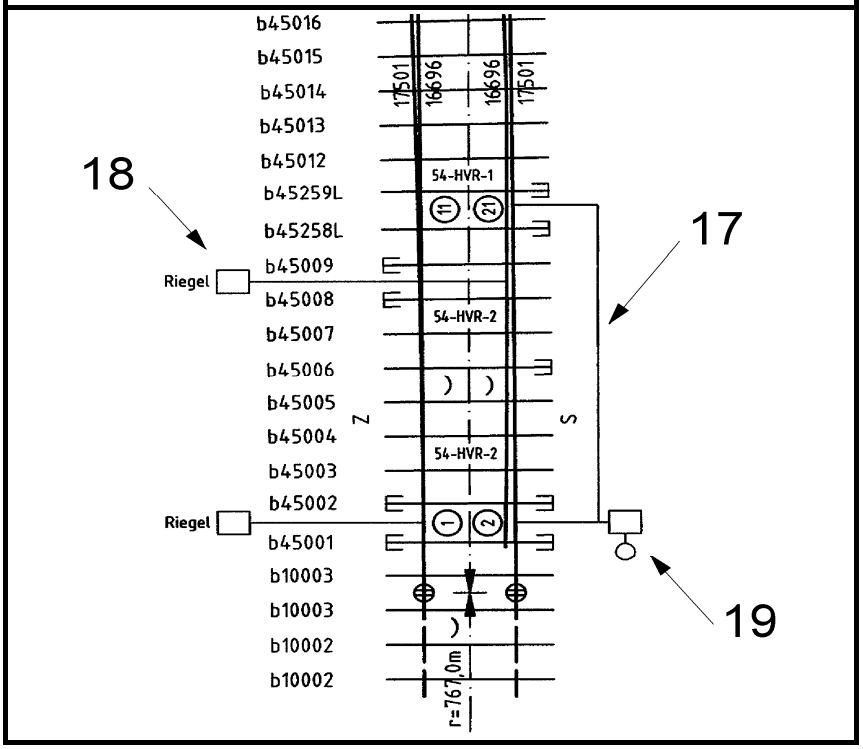


Bild 5 Darstellung von Schwellenkürzung und Schwellen-verschiebung

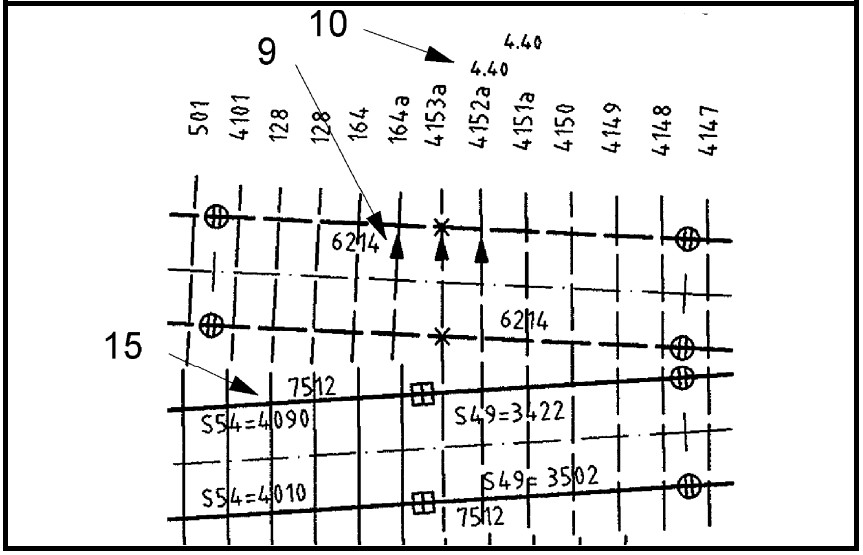


Bild 6 Texte (Beispiel)

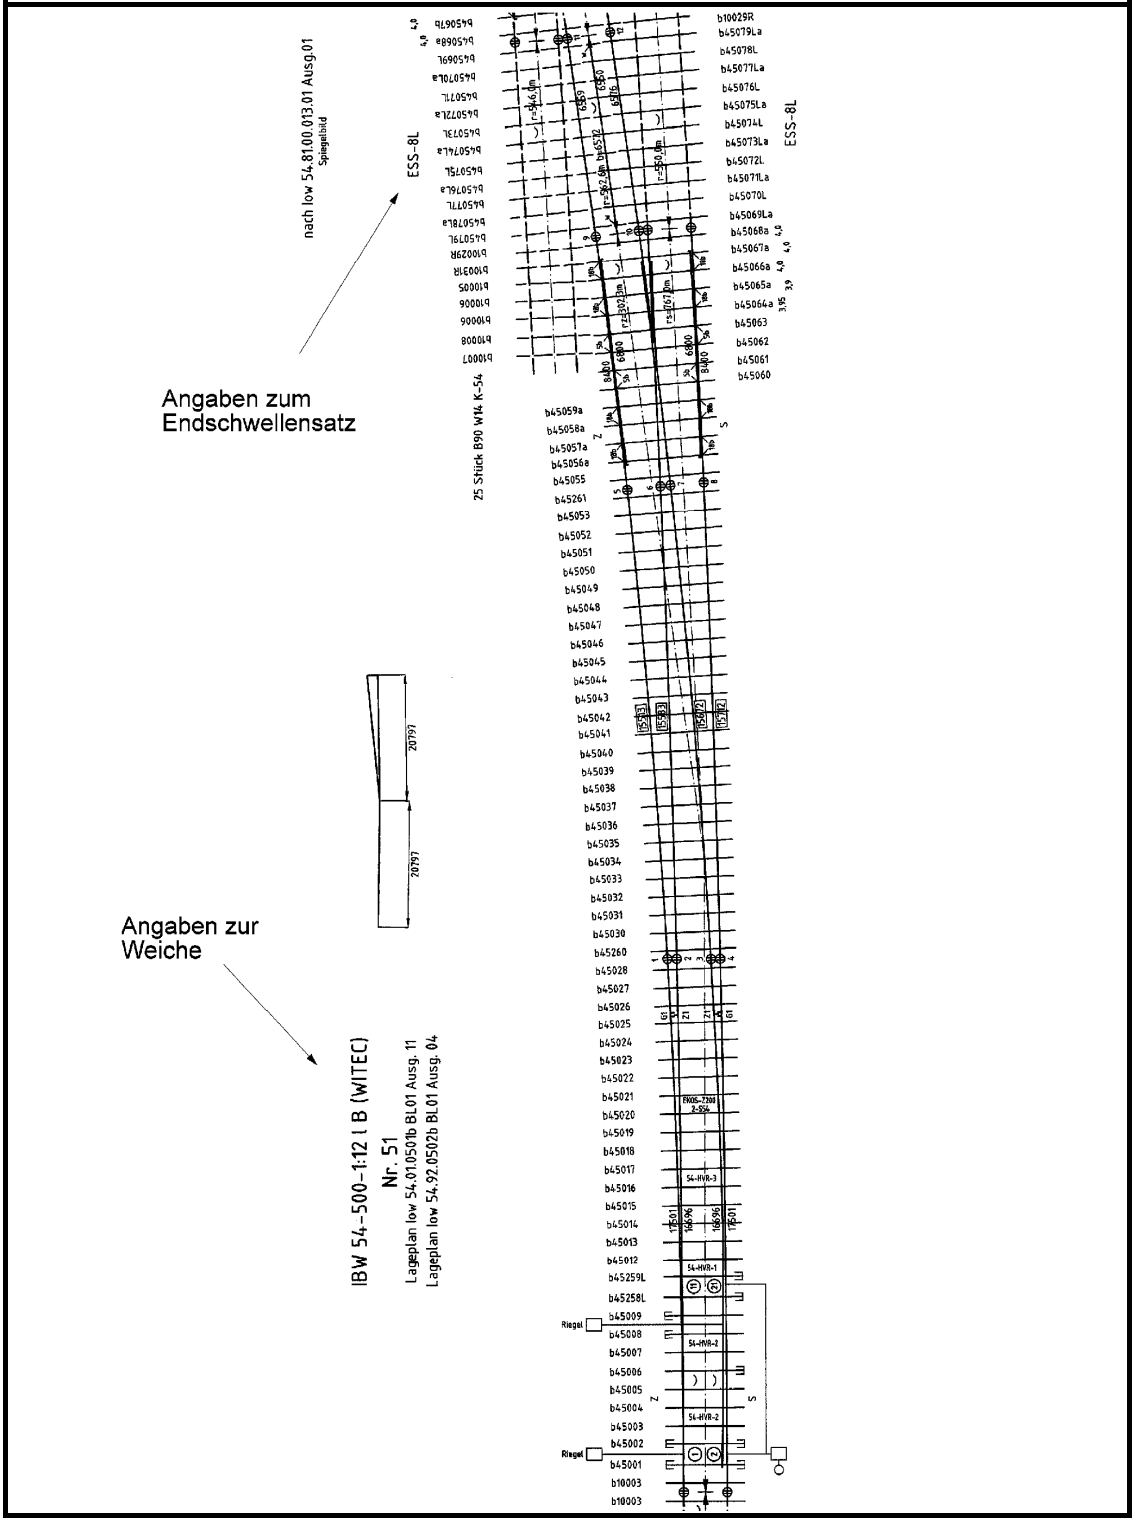


Bild 7 Schwellenteilungstabelle

Tabelle der Schwellenabstandsmaße

IBW 54-500-1:12

IOW 54.01.0501b Ausgabe 11
IOW 54.92.0502b Ausgabe 04

Weiche Nr. 51

Zeichnungs-Nr. Iowit 2004.49.1027 Bl.01

IS Regionalnetz Südost

Backenschiene			Zwischenschiene			Fahrschiene			Endteil		
S	Schw.Nr	Z	S	Schw.Nr	Z	S	Schw.Nr	Z	S	Schw.Nr	Z
295	b45028	360	310	b45261	253	287	b45055	338	328	b45069La	
900	b45027	963	916	b45053	855	887	b45056a	934	932	b45070L	
1501	b45026	1561	1522	b45052	1458	1493	b45057a	1537	1533	b45071La	
2101	b45025	2159	2128	b45051	2061	2099	b45058a	2139	2133	b45072L	
2701	b45024	2757	2734	b45050	2663	2705	b45059a	2741	2734	b45073La	
3301	b45023	3354	3340	b45049	3266	3311	b45060	3343	3335	b45074L	
3901	b45022	3952	3946	b45048	3869	3917	b45061	3945	3936	b45075La	
4501	b45021	4550	4552	b45047	4472	4522	b45062	4546	4537	b45076L	
5101	b45020	5147	5157	b45046	5073	5128	b45063	5148	5138	b45077La	
5701	b45019	5745	5762	b45045	5675	5734	b45064a	5750	5740	b45078L	
6301	b45018	6343	6368	b45044	6279	6340	b45065a	6352	6342	b45079La	
6901	b45017	6941	6973	b45043	6881	6946	b45066a	6953	6891	b10029R	
7501	b45016	7539	7580	b45042	7483	7552	b45067a	7555	7441	b10031R	
8101	b45015	8136	8184	b45041	8086	8133	b45068a	8132	7991	b10005	
8701	b45014	8734	8790	b45040	8689				8566	b10006	
9301	b45013	9332	9395	b45039	9290				9166	b10006	
9901	b45012	9930	10002	b45038	9894				9766	b10008	
10481	b45259L	10494	10607	b45037	10497				10366	b10007	
11151	b45258L	11163	11207	b45036	11095						
11751	b45009	11774	11807	b45035	11692						
12351	b45008	12372	12408	b45034	12290						
12951	b45007	12969	13009	b45033	12889						
13551	b45006	13567	13610	b45032	13486						
14151	b45005	14165	14209	b45031	14084						
14751	b45004	14763	14810	b45030	14683						
15351	b45003	15361	15381	b45260	15252						
15931	b45002	15935									
16611	b45001	16614									
17201	b10003	17205									

Bild 8 Schwellenkürzungstabelle / Verschiebungen

veränderte Schwelle		hergestellt aus	durch Verschiebung ←→ / Verlängerung + / Kürzung -	
neue Bezeichnung	neue Länge m	Regelschwelle	gegen die Herzstückspitze gesehen links m	rechts m
55068a	4.50	55068	-0.10	
55069a	4.60	55069	-0.10	
55070a	4.60	55070	-0.10	
55071a	4.70	55071	-0.10	
55072a	3.40	55072	-1.50	
47c	4.50	47		→0.05
50a	3.20	50	-1.40	
50b	3.40	50	-1.20	
55005a	4.80	55005		-0.10
55006a	4.70	55006		-0.10
47a	4.40	47	-0.10	
48a	4.40	48	-0.10	
49a	4.40	49	-0.10	
45a	4.40	45		→0.05
46a	4.30	46	-0.10	
47b	4.40	47	-0.10	
48b	4.40	48	-0.10	
49b	4.40	49	-0.10	

Bild 9 Symbole

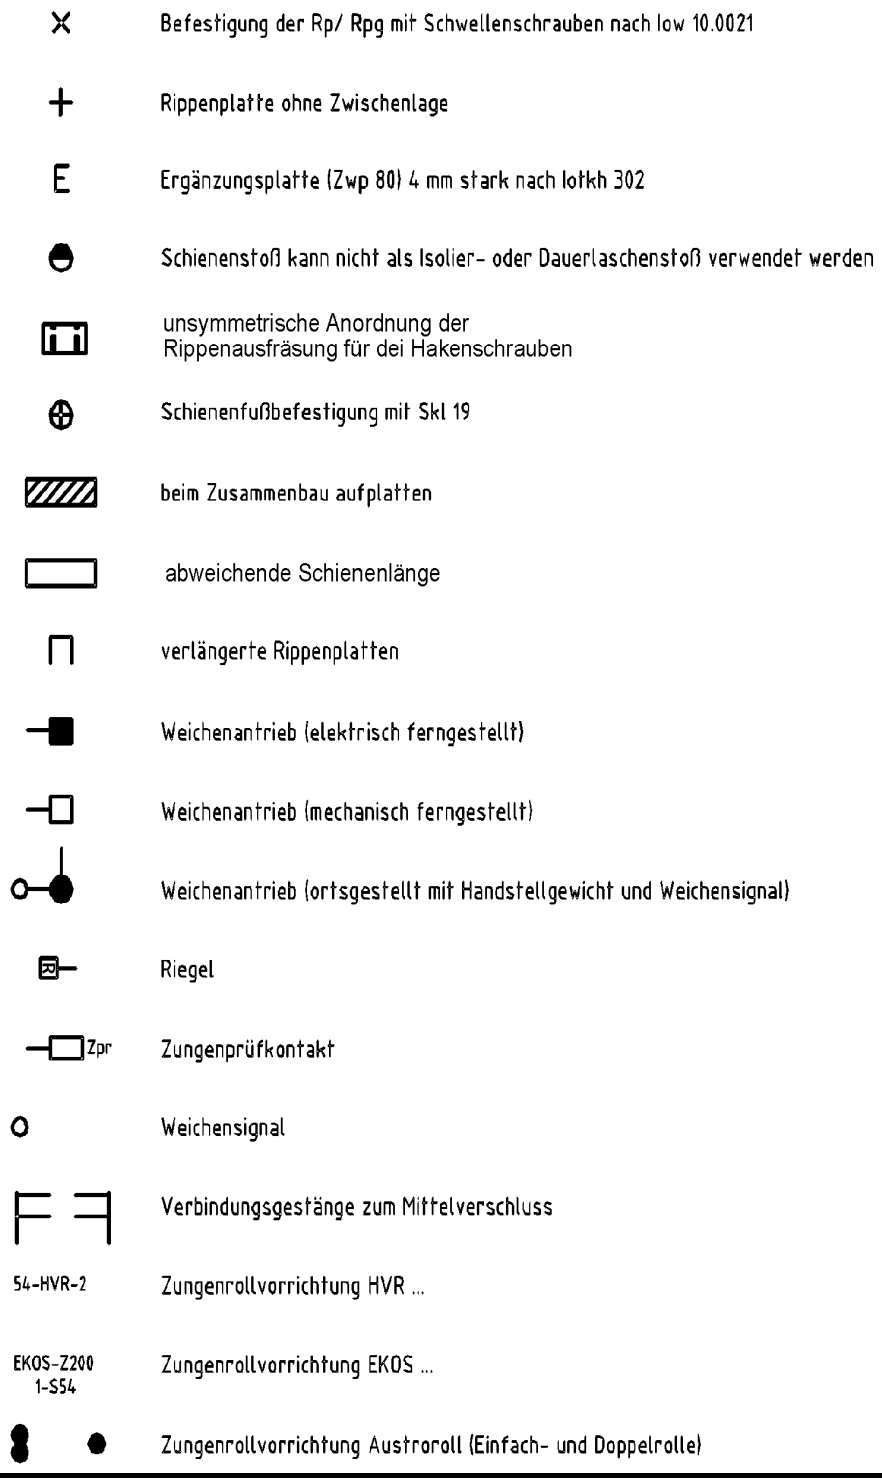


Bild 10 Darstellung geteilter Langschwellen mit Mittelschiene

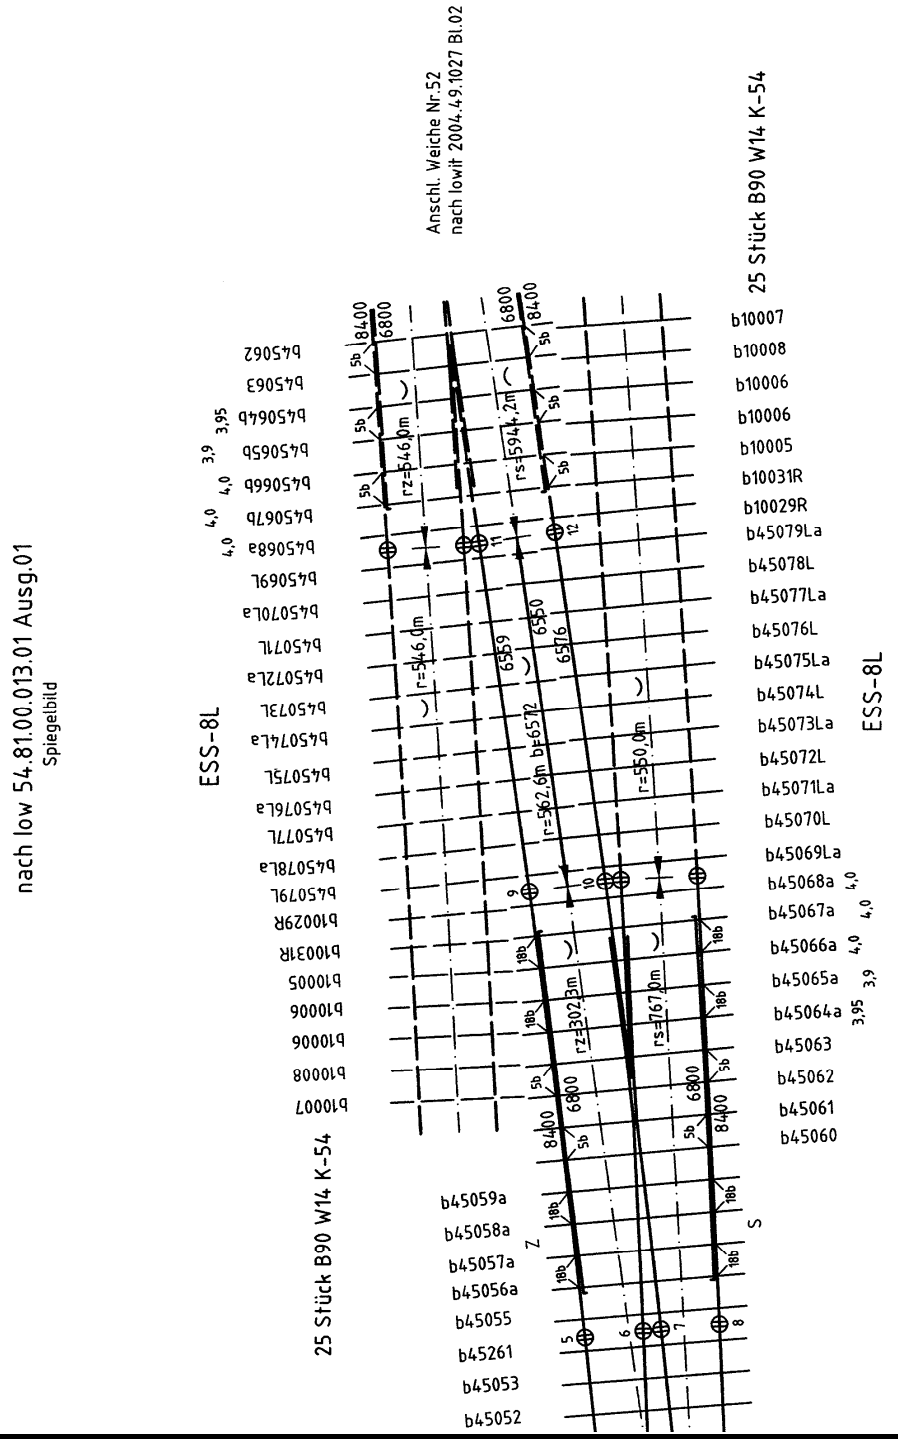


Bild 11 Darstellung von Schienenstößen

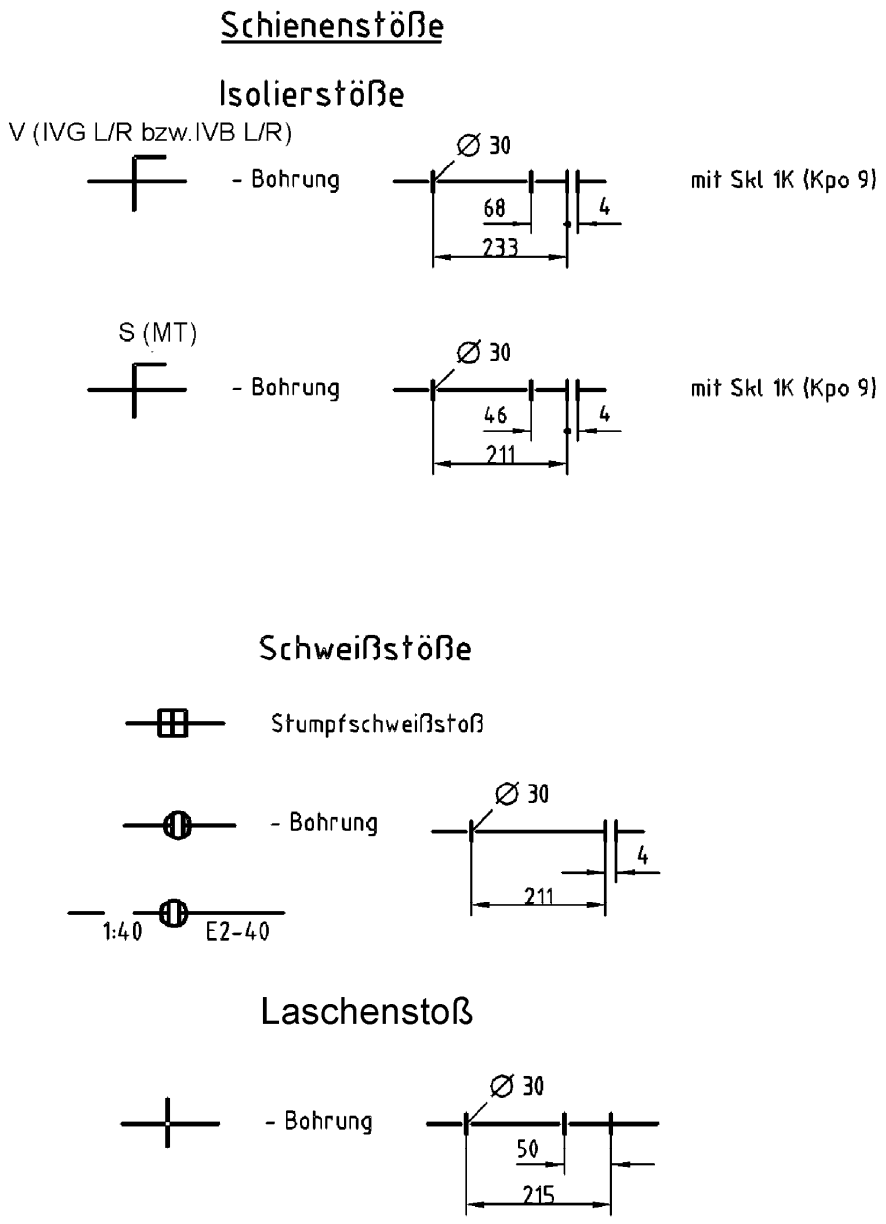


Bild 12 Mindestabstände der Schienenbefestigung bei Isolierstößen

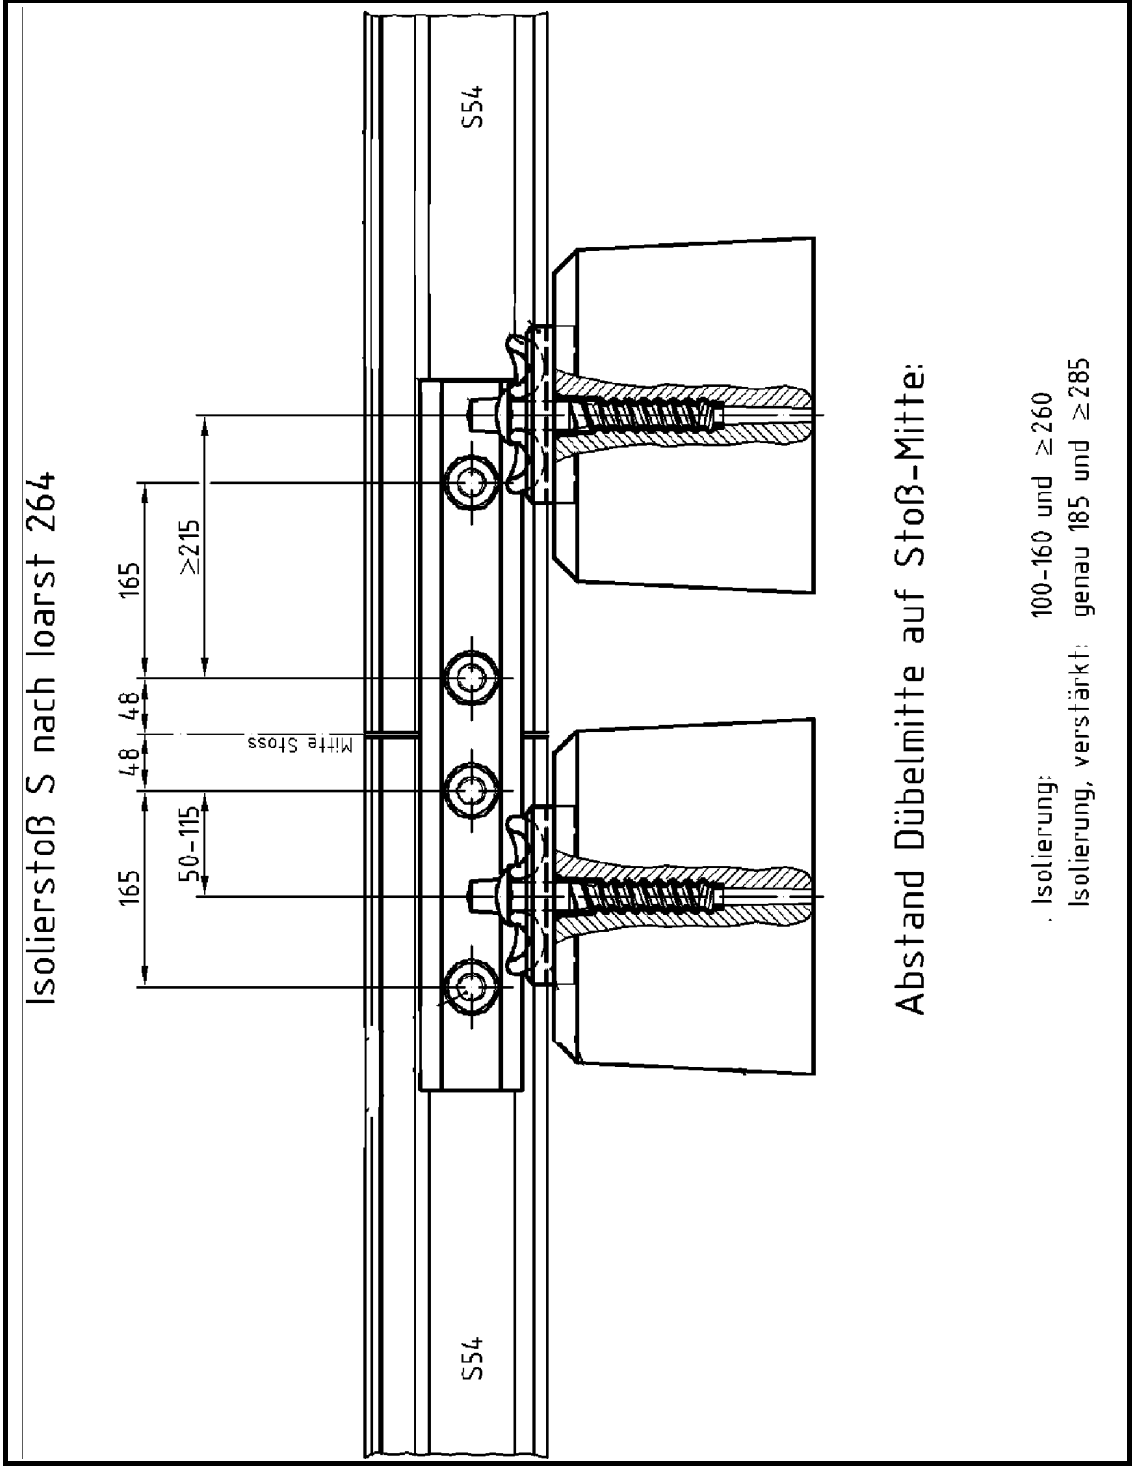


Bild 13 Darstellung einer EKW 54-500 (Abrückmaße)

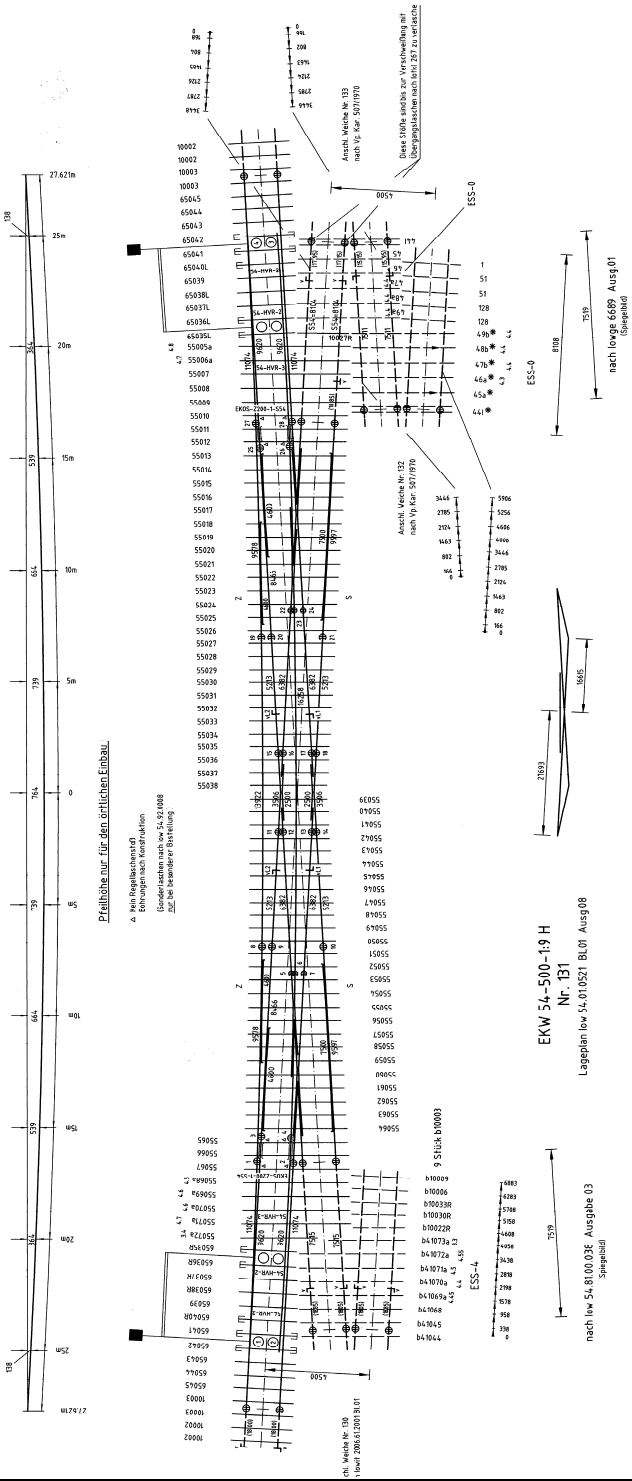



Bild 14 Schriftfeld und zusätzliche Angaben

Komponente	Benennung	Zeichnungs-Nr.	Bemerkung	TA für Einbau und Instandh.
Verschlußart	Klinkenverschluss	Iow 50.0012	Fa-Siemens	Iow 92.1021
Stellsystem		S 7314.12.8 (Bild 1)		Zusätzliches Mat. siehe Wsk.
Signalanordnung				
Zungenrollvorrichtung	b25019 - b25021 mit URg 13b Mo b25022 - b25025 mit UGp 1b Mo	Iow 57.1020	Fa. Schwihag	Iow 92.1024
Verschlußschwelle				
Schwellenverbindungspl.		Iow 55.0010		
IBAV				
Verstärkte Rippengleit-stuhlplatten (URg/SRg)				
FAKOP				
Herzstückbauart				
Herzstück mit verbess. Lastverteilung (HVL)				
Wärmebehandlung				
Elastische Rippen-plattenlagerung (ERL)				
Zusätzliche Weichenschw.		Befestigung je ISO-Stoß statt 4 x SKl 3 o. 12 mit Hs 32^{-55} u. Uls 6 je 4 x Kpo 9 mit Hs 32^{-65} u. Fe 6 Befestigung je ISO-Stoß bei w-Befestigung statt 4 x SKl 14 u. Ss 35 mit Uls 7 je 4 x Skl 1K u. Ss 35 mit Uls 7		0 Iso-Stöße
Zusätzliche Gleisschw.	50 Stk. B90 W14 K-60			
Schwellenmeter : 299,3	+/- Veränderung = -33,45			

zul. V	Zuglast (t/Tag)	Gleiskategorie	Fahrbahn	Mat-Nr. 00490123
160/60 km/h	60000	Hauptgleis		

Die durch Strich - Strich - Linie dargestellten Bereiche gehören nicht zum Lieferumfang

Schwellenabstandsmaße an Fahrkante in Pfeilrichtung von Schienenende bis Schwellenmitte berechnet



Aufgestellt für	NL West	Wsk-Nr. 101	2006
DB Netz AG Fern- und Ballungsnetz	IS Köln DB Netz AG Weichenwerk Witten	Ausgabe 01 Datum 11.05 Maßstab 1/100 (1/500)	
IS B			

	Datum	Name
Bearb	25.11.2005	
Gepr.	27.11.2005	
Norm		

Verlegeplan
für Weiche Nr. 58
in Bf Bonn-Mehlem

CAD-Zeichnung
Nicht von Hand ändern

lowit 2006.35.0101

Blatt 03
03 Bl.

Zust	Änderung	Datum	Name

Urspr.

Ers. f

Ers. d.

Bild 15 Koordinatensystem für Schwellen (Oberbau KS)

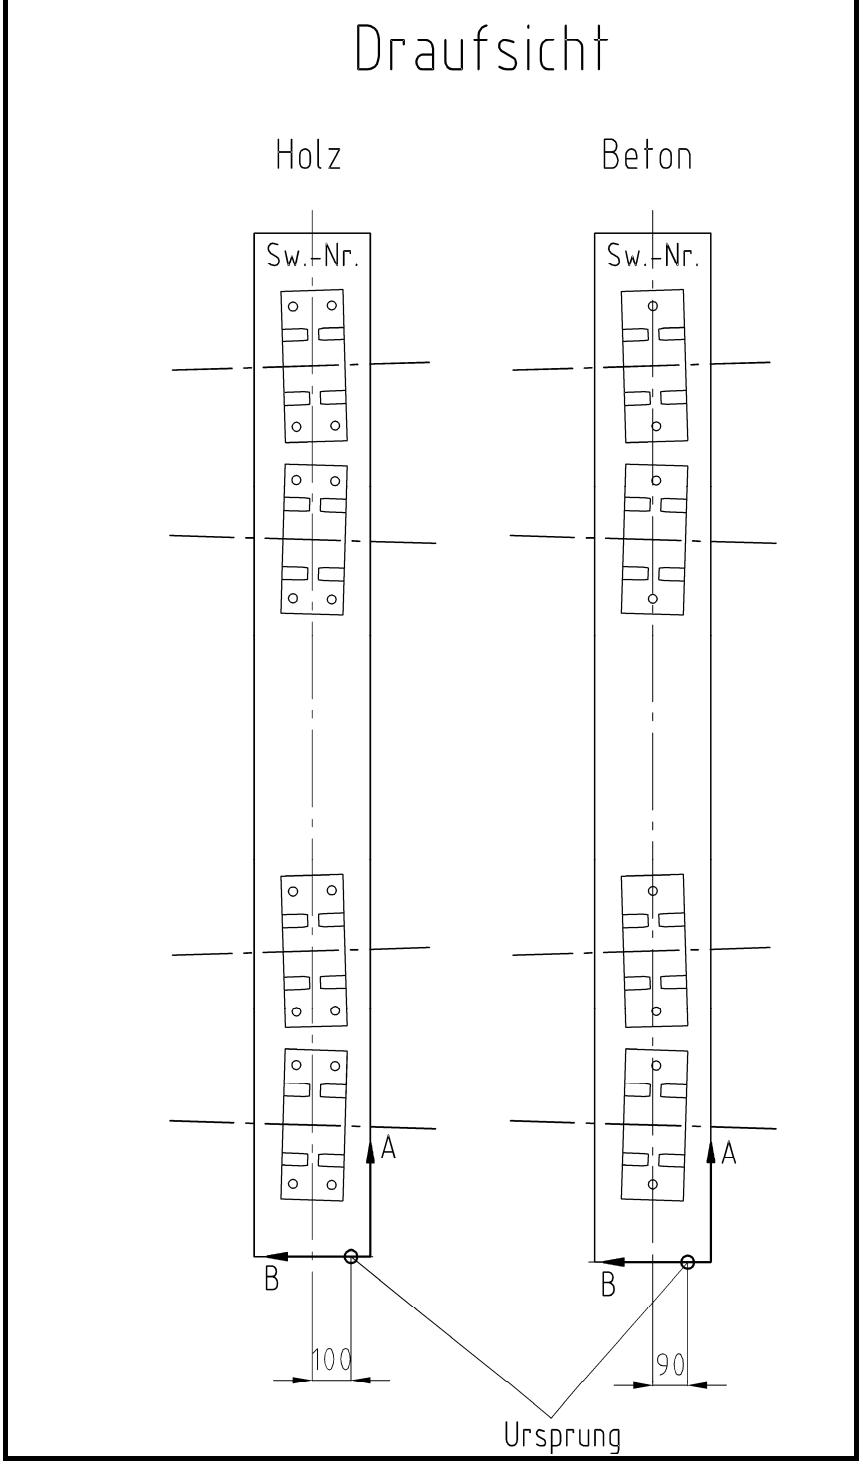


Bild 16 Koordinatenliste (Oberbau KS)

Schwellen-Nr.:	Achse	Koordinaten							
Länge:	A	305.45	590.25	706.40	991.15	1808.85	2093.60	2209.75	2494.55
b 42015	B	96.15	83.85	83.85	96.15	96.15	83.85	83.85	96.15
2800	Platte/Lochabstand	SRp 1b	285.07	SRp 1b	285.02	SRp 1b	285.02	SRp 1b	285.07

Schwellen-Nr.:	Achse	Koordinaten							
Länge:	A	328.65	613.35	783.05	1067.75	1832.25	2116.95	2286.65	2571.35
b 42016	B	96.55	83.45	83.45	96.55	96.55	83.45	83.45	96.55
2900	Platte/Lochabstand	SRp 1b	285.00	SRp 1b	285.00	SRp 1b	285.00	SRp 1b	285.00

Schwellen-Nr.:	Achse	Koordinaten							
Länge:	A	300.70	585.40	810.85	1095.50	1804.50	2089.15	2314.65	2599.30
b 42017	B	96.95	83.05	83.05	96.95	96.95	83.05	83.05	96.95
2900	Platte/Lochabstand	SRp 1b	285.04	SRp 1b	284.99	SRp 1b	284.99	SRp 1b	284.99

Schwellen-Nr.:	Achse	Koordinaten							
Länge:	A	321.05	605.65	890.40	1175.00	1825.00	2109.65	2394.35	2678.95
b 42018	B	97.35	82.65	82.65	97.35	97.35	82.65	82.65	97.35
3000	Platte/Lochabstand	SRp 1b	284.98	SRp 1b	284.98	SRp 1b	285.03	SRp 1b	284.98

Schwellen-Nr.:	Achse	Koordinaten							
Länge:	A	289.75	574.35	921.45	1206.05	1793.95	2078.55	2425.65	2710.25
b 42019	B	97.75	82.25	82.25	97.75	97.75	82.25	82.25	97.75
3000	Platte/Lochabstand	SRp 1b	285.02	SRp 1b	285.02	SRp 1b	285.02	SRp 1b	285.02

Schwellen-Nr.:	Achse	Koordinaten							
Länge:	A	306.80	591.35	1004.25	1288.75	1811.25	2095.75	2508.65	2793.20
b 42020	B	98.15	81.85	81.85	98.15	98.15	81.85	81.85	98.15
3100	Platte/Lochabstand	SRp 1b	285.02	SRp 1b	284.97	SRp 1b	284.97	SRp 1b	285.02

Schwellen-Nr.:	Achse	Koordinaten							
Länge:	A	322.30	606.75	1088.55	1373.05	1826.95	2111.45	2593.25	2877.70
b 42021	B	98.55	81.45	81.45	98.55	98.55	81.45	81.45	98.55
3200	Platte/Lochabstand	SRp 1b	284.96	SRp 1b	285.01	SRp 1b	285.01	SRp 1b	284.96

Bild 17 Koordinatensystem für Schwellen (Oberbau W)

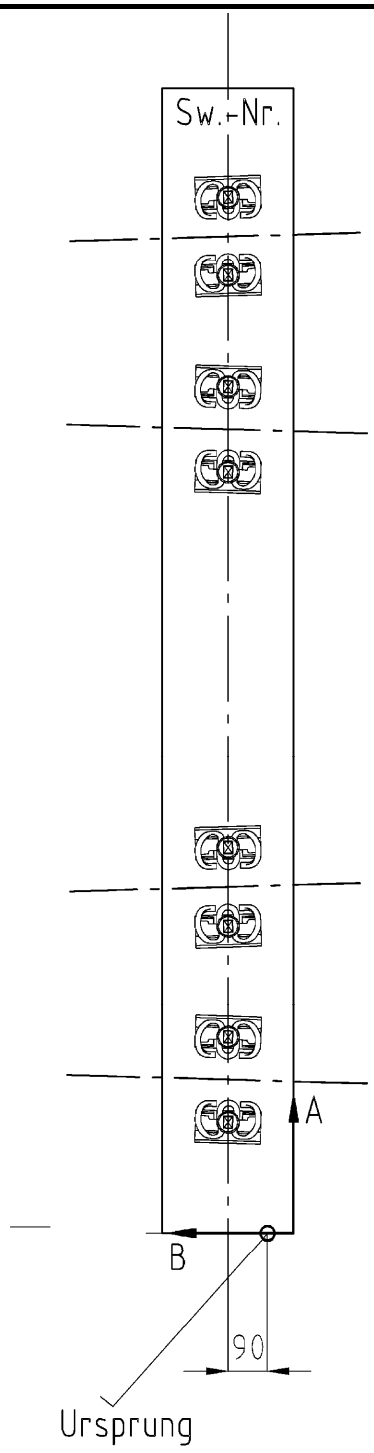


Bild 18 Koordinatenliste (Oberbau W)

Schwelle-Nr	41035	Dübel x	Dübel y	Niet 1x	Niet 1 y	Niet 2 x	Niet 2 y
Länge:	3600	362,41	90	333,23	141,7	327,68	41,85
		540,61	90	575,33	138,15	569,79	38,3
	Stützbock	x1	y1	x2	y2		
	Durchsteckverschraubung	711,37	90	911,07	78,91		
		1564,57	90	1529,84	138,15	1535,39	38,3
		1742,77	90	1771,95	141,7	1777,49	41,85
		1867,82	90	1838,65	141,7	1833,1	41,85
		2046,03	90	2080,75	138,15	2075,2	38,3
	Stützbock	x1	y1	x2	y2		
	Durchsteckverschraubung	2899,22	90	2699,53	78,9		
		3069,98	90	3035,26	138,15	3040,81	38,3
		3248,19	90	3277,36	141,7	3282,91	41,85

1 Allgemeines

(1) Regelungen zur Linienführung siehe Ril 800.0110. **Linienführung**

(2) Die Wahl und Anordnung von Weichen und Kreuzungen ist in Ril 800.0120 und 823.0700 geregelt. **Weichen und Kreuzungen**

(3) Die Gestaltung der Streckenquerschnitte (z.B. Umgrenzung des lichten Raums, Gleisabstände) wird in Ril 800.0130 behandelt. **Streckenquerschnitte auf Erdkörpern**

(4) Regelungen zur Bahnübergangsbefestigung und Anordnung bautechnischer Anlagen für Bahnübergänge siehe RilF 815.ff **Bahnübergänge**

(5) Bauarten und Anwendungsbereiche der Festen Fahrbahn, siehe Anforderungskatalog FF (in der jeweils gültigen Fassung) **Feste Fahrbahn**

(6) Bahnsteighöhen und Abstände von Gleisen zu Bahnsteigen siehe Ril 813.0201 und Ril 813.0101. **Bahnsteige**

(7) Rampenhöhen und Abstände von Gleisen zu Rampen (siehe RilF 800.ff) **Rampen**

2 Fahrdynamische und Oberbautechnische Prüfung

(1) Die fahrdynamische und die oberbautechnische Prüfung ist angeordnet für alle Planungen des Oberbauprogramms und aller Bauvorhaben, die **Zu prüfende Planungen**

- den Bereich der durchgehenden Hauptgleise berühren und eine Veränderung der Seiten- bzw. Höhenlage (Grundriß/Aufriß) dieser Gleise bewirken;

- den Ersatz bestehender Weichen (z.B. Lückenschluss) in alter oder geänderter Lage und die den Neubau von Weichen in den durchgehenden Hauptgleisen betreffen.

Zur Prüfung erforderliche Unterlagen

(2) Für die Prüfung werden benötigt:

a) bei Arbeiten im Rahmen des Oberbauprogramms

- der Lageplan 1:1 000 mit Eintrag der geplanten Veränderungen oder der Trassenplanentwurf nach Richtlinien 883 (2fach);

b) bei Bauvorhaben

- der Entwurfsplan 1:1 000 (oder 1:500), Bei NBS-Planungen ggf. der Vorentwurf 1:5 000 (2fach);

c) bei Ersatz oder Neubau von Weichen

- die Weichenskizze(n) (Abdruck) mit Lageplan
  1:1 000 und ggf. Trassenplanentwurf nach Richtlinien 883 sowie bei schwierigen Bogenweichenanordnungen der Weichenhöhenentwurf nach Richtlinien 883 für alle in den durchgehenden Hauptgleisen einzubauenden Weichen (Oberbauprogramm und Bauvorhaben), also auch für solche Planungen, die nach a) oder b) bereits geprüft wurden (vgl. Ril 823.0700), (1fach).

Zur Prüfung erforderliche Angaben

(3) In den zur Prüfung vorgelegten Unterlagen sind folgende Angaben erforderlich:

a) Planungsunterlagen zu Abschn. 2, Abs. (2)a und (2)b

Die Pläne müssen u.a. folgende Angaben enthalten:

- Entwurfsgeschwindigkeit (v_e) bzw. die örtlich zu-lässige Geschwindigkeit (zul v nach VzG),
- die Gz-Belastung in t/Tag (getrennte Angaben für Ri und GRi),
- die Bogenhalbmesser mit Überhöhung, Übergangsbogenlängen und Rampenlängen,
- Längen von Zwischengeraden,
- die Gleisneigungen mit Neigungswechsel (r_a und t_a),

- bei Weichen die Weichenform (z.B. 60-500-1:12), bei Bogenweichen dazu die Halbmesser des Stamm- und Zweiggleises, bei Übergangs-bogenweichen außerdem noch die Überhöhung am WA und WE,
- die einzuhaltenden Geschwindigkeiten in Bogenweichenverbindungen;

b) Weichenskizzen zu Abschn. 2, Abs. (2)c

Für die Angaben auf den Weichenskizzen gilt die Ril 823.0700;

c) Erläuterungen (besonderes Blatt, 1fach)

Die geplanten Veränderungen von Gleisen bzw. Weichen sind in Stichworten zu beschreiben. Dabei ist auf örtliche Besonderheiten (z.B. Zwangspunkte, Untergrundverhältnisse) und deren Auswirkung (z.B. Anwenden von Grenzwerten, konstruktive Besonderheiten usw.) einzugehen. Abweichungen von den Trassierungsgrundsätzen sind zu begründen.

(4) Die Unterlagen sind an die

Zeitpunkt der Vorlage

DB Netz AG – Zentrale - Abteilung I.NVTS (F) Fahrdynamik / Linienführung, Ruschestraße 104, 10 365 Berlin

so rechtzeitig zu übersenden, daß ein angemessener Zeitraum für die Prüfung und für etwaige Rückfragen zur Verfügung steht.

Um Doppelarbeit bei den beteiligten Arbeitsgebieten zu vermeiden, müssen die Pläne in jedem Fall vor der Bearbeitung der Trassenpläne nach Richtlinien 883 geprüft sein.

Bei Planungen, für die ein Entwurfsheft aufzustellen ist, muß die Überprüfung vor Aufstellung des Entwurfsheftes abgeschlossen sein. Der geprüfte Plan ist dem Entwurfsheft als Anlage beizufügen.

❑
